

SECRETARIA  
DO TURISMO - SETUR



ESTADO DO PIAUI  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR  
AV. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções,  
Bairro Cabral  
CEP 64002-830 - Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br



## PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

**PROJETO DE ENGENHARIA PARA  
PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PEDRO  
II DE VIAS PÚBLICAS EM CONCRETO  
BETUMINOSO USINADO À QUENTE  
(C.B.U.Q.).**

**TOTAL 20.552,34 M<sup>2</sup>**

Proposta *SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR*

MARÇO DE 2023.

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129285

SECRETARIA  
DO **TURISMO** - SETUR



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR  
AV. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções,  
Bairro Cabral  
CEP 64002-830 - Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br



## 1.0 – Apresentação



Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129255




## 1.0 - APRESENTAÇÃO

O presente trabalho apresenta o Projeto Básico de Engenharia de Execução de Pavimentação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.), referente a diversas ruas na zona urbana da cidade de Pedro II-PI.

A apresentação contempla todos os elementos necessários para que as empresas licitantes possam compor os preços dos serviços e obras para as suas propostas, como também a sua execução.

Para a elaboração do Projeto Básico, inicialmente foram realizados estudos preliminares das ruas, os quais foram desenvolvidos observando o traçado existente. A seleção do traçado levou em consideração todos os dados colhidos nestes estudos, além das condicionantes de ordem ambiental.

Todos os preços unitários têm como referência a tabela do Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil (SINAPI) – Outubro/2022, na ausência do item na referida tabela, utilizaremos os preços da tabela SICRO região nordeste – PI – DNIT (construção rodoviária), tendo como base o mês de Outubro/2022, a tabela de preços de aquisição de material betuminoso da ANP – Outubro/2022.



Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CRA: 1916129285

SECRETARIA  
DO TURISMO - SETUR



GOVERNO DO  
**PIAUI**  
AQUI TEM TRABALHO  
AQUI TEM FUTURO

ESTADO DO PIAUI  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR  
AV. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções,  
Bairro Cabral  
CEP 64002-830 - Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br



## 2.0 – Objetivo do Projeto

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil OAB/PIA: 1916129255



## 2.0 – OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo desse projeto visa oferecer conforto e maior segurança para os usuários das ruas projetadas, melhorar as condições de tráfego e a qualidade de vida da população. Com a execução deste projeto facilitará a mobilidade na Zona Urbana da cidade de Pedro II-PI, proporcionando condições melhores para o desenvolvimento. A pavimentação de ruas constitui uma obra de elevada abrangência social, pois a execução do referido projeto irá proporcionar às ruas uma melhor trafegabilidade local, e com as novas vias pavimentadas, os moradores da zona urbana terão uma nova alternativa de percurso para se dirigir para o centro e zona leste, dessa forma, reduzindo, assim o nível de serviço nas vias existentes daquela região, trazendo maior conforto aos usuários.



Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil - CREA: 1916129255

SECRETARIA  
DO TURISMO - SETUR



ESTADO DO PIAUI  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR  
AV. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções,  
Bairro Cabral  
CEP 64002-830 - Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br



### 3.0 – Caracterização do Município


  
Yanna Carolina Pires da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CRE: 1916129285



### 3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

#### 3.1 - Localização

Localiza-se a uma latitude 04°25'29" sul e a uma longitude 41°27'31" oeste, estando a uma altitude de 743 metros. Sua população estimada em 2004 era de 37 158 habitantes. Possui uma área de 1957,2 km<sup>2</sup>. Pedro II está localizada a 208 km da capital Teresina, mais precisamente ao norte do estado. A cidade está localizada na Serra dos Matões e é privilegiada naturalmente com um clima ameno. Sua temperatura varia entre 28° e 30° ao dia e 20° a 16° à noite.

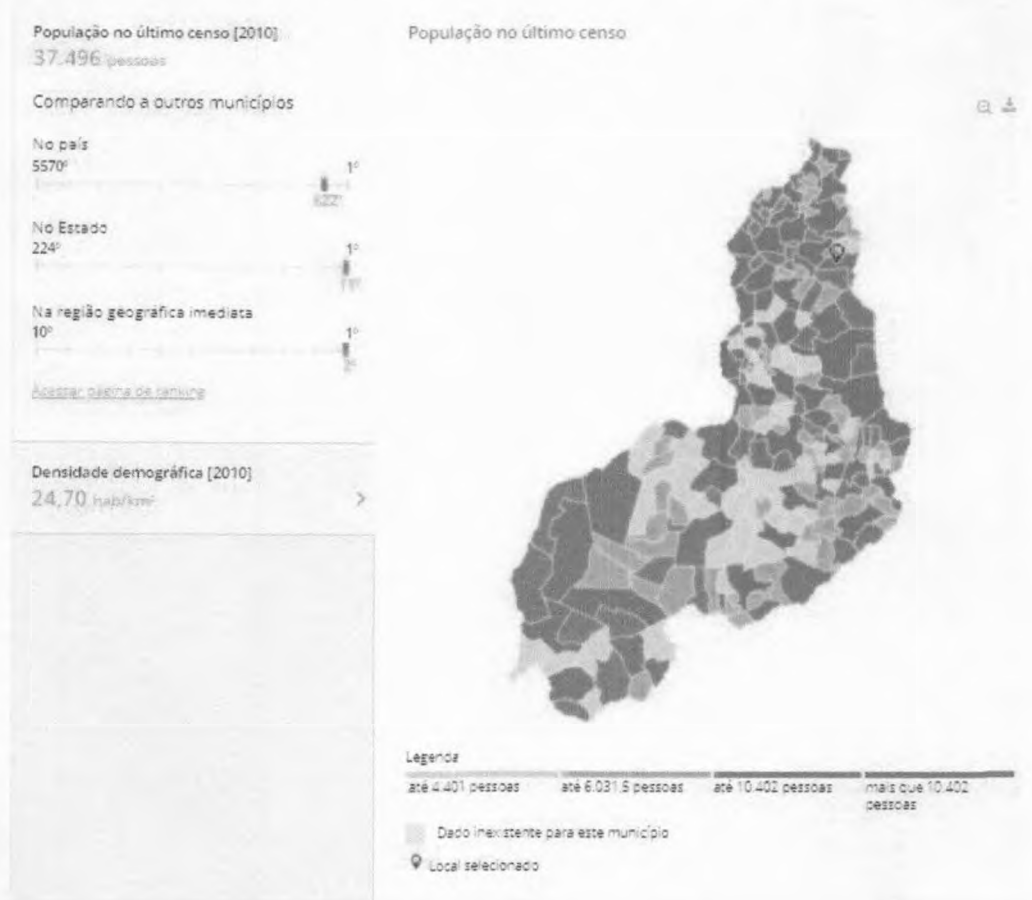


Fonte: [www.ibge.gov.br](http://www.ibge.gov.br)

Fundado e emancipado por portugueses em 1854, século XIX. De acordo com a Lei Provincial N°. 295 de 26 de agosto de 1851, foi criada a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição dos Matões. Em 11 de Agosto de 1854 segundo a Lei N°. 367 o povoado dos Matões foi elevado à categoria de Vila, com a denominação de Pedro II, em homenagem ao Imperador do Brasil. Já foi chamado também de Pequizeiro. Com a proclamação da República, a Vila voltou a

ter o nome de Matões mas, pela Lei Nº. 641 de 13 de julho de 1911, já na categoria de cidade, foi restabelecida a denominação de Pedro II.

### 3.2 - Aspectos Socioeconômicos:

Em 2020, o salário médio mensal era de 1.8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 6.9%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 97 de 224 e 81 de 224, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 3161 de 5570 e 4533 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 55% da população nessas condições, o que o colocava na posição 107 de 224 dentre as cidades do estado e na posição 470 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

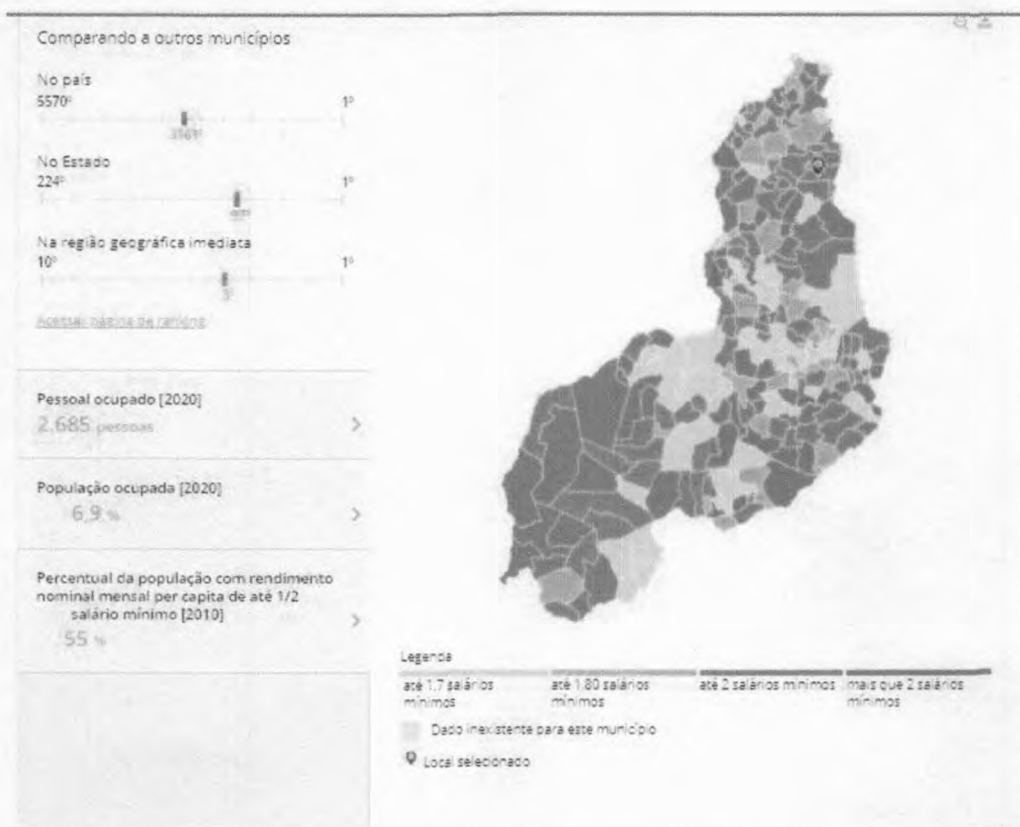

Fonte: [www.ibge.gov.br](http://www.ibge.gov.br)


### 3.3 – Meio Ambiente



Apresenta 8.8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 87.6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0.4% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 116 de 224, 50 de 224 e 59 de 224, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 4468 de 5570, 1724 de 5570 e 4630 de 5570, respectivamente.

### 3.4 – Saúde

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 9.75 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 6.4 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 138 de 224 e 50 de 224, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2820 de 5570 e 509 de 5570, respectivamente.

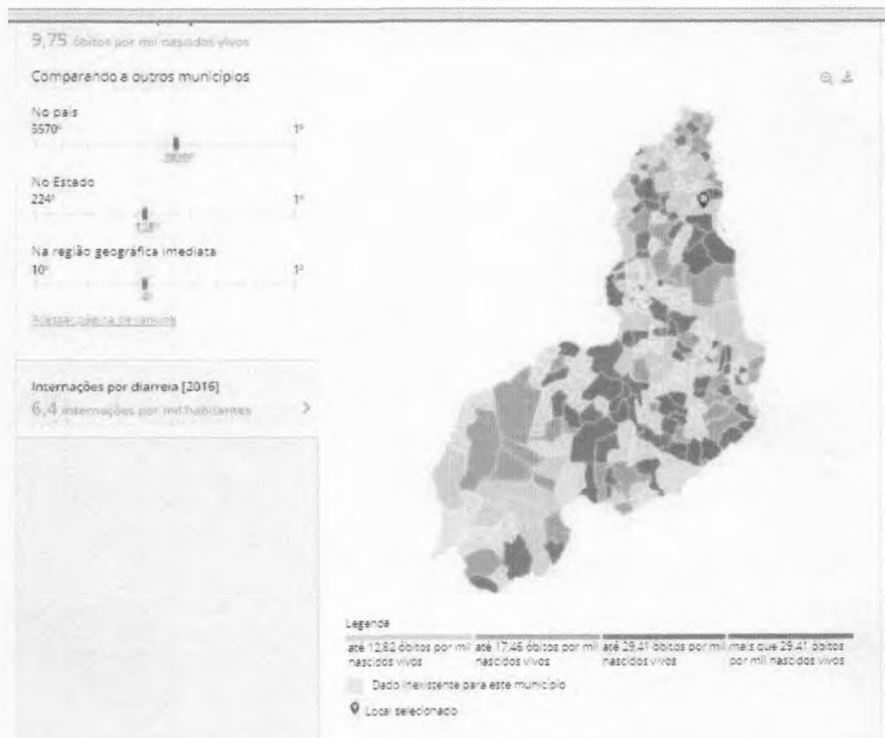

Fonte: [www.ibge.gov.br](http://www.ibge.gov.br)

#### 4.0 MEMORIAL DESCRITIVO

A obra consiste na Pavimentação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) de ruas na Zona urbana da cidade de Pedro II-PI, contemplando as seguintes ruas:

DENOMINAÇÃO DE RUAS	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m <sup>2</sup> )
RUA TOMÁS CAFÉ	852,000	5,90	5.026,80
JOAQUIM LEITE	174,00	9,30	1.618,20
JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)	146,00	Var	1.286,50
TEIXEIRA SANTOS	204,00	6,00	1.224,00
ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)	258,00	Var	2.521,64
RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA	306,000	3,55	1.086,30
RUA CÂNDIDO PEREIRA	257,000	6,40	1.644,80
R. MONSENHOR UCHOA	716,000	7,80	5.584,80
R. DA CEPISA	94,000	5,95	559,30
<b>ÁREA TOTAL (m<sup>2</sup>):</b>			<b>20.552,34</b>

#### 4.1 - Descrição dos Serviços:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Além disso, todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. Durante a obra será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Caberá à empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.



## 5.0 – Especificações Técnicas



## 5.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 5.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a execução deste projeto, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, controle, medição e pagamento de todos os serviços previstos deverão atender integralmente às normas para medição e execução de serviços, complementadas pelas especificações gerais para obras rodoviárias (DNIT) ou, quando necessária, particularização dessas e, finalmente, pelas especificações complementares para aqueles serviços não previstos nos documentos anteriores.

### 5.2 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- I. - É exigência da Contratante, que todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser novos e de primeira qualidade.
- II. - As normas e especificações obedecerão às regulamentações da ABNT e normas próprias das concessionárias locais de serviços públicos.
- III. - Toda obra deverá ser acompanhada de detalhes fornecidos em desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida.
- IV. - No caso de divergências entre projetos e especificações, serão adotados os seguintes critérios:
  - a) Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto;
  - b) Quando houver omissão no projeto, prevalecerá o disposto nas especificações, ou será feita consulta ao autor do projeto;
  - c) Em caso de discrepância entre o definido no projeto e nas especificações, será consultada a fiscalização.
- V. - Para todos os materiais utilizados, as marcas e modelos deverão ser aprovados pela fiscalização.

VI. - A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que julgar indispensável ou prejudicial ao bom andamento dos serviços.

VII. - No local da obra, deverá haver um responsável local pela mesma e, na sua ausência, um preposto, com plenos poderes para representá-lo na administração da obra e nas relações com a fiscalização.

VIII. - Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, somente serão considerados extraordinários, quando autorizados pela fiscalização e com os órgãos envolvidos no projeto.

IX. - A Contratada deverá confeccionar as placas exigidas pelos órgãos financiadores e técnicos envolvidos no projeto e execução.

X. - A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a indenização.

## 5.3 SERVIÇOS PRELIMINARES

### 5.3.1 - Mobilização e Desmobilização

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização imediatamente após assinatura do contrato de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

Os serviços gerais de mobilização, no início da obra e durante a execução da mesma, e de desmobilização, quando do término dos trabalhos, compreendem, mas não se limitam às seguintes providências a serem tomadas pela Contratada:

- Mobilização de todo o equipamento, de propriedade da Contratada ou de suas subempreiteiras, até o local da obra e sua posterior retirada, para o local de origem ou outro, acampamentos, vila residencial e/ou acessos e adjacências;
- Movimentação de todo pessoal da Contratada e de suas subempreiteiras até o local da obra, em qualquer tempo, e posterior regresso a seus locais de origem, inclusive transporte diário de empregados até o canteiro de obras e respectivo retorno;



Incluem, outrossim, todos os serviços indiretos de administração e coordenação, necessários à execução da obra, realizados no local da obra ou fora dele, tais como: planejamento, controle, coordenação, serviços de administração, de contabilidade, de almoxarifado, de pessoal, etc

No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiro de serviço, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da empreiteira ou sublocada, até o canteiro de obra e sua posterior retirada; e Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem.

### **5.3.2 Placa da obra:**

A placa deverá ser confeccionada em chapa galvanizada, montada sobre moldura de madeira, com pintura a base de poliuretano, resistente às intempéries.

A placa da obra deverá ter dimensões de 2,00 x 3,00 m, com formato e inscrições a serem definidas pelo Governo Federal e pela Prefeitura e de acordo com o manual de cores e proporções de placas de obra. Terão sustentação em frechais de madeira 7,5 x 7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra.

### **5.3.3 – Administração local da obra:**

Será exercida por Engenheiro responsável, Encarregado Geral e demais elementos necessários. A contratada deverá comunicar com antecedência à contratante, o nome do engenheiro responsável, com suas prerrogativas profissionais.

A contratante fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposição em executar as ordens da fiscalização.



### **5.3.4 – Canteiro de obra:**

O canteiro de obra deverá ser locado levando-se em consideração as proporções e as características da mesma; as distâncias em relação ao escritório central, aos centros fornecedores de mão-de-obra e de material, as condições de acesso e os meios de comunicação disponíveis. As unidades locadas do canteiro de cada obra deverão ser discriminadas no respectivo orçamento. A escolha do local para locação do canteiro de obras e dos alojamentos deverá ser feita considerando alguns aspectos:

- O local deve ser de fácil, livre de inundações, ventilado e com insolação adequada;

As providências para locação do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, são de responsabilidade exclusiva da contratada.

As divisões do canteiro não devem permitir estrangulamento dos setores administrativo e técnico. As áreas devem ser suficientemente iluminadas, arejadas, com instalações dignas, dentro dos padrões de saúde e higiene.

Não se permitirá perturbação de qualquer ordem às vizinhanças residentes, quer por condutas indevidas de pessoas ou funcionamento irregular de máquinas e equipamentos.

### **5.3.5 – Raspagem e limpeza de terreno plano:**

Deverá ser executado a capina manual da área de intervenção para remoção da pequena vegetação e depois efetuado a varrição para posterior aplicação da emulsão asfáltica

## **5.2 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**

### **5.2.1 – Pintura de ligação:**

Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de paralelepípedo existente, antes da execução do revestimento betuminoso CBUQ – Faixa “C”, com a finalidade de aumentar a coesão da superfície e promover condições de aderência entre



a superfície existente e o revestimento.

A pintura de ligação consistirá, também, na distribuição de uma película, de material betuminoso diretamente sobre a superfície revestida com CBUQ Faixa "C".

Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 0,00045 t/m<sup>2</sup> com viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão entre 20 a 100 segundos "Saybolt-Furol" (DNIT-ES 145/14). A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva.

O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através da colocação de uma bandeja na pista, com peso e área conhecidas da mesma, sendo que após a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado.

#### **5.2.2 – CBUQ - CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA C - (AREIA E BRITA COMERCIAIS):**

A localização dos materiais (Areia, Brita, Filler e Pedrisco) e usina de asfalto é mostrada no Mapa dos Materiais. A Usina de Asfalto para o Projeto está localizada na cidade de Teresina-PI.

A usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90° a 210 °C (precisão ± 1 °C) deverá ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo a descarga do misturador.

A usina deverá ser equipada, além disto, com pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos



para registrar a temperatura dos agregados, com precisão de  $\pm 5$  °C.

A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica (precisão de  $\pm 5\%$ ) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

A execução da camada de rolamento será feita em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), Faixa "C", com traço utilizado conforme composição de referência do DNIT, deverá possuir a espessura de 4,00cm e 5,00 cm, devendo estar limpa e receber a pintura de ligação antes da aplicação.

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura- viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, "Saybolt-Furol" (DNIT-ES 031/06), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos. Entretanto, a temperatura do ligante não deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C. A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade "Engler" (ASTMD 1665) situa-se em uma faixa de  $25 \pm 3$ . A mistura, neste caso, não deve deixar a usina com temperatura superior a 106 °C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 °C a 15 °C, acima da temperatura do ligante betuminoso. Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a composição requerida do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização.

O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina de asfalto à quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhões basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura será efetuada na caçamba de uma vibro- acabadora de asfalto, a qual irá proceder o espalhamento na pista que deverá ter como objetivo a pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a espessura mínima seja de 4,00 cm. Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo pneumático auto- propulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos deverão ter suas



respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento, será utilizada um rolo metálico liso.

### **5.2.3 – Transporte de materiais:**

O local de aquisição dos cimentos de asfalto e emulsões será nas refinarias da Petrobrás ou nas capitais das unidades da federação com divulgação de preço na base ANP, para este projeto foi definido a cidade de Fortaleza (CE) por ser a capital com preços na base da ANP de menor distância para o local da obra;

O transporte da mistura deverá ser realizado em caminhões basculantes com caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc.) não será permitida;

Os demais materiais (filler e areia) serão transportados em caminhões basculante do local de origem ao local da usina onde será adquirido o CBUQ.

### **5.2.4 – Transporte da Massa asfáltica (C.B.U.Q):**

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, em caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc) não serão permitidos.

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

### **Transporte – Critérios de Medição e Pagamento**

**Transporte com caminhões basculante, na obra, com tempo de ciclo (carga,**



**transporte de ida, descarga e volta) e DMT definidos**

**Medição por volume transportado (m³)**

**I – Materiais de terraplenagem, valas e cavas**

A medição será feita pelo volume extraído, em m<sup>3</sup>, medido no corte, vala, cava ou empréstimo, considerando-se a distância de transporte entre estes locais e o local de depósito, para efeito de faixa de DMT.

Serão obedecidas as seguintes condições:

- a) Não haverá distinção com relação à classificação os materiais de 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categorias.
- b) O cálculo dos volumes será resultante da aplicação do método da “média das áreas”.

Em situações excepcionais ou quando não houver corte a medir (materiais previamente armazenados ou adquiridos de terceiros), a medição será feita pelo volume solto (m<sup>3</sup>), efetivamente carregado. Este volume será determinado pela média da altura do material em relação ao fundo da caçamba, em pelo menos 3 pontos. Os volumes serão aferidos pela fiscalização para cada viagem, apropriando-se o total das mesmas.

A distância de transporte será medida ao longo do percurso seguido pelo caminhão, entre os centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado deverá ser previamente aprovado pela fiscalização.

**II – Entulhos**

A medição será feita pelo volume carregado, em m<sup>3</sup>, medido na caçamba do veículo, considerando-se a distância de transporte entre o local da carga e o local de depósito para efeito de faixa de DMT.

Serão obedecidas as seguintes condições:

- a) O volume solto, efetivamente carregado, será determinado pela média da altura do material em relação ao fundo da caçamba, em pelo menos, 3 pontos. Os volumes serão aferidos pela fiscalização para cada viagem apropriando-se o total das mesmas.
- b) A distância de transporte será medida ao longo do percurso seguido pelo caminhão, entre os centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado deverá ser previamente aprovado pela fiscalização.

**Medição por peso transportado (ton.)**

A medição será feita pelo peso, em toneladas, medido na carroceria do veículo,



considerando-se a distância de transporte entre o local da carga e o local de depósito, para efeito de faixa de DMT.

Serão obedecidas as seguintes condições:

- a) O peso do material carregado será determinado pela simples pesagem, em balança de reconhecida precisão. O caminhão deverá ser pesado antes e depois da carga, mantidas as mesmas condições do veículo, tal como o volume de combustível no tanque.
- b) Caberá à fiscalização aceitar a balança a ser utilizada.
- c) Caso não seja possível a pesagem, será procedido o cálculo do peso em função das dimensões e do peso específico do material.
- d) A distância de transporte será medida ao longo do percurso seguido pelo caminhão, entre os centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado deverá ser previamente aprovado pela fiscalização.

#### **5.2.5 Execução da Massa Asfáltica:**

O equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm<sup>2</sup> a 8,4kgf/cm<sup>2</sup> (35 a 120 psi). O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto está se encontrar em condições de operacionalidade.

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos.

Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura vai sendo compactada, e,

consequentemente, suportando pressões mais elevadas.

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada.

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado.

### **5.3 – DRENAGEM:**

#### **5.3.1 – Sarjeta:**

As sarjetas serão executadas em concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais, devendo ter base de 0,30m e espessura de 5,0 cm, com inclinação de 17,5%.

Para o assentamento das sarjetas, o terreno deve estar com sua superfície devidamente regularizada, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva. As sarjetas serão medidas em metros (m) executados.

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os preços unitários contratuais respectivos, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, carga, descarga, transporte, perdas, mão-de-obra com encargos sociais, BDI, e equipamentos necessários para execução dos serviços, e outros recursos utilizados.

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d'água e à segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente a serem observados no decorrer da execução das sarjetas:



a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as normas pertinentes aos serviços;

b) o material descartado deve ser removido para local apropriado, definido pela fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzidos aos cursos d'água;

c) é proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões betoneiras na drenagem superficial e em corpos d'água. A lavagem ó deve ser executada em locais pré-definidos e aprovados pela fiscalização;

d) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários.

## 5.4 – SINALIZAÇÃO

### 5.4.1 – Sinalização horizontal:

A aplicação da sinalização visa a segurança orientando o usuário para uma boa fluência e segurança de trânsito de pedestres.

A pintura consiste na aplicação do material por equipamento adequados de acordo com o alinhamento fornecido pela pré marcação e pelo projeto de sinalização.

Serão aplicadas com tinta retro refletiva a base de resina acrílica, nas seguintes tipologias:

- Eixo na cor branca em via de mão única;
- Eixo na cor amarela em via de mão dupla;
- Bordos na cor branca.

As Faixas tracejadas (seccionada) na pista terão largura de 0,10 m com espaçamentos na proporção de (1:2), traço com pintura na extensão de 2 m e largura 0,10 m alternado de 4m em 4m.



As Sinalizações Horizontais seguem as indicações do Manual de Sinalização de Trânsito - Volume IV – DENATRAN

O material utilizado para os serviços indicados será a tinta a base acrílica, espessura 0,4mm, com durabilidade dois anos.

#### **5.4.2 – Sinalização vertical:**

Serão executadas em chapa metálica galvanizada nº 22 nas dimensões com placas 45,0x25,0 cm já pintadas com tinta esmaltada para identificação de cada rua, sendo fixadas nos cruzamentos. As placas de advertência em aço, lado de 0,60 m ficarão fixadas em um suporte de madeira de 8,0 x 8,0 cm. O suporte de madeira terá 2,70 m de altura, sendo 0,50 m engastado no solo com concreto simples no traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e pedra britada).

### **5.5 – MEDIÇÕES E PAGAMENTOS**

Os serviços acima descritos serão pagos mediante medições mensais, de acordo com critério adotado pelo órgão contratante e os preços serão de acordo com a tabela de preços licitados.

### **5.6 – NORMAS GERAIS DE TRABALHO**

#### **5.6.1 - Materiais**

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a fiscalização julgue necessária, poderá solicitar da executante a informação por escrito dos locais de origem dos materiais.

A executante deverá submeter à aprovação da fiscalização, amostras de todos os materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar integralmente de acordo com as amostras aprovadas visualmente.



A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que a qualidade dos materiais empregados está em conformidade com as especificações.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços acima descritos e seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes de sua proposta.

Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta.

### 5.7 - RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO

A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quando a quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, especificações e cumprimento satisfatório às cláusulas do contrato.

Nenhuma operação de importância será iniciada sem o consentimento escrito da fiscalização ou sem uma notificação escrita da executante, apresentada com antecedente suficiente para que a fiscalização tome as providências para inspeção antes das operações. Os serviços iniciados sem a observância destas exigências poderão ser rejeitados. A empresa executora dos serviços deve apresentar a referida ART de execução da obra para ser anexada ao projeto básico.

### 5.8 NORMAS DNIT

- NORMA DNIT 145/2012 - ES - Pavimentação – Pintura de ligação com ligante asfáltico – Especificação de serviço;
- NORMA DNIT 031/2006 – ES - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de serviço;
- NORMA DNIT 100/2018 – ES - Obras complementares – Segurança no tráfego rodoviário - Sinalização horizontal – Especificação de serviço;
- NORMA DNER-EM 276/2000 p.01/07 – Tinta para sinalização horizontal rodoviária à base de resina acrílica emulsionada em água;
- PLACAS DE NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS;
- NORMA DNIT 018/2006 - ES - Drenagem - Sarjetas e valetas - Especificação de serviço.




SECRETARIA  
DO TURISMO - SETUR



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR  
AV. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções,  
Baixo Cabral  
CEP 64002-830 - Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br



## 6.0 – Memória de Cálculo

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 191612921-5



**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOCALIZAÇÃO:** TERESINA- VIAS PÚBLICAS  
**MUNICÍPIO:** PEDRO II - PI  
**TRECHO:** R. TOMÁS CAFÉ / JOAQUIM LEITE / JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02) / TEIXEIRA SANTOS / ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03) / RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA / RUA CÂNDIDO PEREIRA / R. MONSENHOR UCHOA / R. DA CEPISA  
**EXTENSÃO:** 3.007,000 m

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (H)	QUANTIDADE (Q)	ÁREA (M²) OU VOLUME (M³) (A E V)	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
-----------------	-------------	------------	----------------	----------------------------------	---------	-------------

**SERVIÇOS PRELIMINARES**  
**RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO**

COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	ÁREA	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
852,000	5,90	1,00	502,68	m²	ÁREA = C x L x Q 10% R. TOMÁS CAFÉ
174,00	9,30	1,00	161,82	m²	JOAQUIM LEITE
146,00	Var	1,00	128,65	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,00	6,00	1,00	122,40	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,00	Var	1,00	252,16	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,000	3,55	1,00	108,63	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,000	6,40	1,00	164,48	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,000	7,80	1,00	558,48	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,000	5,95	1,00	55,93	m²	R. DA CEPISA
1,5		Total	2.055,23	m²	ÁREA TOTAL

Obs: Estimativa de área conforme levantamento em campo

**SERVIÇOS PRELIMINARES**  
**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM**

ÁREA	ESPESSURA	KM	M³/KM	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
2.055,234	0,05	5,00	513,81	m³	TRANSPORTE = A*E*DMT

**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**  
**PINTURA DE LIGAÇÃO**

COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	ÁREA	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
852,000	5,90	1,00	5.026,80	m²	ÁREA = C x L x Q R. TOMÁS CAFÉ
174,000	9,30	1,00	1.618,20	m²	JOAQUIM LEITE
146,000	Var	1,00	1.286,50	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,000	6,00	1,00	1.224,00	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,000	Var	1,00	2.521,64	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,000	3,55	1,00	1.086,30	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,000	6,40	1,00	1.644,80	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,000	7,80	1,00	5.584,80	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,000	5,95	1,00	559,30	m²	R. DA CEPISA
2,1		Total	20.552,34	m²	ÁREA TOTAL

**CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA C - (AREIA E BRITA COMERCIAIS) CAPA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 5 cm**

ÁREA	ESPESSURA	QUANTIDADE	VOLUME	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
5.026,80	0,05	1,00	251,34	m³	VOLUME = C x L x E R. TOMÁS CAFÉ
1.618,20	0,05	1,00	80,91		JOAQUIM LEITE
1.286,50	0,05	1,00	64,33		JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
1.224,00	0,05	1,00	61,20	m³	TEIXEIRA SANTOS
2.521,64	0,05	1,00	126,08	m³	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
1.086,30	0,05	1,00	54,32	m³	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
1.644,80	0,05	1,00	82,24	m³	RUA CÂNDIDO PEREIRA
5.584,80	0,05	1,00	279,24	m³	R. MONSENHOR UCHOA
559,30	0,05	1,00	27,97	m³	R. DA CEPISA
			1.027,63	m³	VOLUME DE CBUQ
			2,40	t/m³	DENSIDADE
2,2		Total	2.466,31	t	QUANTIDADE TOTAL

**AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM BDI DE 15%**

QUANTIDADE (t)	TRAÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
2.466,31	0,06323	155,94	t	QUANTIDADE
2,3,1		Total	155,94	QUANTIDADE TOTAL

**AQUISIÇÃO DE RR-1C COM BDI DE 15%**

ÁREA	CONSUMO	QUANTIDADE	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
20.552,340	0,00045	9,25	t	RR-1C (0,00045 t/m²)
2,3,2		Total	9,25	QUANTIDADE TOTAL

**TRANSPORTE DOS AGREGADOS PARA O CONCRETO ASFÁLTICO**

QUANTIDADE (t)	TRAÇO	DMT (Km)	QUANTIDADE	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
2.466,31	0,48713	10,000	12.014,14	txkm	AREIA MÉDIA (TERESINA - USINA)
2.466,31	0,09368	49,200	11.367,36	txkm	BRITA Nº 0 (BRITADOR EM LAGOA DO PIAUÍ - USINA)
2.466,31	0,09368	49,200	11.367,36	txkm	BRITA Nº 1 (BRITADOR EM LAGOA DO PIAUÍ - USINA)
2.466,31	0,05620	10,000	1.386,07	txkm	CAL HIDRATADA (TERESINA PIAUÍ - USINA)
2.466,31	0,20609	49,200	25.007,47	txkm	PEDRISCO (BRITADOR EM LAGOA DO PIAUÍ - USINA)
2,4					

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / ORÇ: 1916129285



**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOCALIZAÇÃO:** TERESINA- VIAS PÚBLICAS

**MUNICÍPIO:** PEDRO II - PI

**TRECHO:** R. TOMÁS CAFÉ / JOAQUIM LEITE / JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02) / TEIXEIRA SANTOS / ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03) / RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA / RUA CÂNDIDO PEREIRA / R. MONSENHOR UCHOA / R. DA CEPISA

**EXTENSÃO:** 3.007,000 m

COMPRIENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (H)	QUANTIDADE (Q)	ÁREA (M²) OU VOLUME (M³) (A E V)	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
<b>RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO</b>						
			<b>QUANTIDADE</b>	<b>ÁREA</b>		<b>ÁREA = C x L x Q x 10%</b>
852,000	5,90		1,00	502,68	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,000	9,30		1,00	161,82	m²	JOAQUIM LEITE
146,000	Var		1,00	128,65	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,000	6,00		1,00	122,40	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,000	Var		1,00	252,16	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,000	3,55		1,00	108,63	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,000	6,40		1,00	164,48	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,000	7,80		1,00	558,48	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,000	5,95		1,00	55,93	m²	R. DA CEPISA
<b>1.5</b>			<b>Total</b>	<b>2.055,23</b>	<b>m²</b>	<b>ÁREA TOTAL</b>
Obs: Estimativa de área conforme levantamento em campo						

ÁREA	ESPESSURA	KM	MPXKM	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
2.055,234	0,05	5,00	513,81	m²	TRANSPORTE = A * E * DMT

QUANTIDADE (t)	DMT	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
2.466,31	212,10	t.km	USINA (TERESINA) - OBRA
<b>2.5</b>	<b>Total</b>	<b>t.km</b>	<b>TRANSPORTE TOTAL</b>

ÁREA	CONSUMO	QUANTIDADE	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
20.552,34	0,00045	9,25	t	RR-1C (0,00045 t/m²)
<b>2.6</b>		<b>Total</b>	<b>t</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>

QUANTIDADE (t)	TRAÇO	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
2.466,31	0,06323	155,94	t
<b>2.7</b>		<b>Total</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>

EXTENSÃO	Quantidade	Desconto	TOTAL	UNIDADE	COMPRIMENTO = E x Q
852,000	2,00	60,00	1.644,00	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,000	2,00		348,00	m²	JOAQUIM LEITE
146,000	2,00	12,00	280,00	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,000	2,00	12,00	396,00	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,000	2,00	24,00	492,00	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,000	2,00	36,00	576,00	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,000	2,00	12,00	502,00	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,000	2,00	60,00	1.372,00	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,000	2,00	18,00	170,00	m²	R. DA CEPISA
<b>3.1</b>			<b>Total</b>	<b>1.734,00</b>	<b>EXTENSÃO TOTAL X 30%</b>

Obs: Estimativa de metros conforme levantamento em campo, para correção dos trechos danificados.

EXTENSÃO	Quantidade	Desconto	TOTAL	UNIDADE	COMPRIMENTO = E x Q
852,000	2,00	60,00	1.644,00	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,000	2,00		348,00	m²	JOAQUIM LEITE
146,000	2,00	12,00	280,00	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,000	2,00	12,00	396,00	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,000	2,00	24,00	492,00	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,000	2,00	36,00	576,00	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,000	2,00	12,00	502,00	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,000	2,00	60,00	1.372,00	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,000	2,00	18,00	170,00	m²	R. DA CEPISA
<b>3.2</b>			<b>Total</b>	<b>1.734,00</b>	<b>EXTENSÃO TOTAL X 30%</b>

Obs: Estimativa de metros conforme levantamento em campo, para correção dos trechos danificados.

Placa	Área p/ Placa	Área Total	Quantidade	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
Regulamentação	0,36	1,08	3,00	und	R. TOMÁS CAFÉ
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	JOAQUIM LEITE
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	TEIXEIRA SANTOS
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	RUA CÂNDIDO PEREIRA
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	R. MONSENHOR UCHOA
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	R. DA CEPISA
<b>4.1</b>			<b>Total</b>	<b>19,00</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129285



**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOCALIZAÇÃO:** TERESINA- VIAS PÚBLICAS

**MUNICÍPIO:** PEDRO II - PI

**TRECHO:** R. TOMÁS CAFÉ / JOAQUIM LEITE / JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02) / TEIXEIRA SANTOS / ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03) / RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA / RUA CÂNDIDO PEREIRA / R. MONSENHOR UCHOA / R. DA CEPISA

**EXTENSÃO:** 3.007,000 m

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (H)	QUANTIDADE (Q)	ÁREA (M²) OU VOLUME (M³) (A E V)	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
-----------------	-------------	------------	----------------	----------------------------------	---------	-------------

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO**

COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	ÁREA	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
852,000	5,90	1,00	502,68	m²	ÁREA = C x L x Q x 10%
174,00	9,30	1,00	161,82	m²	R. TOMÁS CAFÉ
146,00	Var	1,00	128,65	m²	JOAQUIM LEITE
204,00	6,00	1,00	122,40	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
258,000	Var	1,00	252,16	m²	TEIXEIRA SANTOS
306,000	3,55	1,00	108,63	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
257,000	6,40	1,00	164,48	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
716,000	7,80	1,00	558,48	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
94,000	5,95	1,00	55,93	m²	R. MONSENHOR UCHOA
					R. DA CEPISA
<b>1,5</b>		<b>Total</b>	<b>2.055,23</b>	<b>m²</b>	<b>ÁREA TOTAL</b>

Obs: Estimativa de área conforme levantamento em campo

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM**

ÁREA	ESPESSURA	KM	MPKCM	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
2.055,234	0,05	5,00	513,81	m³	TRANSPORTE = A*E*DMT

**PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM**


COMPRIMENTO	COMP. FAIXA	LARGURA	ESPAÇAMENTO	ÁREA	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
852,00	2,00	0,10	4,00	206,91	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,00	2,00	0,10	4,00	42,26	m²	JOAQUIM LEITE
146,00	2,00	0,10	4,00	35,46	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,00	2,00	0,10	4,00	49,54	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,00	2,00	0,10	4,00	62,66	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,00	2,00	0,10	4,00	74,31	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,00	2,00	0,10	4,00	62,41	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,00	2,00	0,10	4,00	173,89	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,00	2,00	0,10	4,00	22,83	m²	R. DA CEPISA
<b>4,2</b>			<b>Total</b>	<b>730,27</b>	<b>m²</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>

**PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM**

Placa	Quantidade	Total	UNIDADE	OBSERVAÇÕES	
NOME DE RUA	6,00	6,00	und	R. TOMÁS CAFÉ	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	JOAQUIM LEITE	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	TEIXEIRA SANTOS	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA	
NOME DE RUA	2,00	2,00	und	RUA CÂNDIDO PEREIRA	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	R. MONSENHOR UCHOA	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	R. DA CEPISA	
<b>4,3</b>		<b>Total</b>	<b>36,00</b>	<b>und</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>

**SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO**

SUPORTE	Quantidade	Total	UNIDADE	OBSERVAÇÕES	
	19,00	19,00	und	QUANTIDADE	
<b>4,4</b>		<b>Total</b>	<b>19,00</b>	<b>und</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>

  
 Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129285

SECRETARIA  
DO **TURISMO** - SETUR




GOVERNO DO  
**PIAUI**  
AQUI TEM TRABALHO  
AQUI TEM FUTURO

ESTADO DO PIAUI  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR  
AV. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções,  
Bairro Cabral  
CEP 64002-830 - Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br



## 7.0 – Planilha Orçamentária Desonerado

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eno<sup>a</sup> Civil / OAB: 19161297-5

SECRETARIA DE TURISMO DO PIAUÍ  
Fis: 40  
2

**PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRO II DE VIAS PÚBLICAS EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE (C.B.U.Q.).**  
**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**  
**LOCAL: PEDRO II - PI**  
**EXTENSÃO: 2.983,70 m**



**PLANILHA RESUMO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (RS)
1.0	PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRO II DE VIAS PÚBLICAS EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE (C.B.U.Q.).	2.453.090,63
<b>TOTAL (RS)</b>		<b>2.453.090,63</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129285



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 2.983,70 m



QUADRO RESUMO SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		TOTAL (RS)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		96.725,16
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		2.166.171,58
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL		149.228,04
4.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		40.965,85
TOTAL (RS)			2.453.090,63

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>o</sup> Civil / CREA: 1916129285



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 2.983,70 m

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte: SINAPI: OUTUBRO/2022 - NOVO SICRO DNIT: OUTUBRO/2022 - ANP: OUTUBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO							BDI:	22,00%
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO	PREÇO	PREÇO	COMPOSIÇÃO	
				UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL		
				(R\$)	COM BDI 22,00 % (R\$)	(R\$)		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					96.725,16		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	11.747,88	14.332,41	14.332,41	C01	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	1,00	39.103,98	47.706,85	47.706,85	C02	
1.3	PLACA DA OBRA	und	1,00	441,51	538,64	538,64	C06	
1.4	CANTEIRO DE OBRA	mês	4,00	4.956,90	6.047,41	24.189,66	C07	
1.5	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO	m²	2.055,23	3,45	4,20	8.631,98	SICRO-1600412	
1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM	m³.km	513,81	2,12	2,58	1.325,62	SINAPI - 95876	
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					2.166.171,58		
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	20.552,34	0,28	0,34	6.987,79	SICRO-4011353	
2.2	CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA C - (AREIA E BRITA COMERCIAIS) CAPA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 5 cm	t	2.466,31	202,81	247,42	610.214,42	SICRO-4011463	
2.3	AQUISIÇÃO - MATERIAL BETUMINOSO					0,00		
2.3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM BDI DE 15%	t	155,94	4.823,32	5.546,81	864.969,55	ANP - C04	
2.3.2	AQUISIÇÃO DE RR-1C COM BDI DE 15%	t	9,25	3.494,50	4.018,67	37.172,69	ANP - C04	
2.4	TRANSPORTE DOS AGREGADOS PARA O CONCRETO ASFÁLTICO					0,00		
2.4.1	TRANSPORTE DE AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT= 15,00 km (TERESINA - USINA)	t.km	12.014,14	0,79	0,96	11.533,57	SICRO - 5914389	
2.4.2	TRANSPORTE DE BRITA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT= 49,2 km (LAGOA DO PIAUI - USINA)	t.km	22.734,72	0,79	0,96	21.825,33	SICRO - 5914389	
2.4.3	TRANSPORTE DE CAL DE HIDRATADA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT= 15 km (TERESINA - USINA)	t.km	1.386,07	0,79	0,96	1.330,62	SICRO - 5914389	
2.4.4	TRANSPORTE DE PEDRISCO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT= 49,2 km (LAGOA DO PIAUI - USINA)	t.km	25.007,47	0,79	0,96	24.007,17	SICRO - 5914389	
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ DE MASSA ASFÁLTICA EM RODOVIA PAVIMENTADA COM DMT = 212,10 km (USINA - OBRA)	t.km	523.104,35	0,79	0,96	502.180,17	SICRO - 5914389	
2.6	CÁLCULO DE TRANSPORTE (RR-1C) A FRIO COM DMT =490,00 km COM BDI DIFERENCIADO DE TRANSPORTE DE 15% (FORTALEZA - OBRA)	t	9,25	366,57	421,55	3.899,33	C05	
2.7	CÁLCULO DE TRANSPORTE DE CAP 50/70 A QUENTE COM DMT = 638,00 km COM BDI DIFERENCIADO DE TRANSPORTE DE 15% (FORTALEZA - USINA)	t	155,94	457,54	526,17	82.050,94	C06	
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL					149.228,04		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO M PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.734,00	41,79	50,98	88.399,32	SINAPI - 94273	
3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 5CM ALTURA	m	1.734,00	28,76	35,08	60.828,72	C08-ADAPTADA	
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					40.965,85		
4.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	19,00	223,54	272,71	5.181,49	SICRO-5213440	
4.2	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	m²	730,27	18,92	23,08	16.854,63	SICRO-5213403	
4.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	36,00	365,74	446,20	16.063,20	C09 - ADAPTADA	
4.4	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	19,00	123,67	150,87	2.866,53	SICRO-5216111	
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>2.453.090,63</b>		

Importa o presente orçamento em **R\$ 2.453.090,63 (Dois Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil e Noventa Reais e Sessenta e Três Centavos).**

  
 Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129285





**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOCALIZAÇÃO:** TERESINA- VIAS PÚBLICAS  
**MUNICÍPIO:** PEDRO II - PI  
**TRECHO:** R. TOMÁS CAFÉ / JOAQUIM LEITE / JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02) / TEIXEIRA SANTOS / ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03) / RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA / RUA CÂNDIDO PEREIRA / R. MONSENHOR UCHOA / R. DA CEPISA  
**EXTENSÃO:** 3.007,00 m

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (H)	QUANTIDADE (Q)	ÁREA (M²) OU VOLUME (M³) (A E V)	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
-----------------	-------------	------------	----------------	----------------------------------	---------	-------------

**SERVIÇOS PRELIMINARES**  
**RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO**

COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	ÁREA	UNIDADE	ÁREA = C x L x Q x 10%
852,00	5,90	1,00	502,68	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,00	9,30	1,00	161,82	m²	JOAQUIM LEITE
146,00	Var	1,00	128,65	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,00	6,00	1,00	122,40	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,00	Var	1,00	252,16	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,00	3,55	1,00	108,63	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,00	6,40	1,00	164,48	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,00	7,80	1,00	558,48	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,00	5,95	1,00	55,93	m²	R. DA CEPISA
1,5		Total	2.055,23	m²	ÁREA TOTAL

Obs: Estimativa de área conforme levantamento em campo

**SERVIÇOS PRELIMINARES**  
**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM**

ÁREA	ESPESSURA	KM	M³ X KM	UNIDADE	TRANSPORTE = A*E*DMT
2.055,234	0,05	5,00	513,81	m³	

**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**  
**PINTURA DE LIGAÇÃO**

COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	ÁREA	UNIDADE	ÁREA = C x L x Q
852,000	5,90	1,00	5.026,80	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,000	9,30	1,00	1.618,20	m²	JOAQUIM LEITE
146,000	Var	1,00	1.286,50	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,000	6,00	1,00	1.224,00	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,000	Var	1,00	2.521,64	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,000	3,55	1,00	1.086,30	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,000	6,40	1,00	1.644,80	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,000	7,80	1,00	5.584,80	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,000	5,95	1,00	559,30	m²	R. DA CEPISA
2,1		Total	20.552,34	m²	ÁREA TOTAL

**CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA C - (AREIA E BRITA COMERCIAIS) CAPA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 5 cm**

ÁREA	ESPESSURA	QUANTIDADE	VOLUME	UNIDADE	VOLUME = C x L x E
5.026,80	0,05	1,00	251,34	m³	R. TOMÁS CAFÉ
1.618,20	0,05	1,00	80,91	m³	JOAQUIM LEITE
1.286,50	0,05	1,00	64,33	m³	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
1.224,00	0,05	1,00	61,20	m³	TEIXEIRA SANTOS
2.521,64	0,05	1,00	126,08	m³	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
1.086,30	0,05	1,00	54,32	m³	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
1.644,80	0,05	1,00	82,24	m³	RUA CÂNDIDO PEREIRA
5.584,80	0,05	1,00	279,24	m³	R. MONSENHOR UCHOA
559,30	0,05	1,00	27,97	m³	R. DA CEPISA
			1.027,63	m³	VOLUME DE CBUQ
			2,40	t/m³	DENSIDADE
2,2		Total	2.466,31	t	QUANTIDADE TOTAL

**AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM BDI DE 15%**

QUANTIDADE (t)	TRAÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL
2.466,31	0,06323	155,94	t	
2,3,1		Total	155,94	t

**AQUISIÇÃO DE RR-1C COM BDI DE 15%**

ÁREA	CONSUMO	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL
20.552,340	0,00045	9,25	t	RR-2C (0,00045 t/m²)
2,3,2		Total	9,25	t

**TRANSPORTE DOS AGREGADOS PARA O CONCRETO ASFÁLTICO**

QUANTIDADE (t)	TRAÇO	DMT (Km)	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL
2.466,31	0,48713	10,000	txkm	AREIA MÉDIA (TERESINA - USINA)
2.466,31	0,09368	49,200	txkm	BRITA Nº 0 (BRITADOR EM LAGOA DO PIAUÍ - USINA)
2.466,31	0,09368	49,200	txkm	BRITA Nº 1 (BRITADOR EM LAGOA DO PIAUÍ - USINA)
2.466,31	0,05620	10,000	txkm	CAL HIDRATADA (TERESINA PIAUÍ - USINA)
2.466,31	0,20609	49,200	txkm	PEDRISCO (BRITADOR EM LAGOA DO PIAUÍ - USINA)
2,4				

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129283



**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOCALIZAÇÃO:** TERESINA- VIAS PÚBLICAS  
**MUNICÍPIO:** PEDRO II - PI  
**TRECHO:** R. TOMÁS CAFÉ / JOAQUIM LEITE / JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02) / TEIXEIRA SANTOS / ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03) / RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA / RUA CÂNDIDO PEREIRA / R. MONSENHOR UCHOA / R. DA CEPISA  
**EXTENSÃO:** 3.007,00 m

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (H)	QUANTIDADE (Q)	ÁREA (M²) OU VOLUME (M³) (A E V)	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
-----------------	-------------	------------	----------------	----------------------------------	---------	-------------

**SERVIÇOS PRELIMINARES**  
**RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO**

COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	ÁREA	UNIDADE	ÁREA = C x L x Q x 10%
852,00	5,90	1,00	502,68	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,00	9,30	1,00	161,82	m²	JOAQUIM LEITE
146,00	Var	1,00	128,65	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,00	6,00	1,00	122,40	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,00	Var	1,00	252,16	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,00	3,55	1,00	108,63	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,00	6,40	1,00	164,48	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,00	7,80	1,00	558,48	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,00	5,95	1,00	55,93	m²	R. DA CEPISA
<b>1.5</b>		<b>Total</b>	<b>2.055,23</b>	<b>m²</b>	<b>ÁREA TOTAL</b>

Obs: Estimativa de área conforme levantamento em campo

**SERVIÇOS PRELIMINARES**  
**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM**

ÁREA	ESPESSURA	KM	M³ X KM	UNIDADE	TRANSPORTE = A*E*DMT
2.055,234	0,05	3,00	513,81	m²	

**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ DE MASSA ASFALTICA EM RODOVIA PAVIMENTADA COM DMT = 212,10 km (USINA - OBRA)**

QUANTIDADE (t)	DMT	UNIDADE	USINA (TERESINA) - OBRA
2.466,31	212,10	t.km	
<b>2.5</b>	<b>Total</b>	<b>523.104,35</b>	<b>TRANSPORTE TOTAL</b>

**CÁLCULO DE TRANSPORTE (RR-1C) A FRIO COM DMT =490,00 km COM BDI DIFERENCIADO DE TRANSPORTE DE 15% (FORTALEZA - OBRA)**

ÁREA	CONSUMO	QUANTIDADE	UNIDADE	RR-2C (0,00045 t/m²)
20.552,34	0,00045	9,25	t	
<b>2.6</b>		<b>Total</b>	<b>9,25</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>

**CÁLCULO DE TRANSPORTE DE CAP 50/70 A QUENTE COM DMT = 638,00 km COM BDI DIFERENCIADO DE TRANSPORTE DE 15% (FORTALEZA - USINA)**

QUANTIDADE (t)	TRAÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.466,31	0,06323	t	155,94
<b>2.7</b>		<b>Total</b>	<b>155,94</b>

**ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO M PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF\_06/2016**

EXTENSÃO	Quantidade	Desconto	TOTAL	UNIDADE	COMPRIMENTO = E x Q
852,000	2,00	60,00	1.644,00	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,000	2,00		348,00	m²	JOAQUIM LEITE
146,000	2,00	12,00	280,00	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,000	2,00	12,00	396,00	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,000	2,00	24,00	492,00	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,000	2,00	36,00	576,00	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,000	2,00	12,00	502,00	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,000	2,00	60,00	1.372,00	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,000	2,00	18,00	170,00	m²	R. DA CEPISA
<b>3.1</b>			<b>Total</b>	<b>1.734,00</b>	<b>EXTENSÃO TOTAL X 30%</b>

Obs: Estimativa de metros conforme levantamento em campo, para correção dos trechos danificados.

**EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 5CM ALTURA**

EXTENSÃO	Quantidade	Desconto	TOTAL	UNIDADE	COMPRIMENTO = E x Q
852,000	2,00	60,00	1.644,00	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,000	2,00		348,00	m²	JOAQUIM LEITE
146,000	2,00	12,00	280,00	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,000	2,00	12,00	396,00	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,000	2,00	24,00	492,00	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,000	2,00	36,00	576,00	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,000	2,00	12,00	502,00	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,000	2,00	60,00	1.372,00	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,000	2,00	18,00	170,00	m²	R. DA CEPISA
<b>3.2</b>			<b>Total</b>	<b>1.734,00</b>	<b>EXTENSÃO TOTAL X 30%</b>

Obs: Estimativa de metros conforme levantamento em campo, para correção dos trechos danificados.

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 191612925-0

**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOCALIZAÇÃO:** TERESINA- VIAS PÚBLICAS  
**MUNICÍPIO:** PEDRO II - PI  
**TRECHO:** R. TOMÁS CAFÉ / JOAQUIM LEITE / JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02) / TEIXEIRA SANTOS / ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03) / RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA / RUA CÂNDIDO PEREIRA / R. MONSENHOR UCHOA / R. DA CEPISA  
**EXTENSÃO:** 3.007,00 m

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (H)	QUANTIDADE (Q)	ÁREA (M²) OU VOLUME (M³) (A E V)	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
-----------------	-------------	------------	----------------	----------------------------------	---------	-------------

**SERVIÇOS PRELIMINARES**  
**RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO**

COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	ÁREA	UNIDADE	ÁREA = C x L x Q x 10%
852,00	5,90	1,00	502,68	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,00	9,30	1,00	161,82	m²	JOAQUIM LEITE
146,00	Var	1,00	128,65	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,00	6,00	1,00	122,40	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,00	Var	1,00	252,16	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,00	3,55	1,00	108,63	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,00	6,40	1,00	164,48	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,00	7,80	1,00	558,48	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,00	5,95	1,00	55,93	m²	R. DA CEPISA
1,5		<b>Total</b>	<b>2.055,23</b>	<b>m²</b>	<b>ÁREA TOTAL</b>

Obs: Estimativa de área conforme levantamento em campo

**SERVIÇOS PRELIMINARES**  
**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM**

ÁREA	ESPESSURA	KM	M² X KM	UNIDADE	TRANSPORTE = A*E*DMT
2.055,234	0,05	5,00	513,81	m²	

**PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO**

Placa	Área p/ Placa	Área Total	Quantidade	UNIDADE	
Regulamentação	0,36	1,08	3,00	und	R. TOMÁS CAFÉ
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	JOAQUIM LEITE
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	TEIXEIRA SANTOS
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	RUA CÂNDIDO PEREIRA
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	R. MONSENHOR UCHOA
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	R. DA CEPISA
4.1		<b>Total</b>	<b>19,00</b>	<b>und</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>

**PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM**

EXTENSÃO	COMP. FAIXA	LARGURA	ESPAÇAMENTO	ÁREA	UNIDADE	
852,00	2,00	0,10	4,00	206,91	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,00	2,00	0,10	4,00	42,26	m²	JOAQUIM LEITE
146,00	2,00	0,10	4,00	35,46	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,00	2,00	0,10	4,00	49,54	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,00	2,00	0,10	4,00	62,66	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,00	2,00	0,10	4,00	74,31	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,00	2,00	0,10	4,00	62,41	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,00	2,00	0,10	4,00	173,89	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,00	2,00	0,10	4,00	22,83	m²	R. DA CEPISA
4.2		<b>Total</b>	<b>4,00</b>	<b>730,27</b>	<b>m²</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>

**PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM**

Placa	Quantidade	Total	UNIDADE		
NOME DE RUA	6,00	6,00	und	R. TOMÁS CAFÉ	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	JOAQUIM LEITE	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	TEIXEIRA SANTOS	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA	
NOME DE RUA	2,00	2,00	und	RUA CÂNDIDO PEREIRA	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	R. MONSENHOR UCHOA	
NOME DE RUA	4,00	4,00	und	R. DA CEPISA	
4.3		<b>Total</b>	<b>36,00</b>	<b>und</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>

**SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO**

SUPORTE	Quantidade	Total	UNIDADE		
	19,00	19,00	und	QUANTIDADE	
4.4		<b>Total</b>	<b>19,00</b>	<b>und</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>

  
 Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129285

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE**

**MATERIAL PARA O C.B.U.Q.**

- D1: DISTÂNCIA DA AREIA MEDIA (TERESINA- USINA DE ASFALTO)  
 D2: DISTÂNCIA DA BRITA (BRITADOR EM LAGO DO PIAUÍ - USINA DE ASFALTO )  
 D3: DISTÂNCIA PEDRISCO (BRITADOR EM LAGO - USINA DE ASFALTO)  
 D4: DISTÂNCIA DA USINA - O LOCAL DA OBRA



D1 = 10,00 km  
 D2 = 49,20 km  
 D3 = 49,20 km  
 D4 = 212,10 km

**Observações:**

- 1) Será utilizada a Usina de asfalto da Prefeitura Municipal de Teresina-PI  
 2) O transporte de massa asfáltica (D4) corresponde a distância entre o local da usina de asfalto e o local da obra.

**CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT DA JAZIDA/EMPRESTIMO**

Distância entre estacas: 20,00 m  
 Largura média da plataforma (l): 6,20 m  
 Espessura da camada CAUQ (e): 0,05 m  
 Extensão do trecho (m): 3.007,00 m

**CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT DA MASSA ASFÁLTICA**

MASSA	Km	Km Ré (A)	Km Vante (B)	DMT 1 (m)	DMT 2 (m)	Dist. Fixa (m)	DMT (m)
MASSA ASFÁLTICA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	210.000,00	212.100,000
						<b>DMT total</b>	<b>212.100,00</b>
						<b>DMT total (Km)</b>	<b>212,10</b>

  
 Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129285

**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**

**LOCAL: PEDRO II - PI**


**EXTENSÃO: 2.983,70 m**

**BDI 22,00 %**



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Discriminação dos serviços	Valor Obras/ Serviços (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.725,16	R\$ 48.362,58	R\$ 29.017,55	R\$ 9.672,52	R\$ 9.672,52	3,94
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.166.171,58	R\$ 649.851,47	R\$ 649.851,47	R\$ 433.234,32	R\$ 433.234,32	88,30
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 149.228,04	R\$ 44.768,41	R\$ 44.768,41	R\$ 29.845,61	R\$ 29.845,61	6,08
4.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 40.965,85		R\$ 12.289,76	R\$ 16.386,34	R\$ 12.289,76	1,67
<b>Total</b>	<b>Simple</b>	<b>R\$ 2.453.090,63</b>	<b>R\$ 742.982,47</b>	<b>R\$ 735.927,19</b>	<b>R\$ 489.138,78</b>	<b>R\$ 485.042,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>Acumulado</b>	<b>R\$ 2.453.090,63</b>	<b>R\$ 742.982,47</b>	<b>R\$ 1.478.909,66</b>	<b>R\$ 1.968.048,44</b>	<b>R\$ 2.453.090,63</b>	<b>100,00</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>o</sup> Civil / CREA: 1916129285



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 2.983,70 m



BDI 22,00 %

TABELAS: Sicro-PI Outubro - 2022 Com Desoneração

C01 - COMPOSIÇÃO

CUSTO COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (TERESINA-CANTEIRO DE OBRA)

1	EQUIPAMENTOS	Origem	Destino	Código SICRO	Distância KM (Ida)	K (Com Retorno)	Velocidade (Km/h)	Fator de Utilização (Fu)	Preço Unt operativo	Quantidade	Preço Total	Fonte de Preço	Equipamento p/ condução
1.1	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (IDA)												
1.1.1	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Teresina	Canteiro	E9558	50	2,00	60	1,00	429,7282	1,00	716,21	SICRO	E9666 - Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 30 t - 265 kW
1.1.2	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 KW	Teresina	Canteiro	E9584	50	2,00	60	1,00	429,7282	1,00	716,21	SICRO	E9666 - Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 30 t - 265 kW
1.1.3	Rolo compactador lio tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 KW	Teresina	Canteiro	E9681	50	2,00	60	0,50	429,7282	1,00	358,11	SICRO	E9666 - Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 30 t - 265 kW
1.1.4	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 KW	Teresina	Canteiro	E9545	50	2,00	60	0,50	429,7282	1,00	358,11	SICRO	E9666 - Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 30 t - 265 kW
1.1.5	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 KW	Teresina	Canteiro	E9762	50	2,00	60	0,50	429,7282	1,00	358,11	SICRO	E9666 - Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 30 t - 265 kW
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (IDA)											2.506,75		
1.2	VEICULOS DE PRODUÇÃO (IDA)												
1.2.1	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 KW	Teresina	Canteiro	E9579	50	2,00	60	1,00	293,5497	5,00	2.446,25	SICRO	Cond. por Conta Propria - E9579
1.2.2	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw	Teresina	Canteiro	E9562	50	2,00	60	1,00	277,8275	1,00	463,05	SICRO	Cond. por Conta Propria - E9508
1.2.3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 KW/136 Kw	Teresina	Canteiro	E9509	50	2,00	60	1,00	274,7360	1,00	457,89	SICRO	Cond. por Conta Propria - E9509
SUBTOTAL VEICULOS DE PRODUÇÃO (IDA)											3.367,19		
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO											5.873,94		
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											11.747,88		
BDI 22,00%											2.584,53		
TOTAL GERAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											14.332,41		

Sendo:

Saida: Teresina-PI / Destino: Canteiro de Obra (Inicio do Trecho)

Distância adotada para ponto de partida até o canteiro de obra 50,00 km

Velocidade média adotada 60 km/h (baseado Manual do DNIT)

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPE

Quant.	Equipamentos
1	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG.
1	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL DE VARRIMENTO DE 2,44 M.
1	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T.
1	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T
1	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRÁTÓRIO AUTROPELIDO DE 11,6 t - 82 KW
1	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M.
1	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 136 KW.
1	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAÇAMBA CAPACIDADE DE 1,5 M³
1	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG
1	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H
1	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
1	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10 000 l
1	CAMINHÃO CARROCERIA 9T

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129285





OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 2.983,70 m



C02 - COMPOSIÇÃO

TABELAS: SICRO OUTUBRO - 2022 Com Desoneração

ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						UNID.: UND	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	% de Utilização	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL	
MAO DE OBRA							
P9812	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	MÊS	2,0000	30%	19.454,21	11.672,53	
P9893	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	MÊS	2,0000	80%	6.640,62	10.624,99	
P9804	APONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,0000	70%	3.871,44	5.420,02	
P9803	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,0000	60%	4.916,61	5.899,93	
P9827	VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,0000	70%	3.918,94	5.486,52	
Total Simples						39.103,98	
BDI (22,00%)						8.602,88	
TOTAL GERAL						47.706,86	

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129285


OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 2.983,70 m

C03 - COMPOSIÇÃO

PREÇO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO

 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  
CDC - Coordenadoria de Defesa da Concorrência

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS - 2022


Produto: CAP 50/70

Unidade - R\$/kg

UF	mal/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Ceará	-	-	-	-	-	3,7791	-	-	-	-	-	-

Notas:

**CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO CAP 50/70 - M101/ANP (ICMS 18% E BDI 15,00%)**  
 Aquisição =  $(3,7791 * 1000 / ((1 - 0,18 - 0,0065 - 0,03)) * 1,15$   
 Aquisição = R\$ 5.546,82 /ton

 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  
CDC - Coordenadoria de Defesa da Concorrência

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS - 2022

Produto: RR-1C

Unidade - R\$/kg

UF	mal/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Ceará	-	-	-	-	-	2,7379	-	-	-	-	-	-

**CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO RR-1C - M103/ANP (ICMS 18% E BDI 15,00%)**  
 Aquisição =  $(2,7379 * 1000 / ((1 - 0,18 - 0,0065 - 0,03)) * 1,15$   
 Aquisição = R\$ 4.018,67 /ton

  
 Yanna Caroline Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129285





OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 2.983,70 m



**C04 E C05 - COMPOSIÇÃO**

**TRANSPORTE DE MATERIAL**

TABELAS: Sicro-PI Outubro - 2022 Com Desoneração

Descrição	Código	Referência	Und	Coeficiente	Preço	Total																																		
<b>CÁLCULO DE TRANSPORTE (RR-1C) A FRIO COM DMT =490,00 km COM BDI DIFERENCIADO DE TRANSPORTE DE 15% (FORTALEZA - OBRA)</b>	<b>C05</b>	<b>SICRO</b>	<b>T</b>		<b>421,56</b>																																			
Distância de Transporte - Material Betuminoso (D)	490,00		km			RODOVIA PAVIMENTADA																																		
ICMS (PIAUÍ)	18,00		%																																					
<p>1 - Custo de Transporte a Frio em rodovia pavimentada  <math>T = ((26,939 + 0,253 \times D1) / (1-ICMS)) \times IT / \text{ton.}</math>                      Atualização dos Índices para Transporte de Materiais Betuminosos</p> <p><b>ÍNDICE REAJUSTE DE PAVIMENTAÇÃO</b>                      Julho/2014 - 270,237                      Outubro/2022 - 537,964 Índice de atualização até a data base &gt; I = 1,9907  <b>Índice Final de Atualização</b> <span style="float: right;"><b>IT = &gt; 1,9907</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Cálculo Atualizado</b></p> <p>TRANSPORTE A FRIO</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Fixo</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">26,939</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">26,939 x IT =</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">53,627</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Variável</td> <td style="text-align: center;">0,253</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,253 x IT =</td> <td style="text-align: right;">0,504</td> <td></td> </tr> </table> <p>Fórmula Atualizada  <math>T = (53,627 + 0,504 \times D1) / (1-ICMS) / \text{ton.}</math></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">R\$/T</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">366,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Custo Horário da Mão-de-obra</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>366,57</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Custo Unitário Direto Total</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>366,57</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Lucro e Despesas Indiretas (15%)</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>54,99</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Preço Unitário Total</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>421,56</b></td> </tr> </table>								Fixo	26,939		26,939 x IT =	53,627			Variável	0,253		0,253 x IT =	0,504			R\$/T		366,57		<b>Custo Horário da Mão-de-obra</b>		<b>366,57</b>		<b>Custo Unitário Direto Total</b>		<b>366,57</b>		<b>Lucro e Despesas Indiretas (15%)</b>		<b>54,99</b>		<b>Preço Unitário Total</b>		<b>421,56</b>
	Fixo	26,939		26,939 x IT =	53,627																																			
	Variável	0,253		0,253 x IT =	0,504																																			
	R\$/T		366,57																																					
	<b>Custo Horário da Mão-de-obra</b>		<b>366,57</b>																																					
	<b>Custo Unitário Direto Total</b>		<b>366,57</b>																																					
	<b>Lucro e Despesas Indiretas (15%)</b>		<b>54,99</b>																																					
	<b>Preço Unitário Total</b>		<b>421,56</b>																																					

Descrição	Código	Referência	Und	Coeficiente	Preço	Total																																		
<b>CÁLCULO DE TRANSPORTE DE CAP 50/70 A QUENTE COM DMT = 638,00 km COM BDI DIFERENCIADO DE TRANSPORTE DE 15% (FORTALEZA - USINA)</b>	<b>C06</b>	<b>SICRO</b>	<b>T</b>		<b>526,17</b>																																			
Distância de Transporte - Material Betuminoso (D)	638,00		km			RODOVIA PAVIMENTADA																																		
ICMS (PIAUÍ)	18,00		%																																					
<p>1 - Custo de Transporte a Quente em rodovia pavimentada  <math>T = ((26,939 + 0,253 \times D1) / (1-ICMS)) \times IT / \text{ton.}</math>                      Atualização dos Índices para Transporte de Materiais Betuminosos</p> <p><b>ÍNDICE REAJUSTE DE PAVIMENTAÇÃO</b>                      Julho/2014 - 270,237                      Outubro/2022 - 537,964 Índice de atualização até a data base &gt; I = 1,9907  <b>Índice Final de Atualização</b> <span style="float: right;"><b>IT = &gt; 1,9907</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Cálculo Atualizado</b></p> <p>TRANSPORTE A QUENTE</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Fixo</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">26,939</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">26,939 x IT =</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">53,627</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Variável</td> <td style="text-align: center;">0,253</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,253 x IT =</td> <td style="text-align: right;">0,504</td> <td></td> </tr> </table> <p>Fórmula Atualizada  <math>T = (53,627 + 0,504 \times D1) / (1-ICMS) / \text{ton.}</math></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">R\$/T</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">457,54</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Custo Horário da Mão-de-obra</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>457,54</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Custo Unitário Direto Total</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>457,54</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Lucro e Despesas Indiretas (15%)</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>68,63</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Preço Unitário Total</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>526,17</b></td> </tr> </table>								Fixo	26,939		26,939 x IT =	53,627			Variável	0,253		0,253 x IT =	0,504			R\$/T		457,54		<b>Custo Horário da Mão-de-obra</b>		<b>457,54</b>		<b>Custo Unitário Direto Total</b>		<b>457,54</b>		<b>Lucro e Despesas Indiretas (15%)</b>		<b>68,63</b>		<b>Preço Unitário Total</b>		<b>526,17</b>
	Fixo	26,939		26,939 x IT =	53,627																																			
	Variável	0,253		0,253 x IT =	0,504																																			
	R\$/T		457,54																																					
	<b>Custo Horário da Mão-de-obra</b>		<b>457,54</b>																																					
	<b>Custo Unitário Direto Total</b>		<b>457,54</b>																																					
	<b>Lucro e Despesas Indiretas (15%)</b>		<b>68,63</b>																																					
	<b>Preço Unitário Total</b>		<b>526,17</b>																																					

  
 Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129285

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 2.983,70 m



**C06 - COMPOSIÇÃO**

COMP-06 - Placa da obra em chapa de aço galvanizado - 3,0 x 2,0 m (01 placa) (m2)

TABELAS: Sicro-PI Outubro - 2022 Com Desoneração

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	1,00000000	21,12	21,12
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	2,00000000	16,93	33,87
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>54,99</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	SICRO NOVO	m	1,00000000	4,73	4,73
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	SICRO NOVO	m	4,00000000	21,44	85,76
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	SICRO NOVO	kg	11,78000000	14,65	172,59
M1205	Prego de ferro	SICRO NOVO	kg	0,11000000	14,51	1,60
M3238	Película não retrorrefletiva tipo IV	SICRO NOVO	m <sup>2</sup>	1,00000000	118,57	118,57
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>383,25</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m <sup>3</sup>	0,01000000	327,70	3,28
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>3,28</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>441,51</b>
<b>TAXA DE BDI (22,00 %):</b>						<b>97,13</b>
<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO:</b>						<b>538,64</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129285



**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**

**LOCAL: PEDRO II - PI**

**EXTENSÃO: 2.983,70 m**

**C07 - COMPOSIÇÃO**

**COMPOSIÇÕES CANTEIRO DE OBRAS / SICRO PI - OUTUBRO/2022**

Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos  
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: outubro de 2022

Item	Código	Tipo	Unidade	Custo unitário (R\$ / un)
Imóveis	B8951	Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI)	m² x mês	46,26
	B8952	Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI)	m² x mês	30,25
Mobiliário	B8953	Escritório	ocupante x mês	510,27
	B8954	Residência	ocupante x mês	41,94
Cesta das Instalações	B8955	Laboratório de asfalto	mês	5.662,88
	B8956	Laboratório de concreto	mês	4.065,74
	B8957	Laboratório de solos	mês	4.478,52
	B8958	Topografia	mês	2.967,36
Custos Diversos	B8959	Escritório	ocupante x mês	128,84
	B8960	Residência	ocupante x mês	196,01

Fonte: FGV IBRE

Discriminação	unidade	Quant.	Custo Unit.		Total
Imóvel Residencial	m² x mês	300	30,25	50%	4.537,50
Imobiliário Residencial	ocupante x mês	20	41,94	50%	419,40
<b>Total Sem BDI:</b>					<b>4.956,90</b>
<b>Total Sem BDI em 4 mês:</b>					<b>19.827,60</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA 1916129285



**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**  
**LOCAL: PEDRO II - PI**  
**EXTENSÃO: 2.983,70 m**

**C08 - COMPOSIÇÃO**

**PREÇO BASE: SINAPI PI 10/2022 E SICRO PI 10/2022 - COM DESONERAÇÃO**

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
DROP	94287 ADAPTADA	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_06/2016	M		37,44	
INSUMO	M0028	Areia média	M3	0,01	129,55	1,30
INSUMO	M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	M	0,2	3,08	0,62
INSUMO	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	M	0,083	18,00	1,49
INSUMO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	0,019	426,57	8,10
COMPOSICAO	P9821	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454	21,05	9,56
COMPOSICAO	P9824	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454	16,93	7,69
<b>CUSTO DIRETO TOTAL:</b>					<b>28,76</b>	
<b>TAXA DE BDI (% 22,00):</b>					<b>6,32</b>	
<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO:</b>					<b>35,08</b>	

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil - CREA: 1916129188

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 2.983,70 m



**C09 - COMPOSIÇÃO**

**PREÇO BASE: SINAPI PI 10/2022 E SICRO PI 10/2022 - COM DESONERAÇÃO**

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
PAVI	103696 ADAPTADA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN		130,72	
INSUMO	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 20CM X 45CM	UND	2	99	198,00
COMPOSICAO	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UND	1	130,72	130,72
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5152	21,05	10,85
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5455	16,93	26,17
					<b>CUSTO DIRETO TOTAL:</b>	<b>365,74</b>
					<b>TAXA DE BDI (% 22,00):</b>	<b>80,46</b>
					<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO:</b>	<b>446,20</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129285

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

**Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:**

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias	18,80%	20,97%	24,23%

2.3. Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias":

PARCELA DO BDI	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	0,50%	0,58%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS e ISSQN	Conforme legislação específica		

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;  
 S: taxa de seguros;  
 R: taxa de riscos;  
 G: taxa de garantias;  
 DF: taxa de despesas financeiras;  
 L: taxa de lucro/remuneração;  
 I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

**OBSERVAÇÕES**

Parâmetro	%	Verificação	CÁLCULO DO BDI	
Administração Central	4,01%	OK	22,00%	a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Seguros e Garantias	0,40%	OK	OK	b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 4,5% no item impostos.
Riscos	0,56%	OK		
Despesas Financeiras	1,11%	OK		c) Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Lucro	7,30%	OK		
Tributos	6,65%	OK		
PIS	0,65%			
COFINS	3,00%			
CPRB	0,00%			
ISSQN	3,00%			

  
 Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129255

**COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO DO MATERIAL BETUMINOSO**

ITEM	COMPONENTE	PERCENTUAL (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,48
R	RISCO	0,85
DF	DESPESA FINANCEIRA	0,85
L	LUCRO	4,86
I	IMPOSTOS/ TRIBUTOS	3,65
I.1	PIS	0,65
I.2	COFINS	3,00
I.3	ISS	
I.4	INSS	
<b>BDI</b>	<b><math>[(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I)] - 1</math></b>	<b>15,00</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129285



Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1600412 SICRO3	Raspagem e limpeza de terreno plano		m²	1,0000000	3,45	3,45
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			16,9345	16,9345
						<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>	<b>16,9345</b>
						<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
						<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>16,9345</b>
						<b>Fator de influencia da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0173</b>
						<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0585</b>
						<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>5,0000</b>
						<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>3,3869</b>
						<b>MO sem LS =&gt;</b>	<b>3,39</b>
						<b>LS =&gt;</b>	<b>0,00</b>
						<b>MO com LS =&gt;</b>	<b>3,39</b>
						<b>Valor do BDI =&gt;</b>	<b>0,75</b>
						<b>Valor com BDI =&gt;</b>	<b>4,20</b>
<b>2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	95876 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	2,12	2,12
Composição Auxiliar	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0059000	332,03	1,95
Composição Auxiliar	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0025000	71,73	0,17
						<b>MO sem LS =&gt;</b>	<b>0,11</b>
						<b>LS =&gt;</b>	<b>0,00</b>
						<b>MO com LS =&gt;</b>	<b>0,11</b>
						<b>Valor do BDI =&gt;</b>	<b>0,46</b>
						<b>Valor com BDI =&gt;</b>	<b>2,58</b>
<b>3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	4011353 SICRO3	Pintura de ligação		m²	1,0000000	0,28	0,28
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Custo Operacional Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>
Insumo	E9509 SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/138 kW	1,0000000	1,00	0,00	274,7360	88,7673
Insumo	E9558 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	55,8084	37,9832
						<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>	<b>385,9488</b>
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			16,9345	33,8690
						<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>	<b>33,8690</b>
						<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
						<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>419,8178</b>
						<b>Fator de influencia da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0029</b>
						<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0008</b>
						<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>1.800,0000</b>
						<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>0,2799</b>
<b>C</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>		<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	SICRO3 M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0004500	t		0,0000	0,0000
						<b>Custo Total do Material =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
						<b>MO sem LS =&gt;</b>	<b>0,02</b>
						<b>LS =&gt;</b>	<b>0,00</b>
						<b>MO com LS =&gt;</b>	<b>0,02</b>
						<b>Valor do BDI =&gt;</b>	<b>0,06</b>
						<b>Valor com BDI =&gt;</b>	<b>0,34</b>
<b>4</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	4011463 SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais		t	1,0000000	202,81	202,81
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Custo Operacional Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 65 kW	1,0000000	0,71	0,29	239,8302	110,3299
Insumo	E9681 SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,82	0,18	280,7459	94,8088
Insumo	E9545 SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	335,2726	142,8027
						<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>	<b>784,8245</b>
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	8,0000000			16,9345	135,4760
						<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>	<b>135,4760</b>
						<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
						<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>920,3005</b>
						<b>Fator de influencia da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0029</b>
						<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0268</b>
						<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>99,6000</b>
						<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>9,2400</b>
<b>D</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Atividades Auxiliares</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>		<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>
Atividade Auxiliar	SICRO3 6418078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	1,0200000	t		162,1300	165,7726
						<b>Custo Total das Atividades =&gt;</b>	<b>185,7726</b>
<b>E</b>	<b>Banco Insumo</b>	<b>Tempos Fixos</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>
Tempo Fixo	SICRO3 6418078	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto/100/140 th e descarga em vibrocabadora	5914649	1,0200000	t	7,6200	7,7724
						<b>Custo Total dos Tempos Fixos =&gt;</b>	<b>7,7724</b>
<b>F</b>	<b>Banco Insumo</b>	<b>Momento de Transporte</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Distância Média de Transporte (DMT)</b>	<b>Custo Horário</b>	
					LN RP P		

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / AREA: 19161253



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CBLUQ TERESINA\_SETUR



Bancos  
SINAPI - 10/2022 - Piauí  
SICRO3 - 10/2022 - Piauí

B.D.I.  
22,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%



Composições Analíticas com Preço Unitário									
Momento de Transporte	SICRO3	6418078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0200000	tkm	5914359	5914374	5914389	0,000
						R\$ 1,20	R\$ 0,96	R\$ 0,79	0,000
<b>Custo total dos Momentos de Transportes =&gt;</b>									
						MO sem LS => 2,05	LS => 0,00	MO com LS => 2,05	0,0000
						<b>Valor do BDI =&gt;</b>			247,42
<b>5</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,79	0,79		
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>			
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 293,5497 Improdutiva 80,4168	293,5497			
						<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>			293,5497
						<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>			293,5497
						<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>			0,0000
						<b>Custo do FIC =&gt;</b>			0,0000
						<b>Produção de Equipe =&gt;</b>			373,5000
						<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>			0,7889
						MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	0,00
						<b>Valor do BDI =&gt;</b>			0,98
<b>10</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	5213440 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	1,0000000	223,54	223,54		
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>			
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	Operativa 0,30 Improdutiva 0,70	Operativa 147,8288 Improdutiva 52,7129	147,8288			
						<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>			81,2471
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>				
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000	25,8393	25,8393				
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	16,9345	33,8690				
						<b>Custo Horário de Mão de Obra =&gt;</b>			59,7083
						<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>			0,0000
						<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>			140,9554
						<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>			0,0000
						<b>Custo do FIC =&gt;</b>			0,0000
						<b>Produção de Equipe =&gt;</b>			3,0000
						<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>			46,9851
<b>D</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Atividades Auxiliares</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>			
Atividade Auxiliar	SICRO3 5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	0,3600000	m²	490,4200	176,5512			
						<b>Custo Total das Atividades =&gt;</b>			176,5512
						MO sem LS => 31,81	LS => 0,00	MO com LS => 31,81	0,0000
						<b>Valor do BDI =&gt;</b>			272,71
<b>11</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	5213403 SICRO3	Pintura de faixas com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm		m²	1,0000000	18,92	18,92		
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>			
Insumo	E9644 SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 380,5135 Improdutiva 147,8464	380,5135			
						<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>			380,5136
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>				
Insumo	P9853 SICRO3	Pré-marcador	1,0000000	17,3700	17,3700				
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000	16,9345	67,7380				
						<b>Custo Horário de Mão de Obra =&gt;</b>			85,1080
						<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>			0,0000
						<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>			465,6215
						<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>			0,0000
						<b>Custo do FIC =&gt;</b>			0,0000
						<b>Produção de Equipe =&gt;</b>			163,2300
						<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>			2,8525
<b>C</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>			
Insumo	SICRO3 M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,1000000	kg	9,9170	9,917			
Insumo	SICRO3 M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg	10,8864	3,8102			
Insumo	SICRO3 M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária	0,5000000	l	22,4088	11,2044			
Insumo	SICRO3 M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcção viária	0,0009700	l	22,4088	0,0217			
						<b>Custo Total do Material =&gt;</b>			16,0280
<b>E</b>	<b>Banco Insumo</b>	<b>Tempos Fixos</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>		
Tempo Fixo	SICRO3 M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001000	t	32,0500	0,0032		
Tempo Fixo	SICRO3 M2038	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	32,0500	0,0112		
Tempo Fixo	SICRO3 M2039	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0008000	t	32,0500	0,0256		
						<b>Custo Total dos Tempos Fixos =&gt;</b>			0,0400
<b>F</b>	<b>Banco Insumo</b>	<b>Momento de Transporte</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Distância Média de Transporte (DMT)</b>	<b>Custo Horário</b>			
					LN RP P				

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129255



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CBUQ TERESINA\_SETUR

Bancos  
SINAPI - 10/2022 - Piauí  
SICRO3 - 10/2022 - Piauí

B.D.I.  
22,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%



Composições Analíticas com Preço Unitário

Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,14	5914464 0,000 R\$ 0,91	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,14	5914464 0,000 R\$ 0,91	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,14	5914464 0,000 R\$ 0,91	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000	
<b>Custo total dos Momentos de Transportes =&gt;</b>									<b>0,0000</b>	
				MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,53	
				Valor do BDI =>	4,16				Valor com BDI =>	23,08

12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5216111 SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	1,0000000	123,67	123,67		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	147,8288	52,7129	81,2471	
<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>									<b>81,2471</b>
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9806 SICRO3	Carpinteiro	1,0000000			21,1162	21,1162		
Insumo	P9822 SICRO3	Pintor	0,5000000			25,0373	12,5187		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			16,9345	16,9345		
<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>									<b>60,5684</b>
<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>									<b>0,0000</b>
<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>									<b>131,8165</b>
<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>									<b>0,0000</b>
<b>Custo do FIC =&gt;</b>									<b>0,0000</b>
<b>Produção de Equipe =&gt;</b>									<b>4,0000</b>
<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>									<b>32,9841</b>

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos,	0,6882200	kg	24,7036	17,1991	
Insumo	SICRO3 M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	3,0000000	m	21,1028	63,3078	
Insumo	SICRO3 M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	0,2563500	l	21,4639	5,5023	
<b>Custo Total do Material =&gt;</b>							<b>86,0092</b>

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,0037500	m³	369,6700	1,3863	
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escaevação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0565500	m³	34,4500	1,9481	
Atividade Auxiliar	SICRO3 4815671	Reatero e compactação com soquete vibratório	0,0528000	m³	13,7100	0,7239	
<b>Custo Total das Atividades =&gt;</b>							<b>4,0583</b>

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3 M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t	32,0500	0,0224	
Tempo Fixo	SICRO3 M1662	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0192000	t	32,0500	0,6154	
Tempo Fixo	SICRO3 M2128	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	32,0500	0,0112	
<b>Custo Total dos Tempos Fixos =&gt;</b>								<b>0,6490</b>

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário		
					LN	RP	P			
Momento de Transporte	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0007000	tkm	5914448 0,000 R\$ 1,14	5914464 0,000 R\$ 0,91	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000		
Momento de Transporte	SICRO3 M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0192000	tkm	5914448 0,000 R\$ 1,14	5914464 0,000 R\$ 0,91	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000		
Momento de Transporte	SICRO3 M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914448 0,000 R\$ 1,14	5914464 0,000 R\$ 0,91	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000		
<b>Custo total dos Momentos de Transportes =&gt;</b>									<b>0,0000</b>	
				MO sem LS =>	15,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,46	
				Valor do BDI =>	27,20				Valor com BDI =>	150,87

13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	41,79	41,79			
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	20,08	7,91			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	15,81	6,22			
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	985,77	1,37			
Insumo	00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0070000	90,00	0,63			
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0080000	25,54	25,86			
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,87	
				Valor do BDI =>	9,19				Valor com BDI =>	50,88

Composições Auxiliares

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil - CREA: 1916129135



Composições Analíticas com Preço Unitário  
 CBUQ TERESINA\_SETUR

Bancos  
 SINAPI - 10/2022 - Piauí  
 SICRO3 - 10/2022 - Piauí

B.D.I.  
 22,0%

Encargos Sociais  
 Desonerado: 0,00%



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,73	1,73
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	Operativa 0,86 Improdutiva 0,14	Operativa 293,5497 Improdutiva 80,4168	791,1333	
						<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>	<b>791,1333</b>
						<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>791,1333</b>
						<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
						<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
						<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>457,1600</b>
						<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>1,7305</b>
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				<b>Valor do BDI =&gt;</b>	<b>0,36</b>	<b>Valor com BDI =&gt;</b>	<b>2,11</b>
Composição	5914333 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t m		t	1,0000000	33,24	33,24
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	Operativa 0,53 Improdutiva 0,47	Operativa 277,8275 Improdutiva 72,4669	362,6180	
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t m - 136 kW	1,0000000	1,00	313,8867	108,2152	313,8867
						<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>	<b>678,8027</b>
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	2,0000000			16,9345	33,8690
						<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>	<b>33,8690</b>
						<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
						<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>710,3717</b>
						<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
						<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
						<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>21,3700</b>
						<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>33,2415</b>
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	0,00 MO com LS =>
				<b>Valor do BDI =&gt;</b>	<b>7,31</b>	<b>Valor com BDI =&gt;</b>	<b>40,55</b>
Composição	5914649 SICRO3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora		t	1,0000000	7,62	7,62
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	Operativa 0,81 Improdutiva 0,19	Operativa 293,5497 Improdutiva 80,4168	759,1633	
						<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>	<b>759,1633</b>
						<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>759,1633</b>
						<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
						<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
						<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>99,6000</b>
						<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>7,6221</b>
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				<b>Valor do BDI =&gt;</b>	<b>1,67</b>	<b>Valor com BDI =&gt;</b>	<b>9,29</b>
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	1,0000000	685,77	685,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,5700000	15,81	135,49
Insumo	0000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		m³	1,0700000	90,00	96,30
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	482,9600000	0,94	453,96
				MO sem LS =>	57,84	LS =>	0,00 MO com LS =>
				<b>Valor do BDI =&gt;</b>	<b>150,86</b>	<b>Valor com BDI =&gt;</b>	<b>836,63</b>
Composição	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014		CHI	1,0000000	71,73	71,73
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	19,50	19,50
Composição Auxiliar	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_12/2014		H	1,0000000	40,07	40,07
Composição Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JURÓS. AF_12/2014		H	1,0000000	6,78	6,78
Composição Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014		H	1,0000000	5,38	5,38
				MO sem LS =>	14,88	LS =>	0,00 MO com LS =>
				<b>Valor do BDI =&gt;</b>	<b>15,78</b>	<b>Valor com BDI =&gt;</b>	<b>87,51</b>
Composição	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014		CHP	1,0000000	332,03	332,03
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	19,50	19,50

Yanna Carolina Rodrigues de Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129255



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CBUG TERESINA\_SETUR

Bancos  
SINAPI - 10/2022 - Piauí  
SICRO3 - 10/2022 - Piauí

B.D.I.  
22,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%



Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor		Total
Auxiliar	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,07	40,07		40,07
Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,78	6,78		6,78
Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,38	5,38		5,38
Auxiliar	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,39	66,39		66,39
Auxiliar	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	193,91	193,91		193,91
				MO sem LS =>	14,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,88
				Valor do BDI =>	73,04		Valor com BDI =>	405,07	
Composição	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,07	40,07		40,07
Insumo	00037743 SINAPI	SEMRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000803	312.237,76	18,82		18,82
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "38000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000342	621.411,00	21,25		21,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,81		Valor com BDI =>	48,88	
Composição	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,38	5,38		5,38
Insumo	00037743 SINAPI	SEMRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000059	312.237,76	1,84		1,84
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "38000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000057	621.411,00	3,54		3,54
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,18		Valor com BDI =>	6,56	
Composição	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,78	6,78		6,78
Insumo	00037743 SINAPI	SEMRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000074	312.237,76	2,31		2,31
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "38000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000072	621.411,00	4,47		4,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,49		Valor com BDI =>	8,27	
Composição	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,39	66,39		66,39
Insumo	00037743 SINAPI	SEMRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000849	312.237,76	26,50		26,50
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "38000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000842	621.411,00	39,89		39,89
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,60		Valor com BDI =>	80,99	
Composição	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	193,91	193,91		193,91
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	29,4700000	6,58	193,91		193,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	42,66		Valor com BDI =>	236,57	
Composição	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06		0,06
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,0041000	14,82	0,06		0,06
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,07	
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24		0,24
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	14,16	0,24		0,24
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,29	
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17		0,17
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	10,08	0,17		0,17

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil - CREA: 1916129/SS



Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>		0,17		LS =>		0,00		MO com LS =>		0,17					
		Valor do BDI =>		0,03		Valor do BDI =>		0,20									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total	Total	Total				
	5914363 SICRO3	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³		t	1,0000000	18,59				18,59							
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>											
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 285 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 482,7981 Improdutiva 0,00	102,9318	482,7981										
							Custo Horário de Equipamentos =>	482,7981									
							Custo Horário de Execução =>	482,7981									
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000									
							Custo do FIC =>	0,0000									
							Produção de Equipe =>	26,8700									
							Custo Unitário de Execução =>	18,8806									
							MO sem LS =>	0,00		LS =>		0,00		MO com LS =>		0,00	
							Valor do BDI =>	4,08		Valor do BDI =>		22,87					
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	32,05				32,05							
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>											
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 277,8275 Improdutiva 0,00	72,4669	277,8275										
							Custo Horário de Equipamentos =>	277,8275									
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>												
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	8,0000000	16,9345	101,8070												
							Custo Horário da Mão de Obra =>	101,8070									
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000									
							Custo Horário de Execução =>	378,4345									
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000									
							Custo do FIC =>	0,0000									
							Produção de Equipe =>	11,8400									
							Custo Unitário de Execução =>	32,0488									
							MO sem LS =>	8,58		LS =>		0,00		MO com LS =>		8,58	
							Valor do BDI =>	7,05		Valor do BDI =>		39,10					
Composição	1106185 SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais		m³	1,0000000	369,67				369,67							
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>												
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	16,9345	33,8690												
							Custo Horário da Mão de Obra =>	33,8690									
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000									
							Custo Horário de Execução =>	33,8690									
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000									
							Custo do FIC =>	0,0000									
							Produção de Equipe =>	3,9290									
							Custo Unitário de Execução =>	8,8203									
<b>C</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>											
Insumo	SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rachão	0,5280000	m³	123,1074	64,7545											
							Custo Total do Material =>	64,7545									
<b>D</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Atividades Auxiliares</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>											
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	421,3300	294,9310											
							Custo Total das Atividades =>	294,9310									
<b>E</b>	<b>Banco Insumo</b>	<b>Tempos Fixos</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>										
Tempo Fixo	SICRO3 M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914847	0,7890000	t	1,7300	1,3850										
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	1,3850									
<b>F</b>	<b>Banco Insumo</b>	<b>Momento de Transporte</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Distância Média de Transporte (DMT)</b>	<b>Custo Horário</b>											
Momento de Transporte	SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,7880000	tkm	LN 5914359 RP 0,000 P 5914374	0,0000	0,0000	5914389	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
							RS 1,20	RS 0,96	RS 0,79								
							Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000									
							MO sem LS =>	41,23		LS =>		0,00		MO com LS =>		41,23	
							Valor do BDI =>	81,32		Valor do BDI =>		450,69					
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	421,33				421,33							
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>											
Insumo	E9010 SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 1,5091 Improdutiva 0,00	1,0138	1,5091										
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	43,3887	26,9249										
Insumo	E9521 SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	3,2854	0,2294										
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,8096	0,5504										
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual garça com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,7169	1,1672										
							Custo Horário de Equipamentos =>	56,4988									
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>												
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000	21,0538	21,0538												

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil CREA: 191617-7

Composições Analíticas com Preço Unitário  
CBLQ TERESINA\_SETUR



Bancos  
SINAPI - 10/2022 - Piauí  
SICRO3 - 10/2022 - Piauí

B.D.I.  
22,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%



Composições Analíticas com Preço Unitário										
Insumo	P9824	SICRO3	Servente		9,0000000				16,9345	152,4105
Custo Horário da Mão de Obra =>										173,4841
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>										0,0000
Custo Horário de Execução =>										228,9697
Fator de Influência da Chuva - FIC =>										0,0000
Custo do FIC =>										0,0000
Produção de Equipe =>										3,9290
Custo Unitário de Execução =>										58,2744
Custo Total do Material =>										350,4387
<b>C</b>	<b>Banco</b>	<b>Código</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>			
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8484800	kg	5,0512	5,1221			
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,8333400	m³	119,4968	75,8211			
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3875400	m³	147,4407	54,1904			
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,3875400	m³	131,7851	48,4363			
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,5919	167,0058			
Custo Total dos Tempos Fixos =>										12,8212
<b>E</b>	<b>Banco</b>	<b>Insumo</b>	<b>Tempos Fixos</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>		
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	32,0500	0,0272		
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914847	0,9500100	t	1,7300	1,6435		
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914847	0,5513100	t	1,7300	0,9538		
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914847	0,5513100	t	1,7300	0,9538		
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	32,0500	9,0429		
Custo Total dos Momentos de Transportes =>										0,0000
<b>F</b>	<b>Banco</b>	<b>Insumo</b>	<b>Momento de Transporte</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Distância Média de Transporte (DMT)</b>	<b>Custo Horário</b>			
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	LN: 5914449, 0,000; RP: 5914464, 0,000; P: 5914479, 0,000	0,0000			
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	LN: 5914359, 0,000; RP: 5914374, 0,000; P: 5914389, 0,000	0,0000			
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	LN: 5914359, 0,000; RP: 5914374, 0,000; P: 5914389, 0,000	0,0000			
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	LN: 5914359, 0,000; RP: 5914374, 0,000; P: 5914389, 0,000	0,0000			
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	LN: 5914449, 0,000; RP: 5914464, 0,000; P: 5914479, 0,000	0,0000			
Custo total dos Momentos de Transportes =>										0,0000
MO sem LS =>										46,58
LS =>										0,00
MO com LS =>										46,58
Valor do BDI =>										92,69
Valor com BDI =>										514,02
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	4805750 SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,45	34,45			
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>					
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,9345	16,9345				
Custo Horário da Mão de Obra =>										16,9345
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>										0,0000
Custo Horário de Execução =>										16,9345
Fator de Influência da Chuva - FIC =>										0,0173
Custo do FIC =>										0,5883
Produção de Equipe =>										0,5000
Custo Unitário de Execução =>										33,8890
MO sem LS =>										33,87
LS =>										0,00
MO com LS =>										33,87
Valor do BDI =>										7,57
Valor com BDI =>										42,02
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,50	19,50			
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06			
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	14,82	14,82			
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,29	2,29			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,89	0,89			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06			
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76			
MO sem LS =>										14,88
LS =>										0,00
MO com LS =>										14,88
Valor do BDI =>										4,29
Valor com BDI =>										23,79
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,08	20,08			

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil - CREA: 19161797



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CBOU TERESINA\_SETUR

Bancos  
SINAPI - 10/2022 - Piauí  
SICRO3 - 10/2022 - Piauí

B.D.I.  
22,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%



Composições Analíticas com Preço Unitário										
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24			
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16			
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,29	2,29			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,89	0,89			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06			
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74			
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09			
				MO sem LS =>	14,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,40	
				Valor do BDI =>	4,41	Valor com BDI =>		24,49		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	5212552 SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		m²	1,0000000	15,73	15,73			
<b>A Equipamentos</b>										
Insumo	E9076 SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kcal			1,0000000			Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA			1,0000000			Operativa	Improdutiva	
							Custo Operacional	Custo Operacional	Custo Horário	
							41,3408	37,4138	41,3408	
							18,8522	3,8690	18,8522	
							Custo Horário de Equipamentos =>			60,1930
<b>B Mão de Obra</b>										
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante			1,0000000			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9822 SICRO3	Pintor			2,0000000			25,0373	50,0746	
							Custo Horário da Mão de Obra =>			67,8600
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>			0,0000
							Custo Horário de Execução =>			127,8730
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
							Custo do FIC =>			0,0000
							Produção de Equipe =>			19,1600
							Custo Unitário de Execução =>			6,6774
<b>C Material</b>										
Insumo	SICRO3 M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster			0,1120000			Preço Unitário	Custo Horário	
							80,8049	9,0501		
							Custo Total do Material =>			9,0501
<b>E Tempos Fixos</b>										
Tempo Fixo	SICRO3 M3153	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			5914855			Preço Unitário	Custo Horário	
							0,0001100	t	32,0500	0,0035
							Custo Total dos Tempos Fixos =>			0,0035
<b>F Momento de Transporte</b>										
Momento de Transporte	SICRO3 M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW			0,0001100			Preço Unitário	Custo Horário	
							5914449	5914464	5914479	0,0000
							0,000	0,000	0,000	0,0000
							R\$ 1,14	R\$ 0,91	R\$ 0,75	
							Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000
				MO sem LS =>	3,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,54	
				Valor do BDI =>	3,46	Valor com BDI =>		19,19		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	5213414 SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção		m²	1,0000000	490,42	490,42			
<b>A Equipamentos</b>										
Insumo	E9568 SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW			0,1506000			Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA			0,4819300			Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9623 SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW			0,2008000			Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9622 SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW			0,4819300			Operativa	Improdutiva	
							Custo Operacional	Custo Operacional	Custo Horário	
							0,2056	0,1364	0,0310	
							18,8522	3,8690	9,0854	
							16,0973	9,5967	3,0315	
							8,8897	5,8508	4,2842	
							Custo Horário de Equipamentos =>			16,4321
<b>B Mão de Obra</b>										
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante			2,0000000			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9830 SICRO3	Montador			1,0000000			25,8393	25,8393	
Insumo	P9823 SICRO3	Serralheiro			1,0000000			23,2010	23,2010	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente			2,0000000			18,9345	33,8690	
							Custo Horário da Mão de Obra =>			118,1201
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>			0,0000
							Custo Horário de Execução =>			134,8822
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
							Custo do FIC =>			0,0000
							Produção de Equipe =>			4,0000
							Custo Unitário de Execução =>			33,8381
<b>C Material</b>										
Insumo	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado			11,7750000			Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V)			1,0000000			268,1335	268,1335	
							Custo Total do Material =>			440,6502
<b>D Atividades Auxiliares</b>										
Atividade Auxiliar	SICRO3 5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço			1,0000000			Preço Unitário	Custo Horário	
							15,7300	15,7300		
							Custo Total das Atividades =>			16,7300
<b>E Tempos Fixos</b>										
								Preço Unitário	Custo Horário	

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil - CREA: 1916179



Composições Analíticas com Preço Unitário								
Tempo Fixo	SICRO3 M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 tm	5914333	0,0117800	t		33,2400	0,3916
Tempo Fixo	SICRO3 M3229	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004400	t		32,0500	0,0141
							<b>Custo Total dos Tempos Fixos =&gt;</b>	<b>0,4057</b>

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0117800	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,14	5914484 0,000 R\$ 0,91	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004400	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,14	5914484 0,000 R\$ 0,91	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000

							<b>Custo total dos Momentos de Transportes =&gt;</b>	<b>0,0000</b>		
				MO sem LS =>	33,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,09	
				Valor do BDI =>	107,89				Valor com BDI =>	596,31

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	4815671 SICRO3	Resteio e compactação com soquete vibratório		m²	1,0000000	13,71	13,71

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9647 SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	8,8165	1,1566	8,8165
							<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>	<b>8,8165</b>

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva			
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000		16,9345	33,8690		
							<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>	<b>33,8690</b>

							<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>	<b>0,0000</b>		
							<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>42,6885</b>		
							<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>		
							<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>		
							<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>3,1126</b>		
							<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>13,7142</b>		
				MO sem LS =>	10,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,88	
				Valor do BDI =>	3,01				Valor com BDI =>	16,72

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,81	15,81			
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17			
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,08	10,08			
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,29	2,29			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,89	0,89			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06			
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56			
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15			
				MO sem LS =>	10,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,25	
				Valor do BDI =>	3,47				Valor com BDI =>	19,28

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914356 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,20	1,20

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,5497	80,4168	293,5497		
							<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>	<b>293,5497</b>		
							<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>293,5497</b>		
							<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0173</b>		
							<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0204</b>		
							<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>249,0000</b>		
							<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>1,1789</b>		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	0,26				Valor com BDI =>	1,46

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,96	0,96

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,5497	80,4168	293,5497		
							<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>	<b>293,5497</b>		
							<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>293,5497</b>		
							<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0173</b>		
							<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0163</b>		
							<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>311,2600</b>		
							<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>0,9431</b>		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	0,21				Valor com BDI =>	1,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,14	1,14

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,5497	80,4168	293,5497

Yanna Carolina Rodrigues de Silva  
Engª Civil / CREM: 1916129767






Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	277,8275	72,4669	277,8275
								Custo Horário de Equipamentos => 277,8275
								Custo Horário de Execução => 277,8275
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0173
								Custo do FIC => 0,0183
								Produção de Equipe => 248,6600
								Custo Unitário de Execução => 1,1176
					MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	0,00
					Valor do BDI => 0,25		Valor com BDI => 1,36	1,36
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,91	0,91	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 277,8275	Improdutiva 72,4669	277,8275	
								Custo Horário de Equipamentos => 277,8275
								Custo Horário de Execução => 277,8275
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0173
								Custo do FIC => 0,0185
								Produção de Equipe => 310,7300
								Custo Unitário de Execução => 0,8941
					MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	0,00
					Valor do BDI => 0,20		Valor com BDI => 1,11	1,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,75	0,75	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 277,8275	Improdutiva 72,4669	277,8275	
								Custo Horário de Equipamentos => 277,8275
								Custo Horário de Execução => 277,8275
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
								Custo do FIC => 0,0000
								Produção de Equipe => 372,8800
								Custo Unitário de Execução => 0,7481
					MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	0,00
					Valor do BDI => 0,16		Valor com BDI => 0,91	0,91
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914364 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,95	0,95	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 482,7961	Improdutiva 102,9318	482,7961	
								Custo Horário de Equipamentos => 482,7961
								Custo Horário de Execução => 482,7961
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0173
								Custo do FIC => 0,0181
								Produção de Equipe => 519,4100
								Custo Unitário de Execução => 0,8286
					MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	0,00
					Valor do BDI => 0,20		Valor com BDI => 1,15	1,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914365 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,76	0,76	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 482,7961	Improdutiva 102,9318	482,7961	
								Custo Horário de Equipamentos => 482,7961
								Custo Horário de Execução => 482,7961
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0173
								Custo do FIC => 0,0128
								Produção de Equipe => 649,2700
								Custo Unitário de Execução => 0,7438
					MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	0,00
					Valor do BDI => 0,16		Valor com BDI => 0,92	0,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914366 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,82	0,82	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 482,7961	Improdutiva 102,9318	482,7961	
								Custo Horário de Equipamentos => 482,7961
								Custo Horário de Execução => 482,7961
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
								Custo do FIC => 0,0000
								Produção de Equipe => 778,1200
								Custo Unitário de Execução => 0,6197
					MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	0,00
					Valor do BDI => 0,13		Valor com BDI => 0,75	0,75
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	6416078 SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	1,0000000	182,13	182,13		
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>	
				<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	
Insumo	E9559 SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	72,2775	40,4991	
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,80	0,20	200,1831	94,9844	
Insumo	E9021 SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	465,3101	23,5172	
Insumo	E9556 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	55,6064	37,9832	
Insumo	E9689 SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.100,4896	584,5602	
						<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>	<b>1.928,4334</b>	
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000			16,9345	67,7380	
						<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>	<b>67,7380</b>	
						<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>	<b>0,0000</b>	
						<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>1.996,1714</b>	
						<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>	
						<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>	
						<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>99,6000</b>	
						<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>20,0419</b>	
<b>C</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>		<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>	
Insumo	SICRO3 M0028	Areia média	0,3247500	m³		129,5501	42,0714	
Insumo	SICRO3 M0005	Brita 0	0,0624500	m³		152,4524	9,5207	
Insumo	SICRO3 M0191	Brita 1	0,0624500	m³		147,4407	9,2077	
Insumo	SICRO3 M0344	Cal hidratada - a granel	56,2000000	kg		0,4858	27,3020	
Insumo	SICRO3 M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0632300	t		0,0000	0,0000	
Insumo	SICRO3 M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l		6,3321	50,6568	
Insumo	SICRO3 M1103	Pedrisco	0,1373900	m³		151,1274	20,7634	
						<b>Custo Total do Material =&gt;</b>	<b>166,6220</b>	
<b>E</b>	<b>Banco Insumo</b>	<b>Tempos Fixos</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>	
Tempo Fixo	SICRO3 M0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,4871300	t	1,7300	0,8427	
Tempo Fixo	SICRO3 M0005	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,0936800	t	1,7300	0,1621	
Tempo Fixo	SICRO3 M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,0936800	t	1,7300	0,1621	
Tempo Fixo	SICRO3 M0344	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	5914383	0,0562000	t	16,5900	1,0448	
Tempo Fixo	SICRO3 M1103	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,2060900	t	1,7300	0,3565	
						<b>Custo Total dos Tempos Fixos =&gt;</b>	<b>2,5882</b>	
<b>F</b>	<b>Banco Insumo</b>	<b>Momento de Transporte</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Distância Média de Transporte (DMT)</b>		<b>Custo Horário</b>	
					<b>LN</b>	<b>RP</b>	<b>P</b>	
Momento de Transporte	SICRO3 M0028	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 186 kW	0,4871300	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,20	5914374 0,000 R\$ 0,96	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0005	Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 186 kW	0,0936800	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,20	5914374 0,000 R\$ 0,96	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 186 kW	0,0936800	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,20	5914374 0,000 R\$ 0,96	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	0,0562000	tkm	5914364 0,000 R\$ 0,95	5914365 0,000 R\$ 0,79	5914386 0,000 R\$ 0,82	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M1103	Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 186 kW	0,2060900	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,20	5914374 0,000 R\$ 0,96	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000
							<b>Custo total dos Momentos de Transportes =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
					<b>MO sem LS =&gt;</b>	<b>LS =&gt;</b>	<b>MO com LS =&gt;</b>	<b>0,68</b>
					<b>Valor do BDI =&gt;</b>		<b>Valor com BDI =&gt;</b>	<b>222,19</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil - CREA: 191612921-0

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 2.983,70 m



CGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

DNIT

Plauí - Outubro/2022  
Com desoneração

Código	Descrição	Unidade	Salário (R\$)	Encargos Totais	Custo (R\$)	Periculosidade/ Insalubridade
P9801	Ajudante	h	6,2398	182,1473%	17,6054	0,0000%
P9802	Ajudante especializado	h	7,4876	177,2616%	20,7602	0,0000%
P9803	Almoxarife	mês	2.499,2000	96,7273%	4.916,6086	0,0000%
P9804	Apontador	mês	1.792,5882	115,9693%	3.871,4401	0,0000%
P9805	Armador	h	10,2500	143,0945%	24,9171	0,0000%
P9806	Auxiliar administrativo	mês	1.790,8000	114,6200%	3.843,4149	0,0000%
P9807	Bombeiro hidráulico	h	10,2737	151,5004%	25,8383	0,0000%
P9808	Carpinteiro	h	8,1400	159,4136%	21,1162	0,0000%
P9809	Encarregado administrativo	mês	3.654,5529	79,3912%	6.555,9463	0,0000%
P9810	Eletricista	h	8,7550	160,4560%	22,8029	0,0000%
P9811	Encarregado especializado	mês	3.623,6908	83,2557%	6.640,6199	0,0000%
P9812	Engenheiro	mês	12.265,1972	58,6131%	19.454,2095	0,0000%
P9814	Operacional	mês	1.380,3877	128,1245%	3.149,0025	0,0000%
P9815	Jardineiro	h	7,7500	162,6918%	20,3586	0,0000%
P9819	Engenheiro supervisor	mês	12.265,1972	58,6131%	19.454,2095	0,0000%
P9821	Pedreiro	h	8,1400	158,6438%	21,0536	0,0000%
P9822	Pintor	h	10,2500	144,2664%	25,0373	0,0000%
P9823	Serralheiro	h	9,3101	149,2032%	23,2010	0,0000%
P9824	Servente	h	5,8800	188,0028%	16,9345	0,0000%
P9825	Soldador	h	12,3692	133,0299%	28,8239	0,0000%
P9826	Chefe setor de finanças	mês	8.522,8586	62,1090%	13.816,3208	0,0000%
P9827	Vigia	mês	1.412,4000	147,4667%	3.918,9396	30,0000%
P9830	Montador	h	10,2500	152,0911%	25,8393	0,0000%
P9833	Auxiliar de laboratório	mês	2.255,0000	101,5341%	4.544,5939	0,0000%
P9835	Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade	h	6,2419	232,7197%	22,9714	35,3000%
P9836	Geólogo	h	54,7572	90,6972%	104,4204	0,0000%
P9837	Oceanógrafo	mês	4.260,0236	76,2089%	7.506,5407	0,0000%
P9840	Encarregado geral	mês	5.733,3173	68,3925%	9.654,4763	0,0000%
P9842	Faxineiro	mês	1.377,2000	134,4854%	3.229,3329	0,0000%
P9843	Operador de equipamento leve	h	8,1400	156,7141%	20,8965	0,0000%
P9844	Capitão fluvial	mês	5.510,3395	69,9152%	9.362,9043	0,0000%
P9845	Operador de equipamento pesado	h	10,8718	137,7738%	25,8502	0,0000%
P9846	Operador de equipamento especial	h	15,0265	120,8339%	33,1836	0,0000%
P9847	Perfurador de tubulão	h	6,2419	181,3489%	17,5615	0,0000%
P9848	Desenhista	mês	2.689,3012	89,8199%	5.104,8288	0,0000%
P9849	Condutor maquinista fluvial	mês	2.002,3600	103,4747%	4.074,2960	0,0000%
P9850	Copeiro	mês	1.500,4496	123,9463%	3.360,2013	0,0000%
P9851	Médico do trabalho	mês	9.971,0632	60,1823%	15.971,8783	0,0000%
P9852	Blaster	h	9,4200	174,5081%	28,6646	30,0000%
P9853	Pré-marcador	h	6,2397	178,3788%	17,3700	0,0000%
P9854	Recepcionista	mês	1.632,3275	114,6522%	3.503,8268	0,0000%
P9855	Marinheiro de máquinas	mês	1.924,0816	105,2654%	3.949,4737	0,0000%
P9856	Marinheiro de convés	h	8,5644	146,2929%	21,0935	0,0000%
P9857	Marinheiro de convés - mensalista	mês	1.884,1601	106,3098%	3.887,2069	0,0000%
P9858	Laboratorista	mês	3.093,2000	88,5233%	5.831,4027	0,0000%
P9859	Trabalhador de via	h	5,6274	194,3842%	16,5661	0,0000%
P9861	Selecionador de material pétreo	h	6,2397	179,7881%	17,4566	0,0000%
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	10.692,8384	60,9006%	17.204,8411	0,0000%
P9865	Técnico em enfermagem	mês	2.733,4466	94,6849%	5.321,6077	0,0000%
P9866	Motorista de caminhão	h	8,9374	147,4780%	22,1180	0,0000%
P9867	Técnico especializado - mensalista	mês	3.072,2303	88,6981%	5.797,2402	0,0000%
P9869	Encarregado de obras de artes especiais	mês	3.623,6908	83,2557%	6.640,6199	0,0000%
P9870	Motorista de veículo leve	h	10,2500	138,3921%	24,4351	0,0000%
P9871	Motorista de veículo especial	h	10,5824	137,2048%	25,1019	0,0000%
P9875	Encarregado de turma	mês	2.261,0315	101,8033%	4.562,8361	0,0000%
P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	3.093,2000	88,4154%	5.828,0651	0,0000%
P9878	Secretária	mês	2.523,7554	92,5927%	4.860,5686	0,0000%
P9880	Piloto fluvial	mês	3.055,9900	84,8093%	5.647,7537	0,0000%
P9882	Técnico especializado	h	13,9647	124,7769%	31,3894	0,0000%
P9883	Chefe do setor administrativo	mês	3.655,7355	79,3823%	6.557,7424	0,0000%
P9884	Encarregado de terraplenagem	mês	3.623,6908	83,2557%	6.640,6199	0,0000%
P9885	Frentista de túnel	h	6,2397	188,4177%	17,9963	0,0000%
P9889	Técnico da qualidade	mês	3.329,1079	86,5800%	6.211,4495	0,0000%
P9891	Engenheiro mecânico	mês	12.316,2919	59,1423%	19.600,4302	0,0000%
P9892	Auxiliar de blaster	h	7,8908	187,8494%	25,0808	30,0000%
P9893	Encarregado de pavimentação	mês	3.623,6908	83,2557%	6.640,6199	0,0000%
P9896	Porteiro	mês	1.426,7126	130,2118%	3.284,4607	0,0000%
P9897	Técnico de meio ambiente	mês	3.288,4467	86,5230%	6.133,7094	0,0000%
P9900	Comprador	mês	3.090,5635	87,7639%	5.802,9625	0,0000%
P9901	Encarregado de superestrutura ferroviária	mês	3.623,6908	83,2557%	6.640,6199	0,0000%

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / UEPB 1916129234

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 2.983,70 m



CGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

DNIT

Plauí - Outubro/2022  
Com desoneração

Código	Descrição	Unidade	Salário (R\$)	Encargos Totais	Custo (R\$)	Periculosidade/ Insalubridade
P9903	Auxiliar técnico	mês	1.688,4663	116,9229%	3.662,6700	0,0000%
P9907	Comandante de longo curso	mês	13.103,1175	59,1889%	20.856,0879	0,0000%
P9908	Imediato	mês	8.649,6299	83,1845%	14.114,6921	0,0000%
P9909	Oficial de náutica	mês	2.242,8606	98,3633%	4.449,0123	0,0000%
P9910	Oficial de máquinas	mês	2.850,3039	88,0070%	5.358,7708	0,0000%
P9911	Condutor de máquinas	mês	2.002,3600	103,4747%	4.074,2960	0,0000%
P9912	Capitão fluvial com periculosidade	h	25,0470	126,9682%	64,3628	30,0000%
P9913	Draguista	mês	3.695,3388	79,7929%	6.464,1638	0,0000%
P9915	Maquinista	h	11,4458	137,4967%	27,1833	0,0000%
P9916	Encarregado de conservação rodoviária	mês	3.623,6908	83,2557%	6.640,6199	0,0000%
P9920	Mestre fluvial	mês	5.510,3395	69,9152%	9.362,9043	0,0000%
P9921	Mergulhador raso autônomo de emergência	h	8,7236	216,6131%	29,8236	25,2800%
P9922	Mergulhador raso dependente de emergência	h	8,8446	223,7887%	31,2911	30,0000%
P9924	Mergulhador raso dependente	h	8,8446	375,1434%	44,6779	30,0000%
P9925	Mergulhador raso autônomo	h	8,7236	335,4368%	40,1893	25,2800%
P9926	Mergulhador raso auxiliar de superfície	h	8,7236	190,5244%	27,5477	25,2800%
P9927	Frentista de túnel com periculosidade	h	6,2397	212,9275%	21,3976	30,0000%
P9928	Servente com periculosidade	h	5,8800	212,5128%	20,1397	30,0000%
P9929	Bombeiro hidráulico com periculosidade	h	10,2737	175,8843%	31,4256	30,0000%
P9930	Eletricista com periculosidade	h	8,7550	184,7920%	27,5600	30,0000%
P9931	Operador de equipamento de mergulho	h	14,3182	154,3525%	38,6222	15,3900%
P9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h	10,8718	162,2205%	31,7696	30,0000%
P9933	Supervisor de mergulho raso	mês	3.150,0000	110,6576%	7.120,4994	15,3900%
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	h	10,5824	161,6217%	30,8605	30,0000%
P9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h	8,1400	181,1611%	25,3285	30,0000%
P9939	Operador de equipamento leve com insalubridade	h	8,1400	200,0335%	26,6262	27,0700%
P9940	Piloto fluvial com periculosidade	h	13,8909	144,9240%	38,1894	30,0000%
P9941	Mestre fluvial com periculosidade	h	25,0470	126,9682%	64,3628	30,0000%
P9942	Maninheiro de convés com periculosidade	h	8,5644	170,5567%	25,7408	30,0000%
P9943	Técnico de batimetria com periculosidade	h	10,7009	157,4752%	30,7624	30,0000%
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	15,0265	145,2812%	41,3651	30,0000%
P9945	Draguista com periculosidade	h	16,3424	138,8764%	43,9408	30,0000%
P9946	Engenheiro auxiliar	mês	10.368,9925	59,8771%	16.574,4469	0,0000%
P9947	Técnico florestal	mês	3.288,4467	86,5230%	6.133,7094	0,0000%
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	2.255,0000	99,9494%	4.508,8589	0,0000%
P9949	Topógrafo	mês	3.825,8000	82,6466%	6.987,6936	0,0000%
P9950	Auxiliar de topografia	mês	2.255,0000	102,9776%	4.577,1448	0,0000%
P9951	Médico de câmara hiperbárica	mês	9.971,0632	77,6993%	18.203,1031	4,8600%
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	1.790,8000	117,2403%	3.890,3392	0,0000%
P9953	Eletricista - mensalista	mês	1.926,0979	118,4693%	4.207,9325	0,0000%
P9954	Servente - mensalista	mês	1.293,6000	141,7981%	3.127,9002	0,0000%
P9955	Engenheiro chefe	mês	16.382,3083	56,8783%	25.700,2867	0,0000%
P9956	Motorista de caminhão com periculosidade	h	8,9374	171,8948%	26,9815	30,0000%
P9972	Técnico de batimetria	mês	2.354,2056	95,4504%	4.601,3042	0,0000%

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 191612924-5





Piauí - Outubro/2022  
Com desoneração

P9947	Técnico florestal	h	-	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,64%	5,16%	6,48%	0,93%	0,04%	0,06%	9,25%	0,74%	0,13%	-	4,27%	0,11%	5,86%	4,53%	0,93%	7,13%	0,36%	81,82%	
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	-	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	7,80%	0,91%	0,04%	0,06%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,45%	0,09%	4,72%	3,80%	0,93%	3,15%	0,29%	51,95%	
P9949	Topógrafo	mês	-	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	6,37%	0,91%	0,04%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,34%	0,11%	5,95%	3,76%	0,93%	2,94%	0,37%	52,71%	
P9950	Auxiliar de topografia	mês	-	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	6,37%	0,91%	0,04%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,34%	0,11%	5,95%	3,76%	0,93%	2,94%	0,37%	52,71%	
P9951	Médico de câmara hiperbática	mês	-	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	-	-	-	7,90%	0,93%	0,04%	0,03%	9,24%	0,74%	0,06%	-	3,16%	0,08%	4,33%	3,81%	0,93%	5,56%	0,28%	66,40%
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	-	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	6,37%	0,97%	0,04%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,35%	0,11%	5,96%	3,76%	0,93%	2,93%	0,37%	52,65%
P9953	Eletricista - mensalista	mês	-	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	7,12%	0,97%	0,04%	0,10%	9,25%	0,74%	0,00%	-	3,80%	0,10%	5,21%	3,78%	0,93%	3,06%	0,32%	52,22%
P9954	Servente - mensalista	mês	-	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	6,34%	0,97%	0,04%	0,10%	9,25%	0,74%	0,01%	-	4,37%	0,11%	5,98%	3,76%	0,93%	2,93%	0,37%	52,70%
P9955	Engenheiro chefe	mês	-	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	-	8,45%	0,91%	0,04%	0,08%	9,24%	0,74%	0,04%	-	3,06%	0,07%	3,87%	3,82%	0,93%	3,30%	0,26%	51,72%
P9956	Motorista de caminhão com periculosidade	mês	-	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	6,88%	0,97%	0,04%	0,09%	9,24%	0,74%	-	-	3,98%	0,10%	5,45%	3,77%	0,93%	3,02%	0,33%	52,35%
P9972	Técnico de batimetria	mês	-	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	8,24%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	-	-	3,22%	0,08%	4,06%	3,81%	0,93%	3,20%	0,27%	52,00%

Legenda:

Classificação	Parcela	Descrição
	A1	Previdência Social
	A2	FGTS
	A3	Salário Educação
	A4	SESC ou SESI
	A5	SENAI / SEBRAE
	A6	INCRÁ
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
	A8	SECONCI
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
	B1	Reposuço Semanal Remunerado - Domingos
	B2	Feriados
	B3	Férias Gozadas + 1/3
	B4	Auxílio Enfermidade
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho
	B6	Licença Paternidade
	B7	13º Salário
	B8	Faltas Justificadas
	B9	Férias sobre Licença Maternidade
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	B10	Recidagem Tecnológica
	C1	Aviso Prévio Indenizado
	C2	Aviso Prévio Trabalhado
	C3	Féria Indenizadas + 1/3
	C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)	C5	Indenização Adicional
	D1	Reincidência de A sobre B
Grupo D - Reincidências (%)	D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTE

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

- Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
- Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais flutuações no número de amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

  
 Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil CREA: 1916129285



SECRETARIA  
DO **TURISMO** - SETUR



GOVERNO DO  
**PIAUI**  
AQUI TEM TRABALHO  
AQUI TEM FUTURO

ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR  
AV. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções,  
Bairro Cabral  
CEP 64002-830 - Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br



## 8.0 – Planilha Orçamentária Onerada

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Emp<sup>o</sup> Civil / O/ES: 1916129255



**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**

**LOCAL: PEDRO II - PI**

**EXTENSÃO: 4.045,00 m**



**QUADRO RESUMO SERVIÇOS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	TOTAL (RS)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,20%	103.727,27
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	87,79%	2.167.503,38
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	6,33%	156.268,08
4.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	1,67%	41.333,92
<b>TOTAL (RS)</b>			<b>2.468.832,65</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>o</sup> Civil / CREA: 19161707

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q


LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 4.045,00 m

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte: SINAPI: OUTUBRO/2022 - NOVO SICRO DNIT; OUTUBRO/2022 - ANP: OUTUBRO /2022 - SEM DESONERAÇÃO							BDI:	22,00%
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO	PREÇO	PREÇO	COMPOSIÇÃO	
				UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL		
				(R\$)	COM BDI 22,00 % (R\$)	(R\$)		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					103.727,27		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	11.747,88	14.332,41	14.332,41	C01	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	1,00	44.130,31	53.838,97	53.838,97	C02	
1.3	PLACA DA OBRA	und	1,00	447,08	545,43	545,43	C06	
1.4	CANTEIRO DE OBRA	mês	4,00	4.956,90	6.047,41	24.189,66	C07	
1.5	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO	m²	2.055,23	3,78	4,61	9.474,62	SICRO-1600412	
1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM	m³.km	513,81	2,15	2,62	1.346,18	SINAPI - 95876	
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					2.167.503,38		
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	20.552,34	0,28	0,34	6.987,79	SICRO-4011353	
2.2	CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA C - (AREIA E BRITA COMERCIAIS) CAPA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 5 cm	t	2.466,31	203,25	247,96	611.546,22	SICRO-4011463	
2.3	AQUISIÇÃO - MATERIAL BETUMINOSO							
2.3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM BDI DE 15%	t	155,94	4.823,32	5.546,81	864.969,55	ANP - C04	
2.3.2	AQUISIÇÃO DE RR-1C COM BDI DE 15%	t	9,25	3.494,50	4.018,67	37.172,69	ANP - C04	
2.4	TRANSPORTE DOS AGREGADOS PARA O CONCRETO ASFÁLTICO					0,00	0,00	
2.4.1	TRANSPORTE DE AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT= 10,00 km (TERESINA - USINA)	t.km	12.014,14	0,79	0,96	11.533,57	SICRO - 5914389	
2.4.2	TRANSPORTE DE BRITA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT= 49,2 km (LAGOA DO PIAUI - USINA)	t.km	22.734,72	0,79	0,96	21.825,33	SICRO - 5914389	
2.4.3	TRANSPORTE DE CAL DE HIDRATADA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT= 10 km (TERESINA - USINA)	t.km	1.386,07	0,79	0,96	1.330,62	SICRO - 5914389	
2.4.4	TRANSPORTE DE PEDRISCO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT= 49,2 km (LAGOA DO PIAUI - USINA)	t.km	25.007,47	0,79	0,96	24.007,17	SICRO - 5914389	
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ DE MASSA ASFÁLTICA EM RODOVIA PAVIMENTADA COM DMT = 212,10 km (USINA - OBRA)	t.km	523.104,35	0,79	0,96	502.180,17	SICRO - 5914389	
2.6	CÁLCULO DE TRANSPORTE (RR-1C) A FRIO COM DMT =490,00 km COM BDI DIFERENCIADO DE TRANSPORTE DE 15% (FORTALEZA - OBRA)	t	9,25	366,57	421,55	3.899,33	C05	
2.7	CÁLCULO DE TRANSPORTE DE CAP 50/70 A QUENTE COM DMT = 638,00 km COM BDI DIFERENCIADO DE TRANSPORTE DE 15% (FORTALEZA - USINA)	t	155,94	457,54	526,17	82.050,94	C06	
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL					156.268,08		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO M PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.734,00	43,34	52,87	91.676,58	SINAPI - 94273	
3.2	EXCUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 5CM ALTURA	m	1.734,00	30,54	37,25	64.591,50	C08-ADAPTADA	
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					41.333,92		
4.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	19,00	227,12	277,08	5.264,52	SICRO-5213440	
4.2	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	m²	730,27	19,01	23,19	16.934,96	SICRO-5213403	
4.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	36,00	369,45	450,72	16.225,92	C09 - ADAPTADA	
4.4	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	19,00	125,48	153,08	2.908,52	SICRO-5216111	
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>2.468.832,65</b>		

Importa o presente orçamento em **R\$ 2.468.832,65 (Dois Milhões e Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos).**

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng.ª Civil / CREA 129285

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



LOCALIZAÇÃO: TERESINA- VIAS PÚBLICAS

MUNICÍPIO: PEDRO II - PI

TRECHO: R. TOMÁS CAFÉ / JOAQUIM LEITE / JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02) / TEIXEIRA SANTOS / ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03) / RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA / RUA CÂNDIDO PEREIRA / R. MONSENHOR UCHOA / R. DA CEPISA

EXTENSÃO: 3.007,000 m

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (H)	QUANTIDADE (Q)	ÁREA (M²) OU VOLUME (M³) (A E V)	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
-----------------	-------------	------------	----------------	----------------------------------	---------	-------------

SERVIÇOS PRELIMINARES

RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO

COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	ÁREA	UNIDADE	ÁREA = C x L x Q x 10%
852,000	5,90	1,00	502,68	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,00	9,30	1,00	161,82	m²	JOAQUIM LEITE
146,00	Var	1,00	128,65	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,00	6,00	1,00	122,40	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,00	Var	1,00	252,16	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,000	3,55	1,00	108,63	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,000	6,40	1,00	164,48	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,000	7,80	1,00	558,48	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,000	5,95	1,00	55,93	m²	R. DA CEPISA
1,5		Total	2.055,23	m²	ÁREA TOTAL

Obs: Estimativa de área conforme levantamento em campo

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM

ÁREA	ESPESSURA	KM	MPXKM	UNIDADE	TRANSPORTE = A*E*DMT
2.055,234	0,05	5,00	513,81	m³	

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ DE MASSA ASFALTICA EM RODOVIA PAVIMENTADA COM DMT = 212,10 km (USINA - OBRA)

QUANTIDADE (t)	DMT	UNIDADE	USINA (TERESINA) - OBRA
2.466,31	212,10	t.km	
2,5	Total	523.104,35	TRANSPORTE TOTAL

CÁLCULO DE TRANSPORTE (RR-1C) A FRIO COM DMT = 490,00 km COM BDI DIFERENCIADO DE TRANSPORTE DE 15% (FORTALEZA - OBRA)

ÁREA	CONSUMO	QUANTIDADE	UNIDADE	RR-1C (0,00045 t/m³)
20.552,34	0,00045	1,00	9,25	t
2,6		Total	9,25	QUANTIDADE TOTAL

CÁLCULO DE TRANSPORTE DE CAP 50/70 A QUENTE COM DMT = 638,00 km COM BDI DIFERENCIADO DE TRANSPORTE DE 15% (FORTALEZA - USINA)

QUANTIDADE (t)	TRAÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.466,31	0,06323	t	155,94
2,7		Total	155,94

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO M PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016

EXTENSÃO	Quantidade	Desconto	TOTAL	UNIDADE	COMPRIMENTO = E x Q
852,000	2,00	60,00	1.644,00	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,000	2,00		348,00	m²	JOAQUIM LEITE
146,000	2,00	12,00	280,00	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,000	2,00	12,00	396,00	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,000	2,00	24,00	492,00	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,000	2,00	36,00	576,00	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,000	2,00	12,00	502,00	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,000	2,00	60,00	1.372,00	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,000	2,00	18,00	170,00	m²	R. DA CEPISA
3,1			Total	1.734,00	EXTENSÃO TOTAL X 30%

Obs: Estimativa de metros conforme levantamento em campo, para correção dos trechos danificados.

EXCUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 5CM ALTURA

EXTENSÃO	Quantidade	Desconto	TOTAL	UNIDADE	COMPRIMENTO = E x Q
852,000	2,00	60,00	1.644,00	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,000	2,00		348,00	m²	JOAQUIM LEITE
146,000	2,00	12,00	280,00	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,000	2,00	12,00	396,00	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,000	2,00	24,00	492,00	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,000	2,00	36,00	576,00	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,000	2,00	12,00	502,00	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,000	2,00	60,00	1.372,00	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,000	2,00	18,00	170,00	m²	R. DA CEPISA
3,2			Total	1.734,00	EXTENSÃO TOTAL X 30%

Obs: Estimativa de metros conforme levantamento em campo, para correção dos trechos danificados.

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Placa	Área p/ Placa	Área Total	Quantidade	UNIDADE	
Regulamentação	0,36	1,08	3,00	und	R. TOMÁS CAFÉ
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	JOAQUIM LEITE
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	TEIXEIRA SANTOS
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	RUA CÂNDIDO PEREIRA
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	R. MONSENHOR UCHOA
Regulamentação	0,36	0,72	2,00	und	R. DA CEPISA
4,1			Total	19,00	QUANTIDADE TOTAL

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREB 1916129285

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



LOCALIZAÇÃO: TERESINA- VIAS PÚBLICAS  
 MUNICÍPIO: PEDRO II - PI  
 TRECHO: R. TOMÁS CAFÉ / JOAQUIM LEITE / JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02) / TEIXEIRA SANTOS / ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03) / RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA / RUA CÂNDIDO PEREIRA / R. MONSENHOR UCHOA / R. DA CEPISA  
 EXTENSÃO: 3.007,000 m

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (H)	QUANTIDADE (Q)	ÁREA (M²) OU VOLUME (M³) (A E V)	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
<b>RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO</b>						
						ÁREA = C x L x Q X 10%
852,000	5,90		1,00	502,68	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,00	9,30		1,00	161,82	m²	JOAQUIM LEITE
146,00	Var		1,00	128,65	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,00	6,00		1,00	122,40	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,00	Var		1,00	252,16	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,000	3,55		1,00	108,63	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,000	6,40		1,00	164,48	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,000	7,80		1,00	558,48	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,000	5,95		1,00	55,93	m²	R. DA CEPISA
1,5			Total	2.055,23	m²	ÁREA TOTAL
Obs: Estimativa de área conforme levantamento em campo						

SERVIÇOS PRELIMINARES						
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM						
ÁREA	ESPESSURA	KM	M³XKM			TRANSPORTE = A*E*DMT
2.055,234	0,05	5,00	513,81		m³	

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM						
COMPRIMENTO	COMP. FAIXA	LARGURA	ESPACAMENTO	ÁREA		
852,00	2,00	0,10	4,00	206,91	m²	R. TOMÁS CAFÉ
174,00	2,00	0,10	4,00	42,26	m²	JOAQUIM LEITE
146,00	2,00	0,10	4,00	35,46	m²	JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
204,00	2,00	0,10	4,00	49,54	m²	TEIXEIRA SANTOS
258,00	2,00	0,10	4,00	62,66	m²	ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
306,00	2,00	0,10	4,00	74,31	m²	RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
257,00	2,00	0,10	4,00	62,41	m²	RUA CÂNDIDO PEREIRA
716,00	2,00	0,10	4,00	173,89	m²	R. MONSENHOR UCHOA
94,00	2,00	0,10	4,00	22,83	m²	R. DA CEPISA
4,2			Total	730,27	m²	QUANTIDADE TOTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM						
Placa	Quantidade		Total			
NOME DE RUA	6,00		6,00	und		R. TOMÁS CAFÉ
NOME DE RUA	4,00		4,00	und		JOAQUIM LEITE
NOME DE RUA	4,00		4,00	und		JOÃO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02)
NOME DE RUA	4,00		4,00	und		TEIXEIRA SANTOS
NOME DE RUA	4,00		4,00	und		ANTÔNIO BENICIO DA SILVA (TRECHO 01/02/03)
NOME DE RUA	4,00		4,00	und		RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
NOME DE RUA	2,00		2,00	und		RUA CÂNDIDO PEREIRA
NOME DE RUA	4,00		4,00	und		R. MONSENHOR UCHOA
NOME DE RUA	4,00		4,00	und		R. DA CEPISA
4,3			Total	36,00	und	QUANTIDADE TOTAL

SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO						
SUPORTE	Quantidade		Total			
	19,00		19,00	und		QUANTIDADE
4,4			Total	19,00	und	QUANTIDADE TOTAL

  
 Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129285

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE**

**MATERIAL PARA O C.B.U.Q.**

- D1: DISTÂNCIA DA AREIA MEDIA (TERESINA- USINA DE ASFALTO)  
 D2: DISTÂNCIA DA BRITA (BRITADOR EM LAGO DO PIAUÍ - USINA DE ASFALTO )  
 D3: DISTÂNCIA PEDRISCO (BRITADOR EM LAGO - USINA DE ASFALTO)  
 D4: DISTÂNCIA DA USINA - O LOCAL DA OBRA

D1 = 10,00 km  
 D2 = 49,20 km  
 D3 = 49,20 km  
 D4 = 212,10 km

**Observações:**


- 1) Será utilizada a Usina de asfalto da Prefeitura Municipal de Teresina-PI  
 2) O transporte de massa asfáltica (D4) corresponde a distância entre o local da usina de asfalto e o local da obra.

**CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT DA JAZIDA/EMPRÉSTIMO**

**Distância entre estacas:** 20,00 m  
**Largura média da plataforma (l):** 6,20 m  
**Espessura da camada CAUQ (e):** 0,05 m  
**Extensão do trecho (m):** 3.007,00 m

**CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT DA MASSA ASFÁLTICA**

MASSA	Km	Km Ré (A)	Km Vante (B)	DMT 1 (m)	DMT 2 (m)	Dist. Fixa (m)	DMT (m)
MASSA ASFÁLTICA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	210.000,00	212.100,000
						<b>DMT total</b>	<b>212.100,00</b>
						<b>DMT total (Km)</b>	<b>212,10</b>

  
 Yanna Carolina Rodrigues da SILVA  
 Engª Civil / CREA: 19161297-7



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 4.045,00 m

BDI 22,00 %



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Discriminação dos serviços	Valor Obras/ Serviços (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 103.727,27	R\$ 51.863,64	R\$ 31.118,18	R\$ 10.372,73	R\$ 10.372,73	4,20
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.167.503,38	R\$ 650.251,01	R\$ 650.251,01	R\$ 433.500,68	R\$ 433.500,68	87,79
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 156.268,08	R\$ 46.880,42	R\$ 46.880,42	R\$ 31.253,62	R\$ 31.253,62	6,33
4.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 41.333,92		R\$ 12.400,18	R\$ 16.533,57	R\$ 12.400,18	1,67
Total	Simples	R\$ 2.468.832,65	R\$ 748.995,07	R\$ 740.649,80	R\$ 491.660,59	R\$ 487.527,20	100,00
	Acumulado	R\$ 2.468.832,65	R\$ 748.995,07	R\$ 1.489.644,87	R\$ 1.981.305,46	R\$ 2.468.832,65	100,00

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engº Civil CREA: 191617900



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 4.045,00 m



BDI 22,00 %

TABELAS: Sicro-PI Outubro - 2022 Sem Desoneração

C01 - COMPOSIÇÃO

CUSTO COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (TERESINA-CANTEIRO DE OBRA)

1	EQUIPAMENTOS	Origem	Destino	Código SICRO	Distância KM (Ida )	K (Com Retorno)	Velocidade (Km/h)	Fator de Utilização (%)	Preço Unt operativo	Quantidade	Preço Total	Fonte de Preço	Equipamento p/ condução
1.1	<b>EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (IDA)</b>												
1.1.1	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Teresina	Canteiro	E9558	50	2,00	60	1,00	429,7282	1,00	716,21	SICRO	E9666 - Cavallo mecânico com semireboque com capacidade de 30 t - 285 kW
1.1.2	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Teresina	Canteiro	E9584	50	2,00	60	1,00	429,7282	1,00	716,21	SICRO	E9666 - Cavallo mecânico com semireboque com capacidade de 30 t - 285 kW
1.1.3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Teresina	Canteiro	E9681	50	2,00	60	0,50	429,7282	1,00	358,11	SICRO	E9666 - Cavallo mecânico com semireboque com capacidade de 30 t - 285 kW
1.1.4	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	Teresina	Canteiro	E9545	50	2,00	60	0,50	429,7282	1,00	358,11	SICRO	E9666 - Cavallo mecânico com semireboque com capacidade de 30 t - 285 kW
1.1.5	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Teresina	Canteiro	E9762	50	2,00	60	0,50	429,7282	1,00	358,11	SICRO	E9666 - Cavallo mecânico com semireboque com capacidade de 30 t - 285 kW
<b>SUBTOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (IDA)</b>											<b>2.506,75</b>		
1.2	<b>VEICULOS DE PRODUÇÃO (IDA)</b>												
1.2.1	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Teresina	Canteiro	E9579	50	2,00	60	1,00	293,5497	5,00	2.446,25	SICRO	Cond. por Conta Propria - E9579
1.2.2	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw	Teresina	Canteiro	E9592	50	2,00	60	1,00	277,8275	1,00	463,05	SICRO	Cond. por Conta Propria - E9508
1.2.3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 Kw	Teresina	Canteiro	E9509	50	2,00	60	1,00	274,7360	1,00	457,89	SICRO	Cond. por Conta Propria - E9509
<b>SUBTOTAL VEICULOS DE PRODUÇÃO (IDA)</b>											<b>3.367,19</b>		
<b>TOTAL DE MOBILIZAÇÃO</b>											<b>5.873,94</b>		
<b>TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>											<b>11.747,88</b>		
<b>BDI 22,00%</b>											<b>2.584,53</b>		
<b>TOTAL GERAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>											<b>14.332,41</b>		

Sendo:


Saída: Teresina-PI / Destino: Canteiro de Obra (Início do Trecho)

Distância adotada para ponto de partida até o canteiro de obra 50,00 km

Velocidade média adotada 60 km/h (baseado Manual do DNIT)

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPE

Quant.	Equipamentos
1	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG.
1	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M.
1	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T.
1	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T
1	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTROPELIDO DE 11,6 t - 82 KW
1	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M.
1	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 136 KW.
1	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAÇAMBA CAPACIDADE DE 1,5 M³
1	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 19338 KG
1	USINA DE MISTURAS ASFÁLTICAS A QUENTE, MOVEL, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H
1	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
1	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10 000 l
1	CAMINHÃO CARROCERIA 9T

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129285






OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q  
LOCAL: PEDRO II - PI  
EXTENSÃO: 4.045,00 m



C02 - COMPOSIÇÃO

TABELAS: SICRO OUTUBRO -2022 Sem Desoneração

ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						UNID.: UND
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	% de Utilização	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL
<b>MAO DE OBRA</b>						
P9812	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	MÊS	2,0000	30%	22.386,35	13.431,81
P9893	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	MÊS	2,0000	80%	7.494,17	11.990,68
P9804	APONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,0000	70%	4.287,87	6.003,02
P9803	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,0000	60%	5.510,16	6.612,19
P9827	VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,0000	70%	4.351,86	6.092,61
<b>Total Simples</b>						<b>44.130,31</b>
<b>BDI (22,00%)</b>						<b>9.708,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>53.838,98</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129285





OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 4.045,00 m



C03 - COMPOSIÇÃO

PREÇO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  
CDC - Coordenadoria de Defesa da Concorrência

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS - 2022

Produto: CAP 50/70

Unidade - R\$/kg

UF	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Ceará	-	-	-	-	-	3,7791	-	-	-	-	-	-

Notas:

CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO CAP 50/70 - M101/ANP (ICMS 18% E BDI 15,00%)

Aquisição =  $(3,7791 * 1000 / (1 - 0,18 - 0,0065 - 0,03)) * 1,15$

Aquisição = R\$ 5.546,82 /ton



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  
CDC - Coordenadoria de Defesa da Concorrência

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS - 2022

Produto: RR-1C


Unidade - R\$/kg

UF	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Ceará	-	-	-	-	-	2,7379	-	-	-	-	-	-

CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO RR-1C - M103/ANP (ICMS 18% E BDI 15,00%)

Aquisição =  $(2,7379 * 1000 / (1 - 0,18 - 0,0065 - 0,03)) * 1,15$

Aquisição = R\$ 4.018,67 /ton

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129285



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q  
 LOCAL: PEDRO II - PI  
 EXTENSÃO: 4.045,00 m



**C04 E C05 - COMPOSIÇÃO**  
**TRANSPORTE DE MATERIAL**

TABELAS: Sicro-PI Outubro - 2022 Sem Desoneração

Descrição	Código	Referência	Und	Coeficiente	Preço	Total																													
<b>CÁLCULO DE TRANSPORTE (RR-1C) A FRIO COM DMT = 490,00 km COM BDI DIFERENCIADO DE TRANSPORTE DE 15% (FORTALEZA - OBRA)</b>	<b>C05</b>	<b>SICRO</b>	<b>T</b>		<b>421,56</b>																														
Distância de Transporte - Material Betuminoso (D)	490,00		km			RODOVIA PAVIMENTADA																													
ICMS (PIAUÍ)	18,00		%																																
<p>1 - Custo de Transporte a Frio em rodovia pavimentada  <math>T = ((26,939 + 0,253 \times D1) / (1-ICMS)) \times IT / \text{ton.}</math>            Atualização dos Índices para Transporte de Materiais Betuminosos</p> <p><b>ÍNDICE REAJUSTE DE PAVIMENTAÇÃO</b>            Julho/2014 - 270,237            Outubro/2022 - 537,964 Índice de atualização até a data base &gt; I = 1,9907  <b>Índice Final de Atualização</b> <span style="float: right;"><b>IT = &gt; 1,9907</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Cálculo Atualizado</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TRANSPORTE A FRIO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Fixo</td> <td style="width: 10%;">26,939</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">26,939 x IT =</td> <td style="width: 10%;">53,627</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Variável</td> <td>0,253</td> <td></td> <td>0,253 x IT =</td> <td>0,504</td> </tr> </table> <p>Fórmula Atualizada  <math>T = (53,627 + 0,504 \times D1) / (1-ICMS) / \text{ton.}</math></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">R\$/T</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">366,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Custo Horário da Mão-de-obra</b></td> <td style="text-align: right;">366,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Custo Unitário Direto Total</b></td> <td style="text-align: right;">366,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Lucro e Despesas Indiretas (15 %)</b></td> <td style="text-align: right;">54,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Preço Unitário Total</b></td> <td style="text-align: right;">421,56</td> </tr> </table>							TRANSPORTE A FRIO		Fixo	26,939		26,939 x IT =	53,627			Variável	0,253		0,253 x IT =	0,504		R\$/T	366,57		<b>Custo Horário da Mão-de-obra</b>	366,57		<b>Custo Unitário Direto Total</b>	366,57		<b>Lucro e Despesas Indiretas (15 %)</b>	54,99		<b>Preço Unitário Total</b>	421,56
TRANSPORTE A FRIO		Fixo	26,939		26,939 x IT =	53,627																													
		Variável	0,253		0,253 x IT =	0,504																													
	R\$/T	366,57																																	
	<b>Custo Horário da Mão-de-obra</b>	366,57																																	
	<b>Custo Unitário Direto Total</b>	366,57																																	
	<b>Lucro e Despesas Indiretas (15 %)</b>	54,99																																	
	<b>Preço Unitário Total</b>	421,56																																	

Descrição	Código	Referência	Und	Coeficiente	Preço	Total																													
<b>CALCULO DE TRANSPORTE DE CAP 50/70 A QUENTE COM DMT = 638,00 km COM BDI DIFERENCIADO DE TRANSPORTE DE 15% (FORTALEZA - USINA)</b>	<b>C06</b>	<b>SICRO</b>	<b>T</b>		<b>526,17</b>																														
Distância de Transporte - Material Betuminoso (D)	638,00		km			RODOVIA PAVIMENTADA																													
ICMS (PIAUÍ)	18,00		%																																
<p>1 - Custo de Transporte a Quente em rodovia pavimentada  <math>T = ((26,939 + 0,253 \times D1) / (1-ICMS)) \times IT / \text{ton.}</math>            Atualização dos Índices para Transporte de Materiais Betuminosos</p> <p><b>ÍNDICE REAJUSTE DE PAVIMENTAÇÃO</b>            Julho/2014 - 270,237            Outubro/2022 - 537,964 Índice de atualização até a data base &gt; I = 1,9907  <b>Índice Final de Atualização</b> <span style="float: right;"><b>IT = &gt; 1,9907</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Cálculo Atualizado</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TRANSPORTE A QUENTE</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Fixo</td> <td style="width: 10%;">26,939</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">26,939 x IT =</td> <td style="width: 10%;">53,627</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Variável</td> <td>0,253</td> <td></td> <td>0,253 x IT =</td> <td>0,504</td> </tr> </table> <p>Fórmula Atualizada  <math>T = (53,627 + 0,504 \times D1) / (1-ICMS) / \text{ton.}</math></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">R\$/T</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">457,54</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Custo Horário da Mão-de-obra</b></td> <td style="text-align: right;">457,54</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Custo Unitário Direto Total</b></td> <td style="text-align: right;">457,54</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Lucro e Despesas Indiretas (15 %)</b></td> <td style="text-align: right;">68,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Preço Unitário Total</b></td> <td style="text-align: right;">526,17</td> </tr> </table>							TRANSPORTE A QUENTE		Fixo	26,939		26,939 x IT =	53,627			Variável	0,253		0,253 x IT =	0,504		R\$/T	457,54		<b>Custo Horário da Mão-de-obra</b>	457,54		<b>Custo Unitário Direto Total</b>	457,54		<b>Lucro e Despesas Indiretas (15 %)</b>	68,63		<b>Preço Unitário Total</b>	526,17
TRANSPORTE A QUENTE		Fixo	26,939		26,939 x IT =	53,627																													
		Variável	0,253		0,253 x IT =	0,504																													
	R\$/T	457,54																																	
	<b>Custo Horário da Mão-de-obra</b>	457,54																																	
	<b>Custo Unitário Direto Total</b>	457,54																																	
	<b>Lucro e Despesas Indiretas (15 %)</b>	68,63																																	
	<b>Preço Unitário Total</b>	526,17																																	

  
 Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129285



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 4.045,00 m

**C06 - COMPOSIÇÃO**

COMP-06 - Placa da obra em chapa de aço galvanizado - 3,0 x 2,0 m (01 placa) (m2)

TABELAS: Sicro-PI Outubro - 2022 Sem Desoneração

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	1,00000000	23,39	23,39
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	2,00000000	18,58	37,16
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>60,55</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	SICRO NOVO	m	1,00000000	4,73	4,73
M0284	Calbro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	SICRO NOVO	m	4,00000000	21,44	85,76
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	SICRO NOVO	kg	11,78000000	14,65	172,59
M1205	Prego de ferro	SICRO NOVO	kg	0,11000000	14,51	1,60
M3238	Película não retrorrefletiva tipo IV	SICRO NOVO	m <sup>2</sup>	1,00000000	118,57	118,57
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>383,25</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m <sup>3</sup>	0,01000000	327,70	3,28
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>3,28</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>447,08</b>
<b>TAXA DE BDI (22,00 %):</b>						<b>98,36</b>
<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO:</b>						<b>545,44</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / OAB: 19161292/R-PI

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 4.045,00 m

SECRETARIA  
DO TURISMO - SETUR



C07 - COMPOSIÇÃO


COMPOSIÇÕES CANTEIRO DE OBRAS / SICRO PI - OUTUBRO/2022

Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos  
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: outubro de 2022

Item	Código	Tipo	Unidade	Custo unitário (R\$ / un)
Imóveis	B8951	Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI)	m <sup>2</sup> x mês	46,26
	B8952	Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI)	m <sup>2</sup> x mês	30,25
Mobiliário	B8953	Escritório	ocupante x mês	510,27
	B8954	Residência	ocupante x mês	41,94
Cesta das Instalações	B8955	Laboratório de asfalto	mês	5.662,88
	B8956	Laboratório de concreto	mês	4.065,74
	B8957	Laboratório de solos	mês	4.478,52
	B8958	Topografia	mês	2.967,36
Custos Diversos	B8959	Escritório	ocupante x mês	128,84
	B8960	Residência	ocupante x mês	196,01

Fonte: FGV IBRE

Discriminação	unidade	Quant.	Custo Unit.	%	Total
Imóvel Residencial	m <sup>2</sup> x mês	300	30,25	50%	4.537,50
Imobiliário Residencial	ocupante x mês	20	41,94	50%	419,40
<b>Total Sem BDI:</b>					<b>4.956,90</b>
<b>Total Sem BDI em 4 mês:</b>					<b>19.827,60</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>o</sup> Civil / CREA: 1916129285

SECRETARIA DE  
Fis: 89  
GOVERNADOR DO PIAUÍ

**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**  
**LOCAL: PEDRO II - PI**  
**EXTENSÃO: 4.045,00 m**



**C08 - COMPOSIÇÃO**

**PREÇO BASE: SINAPI PI 10/2022 E SICRO PI 10/2022 - SEM DESONERAÇÃO**

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
DROP	94287 ADAPTADA	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_06/2016	M		37,44	
INSUMO	M0028	Areia média	M3	0,01	129,55	1,30
INSUMO	M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	M	0,2	3,08	0,62
INSUMO	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	M	0,083	18,00	1,49
INSUMO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	0,019	426,57	8,10
COMPOSICAO	P9821	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454	23,34	10,60
COMPOSICAO	P9824	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454	18,58	8,43
					<b>CUSTO DIRETO TOTAL:</b>	<b>30,54</b>
					<b>TAXA DE BDI (% 22,00):</b>	<b>6,71</b>
					<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO:</b>	<b>37,25</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 19161297-0



**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**  
**LOCAL: PEDRO II - PI**  
**EXTENSÃO: 4.045,00 m**



**C09 - COMPOSIÇÃO**

**PREÇO BASE: SINAPI PI 10/2022 E SICRO PI 10/2022 - SEM DESONERAÇÃO**

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
PAVI	103696 ADAPTADA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN		130,72	
INSUMO	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 20CM X 45CM	UND	2	99	198,00
COMPOSICAO	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1	130,72	130,72
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5152	23,34	12,02
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5455	18,58	28,71
<b>CUSTO DIRETO TOTAL:</b>						<b>369,45</b>
<b>TAXA DE BDI (% 22,00):</b>						<b>81,27</b>
<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO:</b>						<b>450,72</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129235

### COMPOSIÇÃO DO BDI

**Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:**

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,80%	20,87%	24,23%

2.3. Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias":

PARCELA DO BDI	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS e ISSQN	Conforme legislação específica		

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;  
S: taxa de seguros;  
R: taxa de riscos;  
G: taxa de garantias;  
DF: taxa de despesas financeiras;  
L: taxa de lucro/remuneração;  
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

#### OBSERVAÇÕES

Parâmetro	%	Verificação	CÁLCULO DO BDI
Administração Central	4,01%	OK	22,00%
Seguros e Garantias	0,40%	OK	OK
Riscos	0,56%	OK	
Despesas Financeiras	1,11%	OK	
Lucro	7,30%	OK	
Tributos	6,65%	OK	
PIS	0,65%		
COFINS	3,00%		
CPRB	0,00%		
ISSQN	3,00%		

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 4,5% no item impostos.

c) Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.



### COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO DO MATERIAL BETUMINOSO

ITEM	COMPONENTE	PERCENTUAL (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,48
R	RISCO	0,85
DF	DESPEZA FINANCEIRA	0,85
L	LUCRO	4,86
I	IMPOSTOS/ TRIBUTOS	3,65
I.1	PIS	0,65
I.2	COFINS	3,00
I.3	ISS	
I.4	INSS	
<b>BDI</b>	<b><math>[(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I)] - 1</math></b>	<b>15,00</b>

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CRM: 1916129285



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CBOU TERESINA\_SETUR



Bancos  
SINAPI - 10/2022 - Piauí  
SICRO3 - 10/2022 - Piauí

B.D.I.  
22,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: 0,00%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1		Código Banco	Descrição	Composições Principais		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1500412	SICRO3	Raspagem e limpeza de terreno plano	Tipo		m²	1,0000000	3,78	3,78	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário					
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	18,5777					
					Custo Horário da Mão de Obra =>	18,5777				
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000				
					Custo Horário de Execução =>	18,5777				
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0173				
					Custo do FIC =>	0,0642				
					Produção de Equipe =>	5,0000				
					Custo Unitário de Execução =>	3,7155				
					MO sem LS =>	3,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,72
					Valor do BDI =>	0,83	Valor com BDI =>		4,61	
2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	2,15	2,15		
Composição Auxiliar	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0089000	334,38	1,97		
Composição Auxiliar	89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0025000	74,08	0,18		
					MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14
					Valor do BDI =>	0,47	Valor com BDI =>		2,82	
3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	1,0000000	0,28	0,28			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário		
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00	0,00	277,2432	68,7673	277,2432		
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00	0,00	55,8084	37,9832	111,2128		
					Custo Horário de Equipamentos =>		388,4860			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário					
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	18,5777	37,1554				
					Custo Horário da Mão de Obra =>	37,1554				
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000				
					Custo Horário de Execução =>	428,8114				
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0029				
					Custo do FIC =>	0,0008				
					Produção de Equipe =>	1.800,0000				
					Custo Unitário de Execução =>	0,2837				
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário				
Insumo	SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,004500	t	0,0000	0,0000			
					MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02
					Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>		0,34	
4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	4011463	SICRO3	Concreto estético - faixa C - areia e brita comerciais	t	1,0000000	203,25	203,25			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário		
Insumo	E9782	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,71	242,8722	110,3299	204,4349		
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,41 - 82 kW	1,0000000	0,82	283,7879	94,8066	249,7713		
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroscabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,0000000	1,00	339,4728	142,8027	339,4728		
					Custo Horário de Equipamentos =>		793,6790			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário					
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000	18,5777	148,6216				
					Custo Horário da Mão de Obra =>	148,6216				
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000				
					Custo Horário de Execução =>	942,3006				
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0029				
					Custo do FIC =>	0,0272				
					Produção de Equipe =>	99,8000				
					Custo Unitário de Execução =>	9,4808				
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário				
Atividade Auxiliar	SICRO3	6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	1,0200000	t	182,2800	185,9256			
					Custo Total das Atividades =>		185,9256			
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
Tempo Fixo	SICRO3	6416078	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	5914849	1,0200000	t	7,6800	7,8336		
					Custo Total dos Tempos Fixos =>		7,8336			

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129283



Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais				Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0200000	ton	5914359 0,000 R\$ 1,21	5914374 0,000 R\$ 0,97	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>								0,0000	
MO em LS =>				2,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,25	
Valor do BDI =>				44,71	Valor com BDI =>			247,96	
<b>5</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	
Composição	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	1,0000000	ton	1,0000000		0,79	0,79	
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000		1,00	0,00	296,0569	80,4168	
Custo Horário de Equipamentos =>								296,0569	
Custo Horário de Execução =>								296,0569	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0000	
Custo do FIC =>								0,0000	
Produção de Equipe =>								373,5000	
Custo Unitário de Execução =>								0,7927	
MO em LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				0,17	Valor com BDI =>			0,96	
<b>10</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	
Composição	5213440 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	1,0000000	un	1,0000000		227,12	227,12	
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000		0,30	0,70	150,3340	62,7129	
Custo Horário de Equipamentos =>								81,9992	
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	
Insumo	P9630 SICRO3	Montador	1,0000000				28,6953	28,6953	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000				18,5777	37,1554	
Custo Horário de Mão de Obra =>								65,8407	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,6%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								147,8399	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0000	
Custo do FIC =>								0,0000	
Produção de Equipe =>								3,0000	
Custo Unitário de Execução =>								49,2800	
<b>D</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Atividades Auxiliares</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	
Atividade Auxiliar	SICRO3 5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	0,3600000	m²			494,0000	177,8400	
Custo Total das Atividades =>								177,8400	
MO em LS =>				35,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,10	
Valor do BDI =>				49,96	Valor com BDI =>			277,08	
<b>11</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	
Composição	5213403 SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsão em água - espessura de 0,5 mm	1,0000000	m²	1,0000000		19,01	19,01	
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	
Insumo	E9844 SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/15 kW	1,0000000		1,00	0,00	385,7604	147,8464	
Custo Horário de Equipamentos =>								385,7604	
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	
Insumo	P9693 SICRO3	Pré-marcador	1,0000000				19,1130	19,1130	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000				18,5777	74,3106	
Custo Horário de Mão de Obra =>								93,4238	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,6%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								479,1842	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0000	
Custo do FIC =>								0,0000	
Produção de Equipe =>								163,2300	
Custo Unitário de Execução =>								2,9386	
<b>C</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	
Insumo	SICRO3 M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,1000000	kg			9,9170	0,9917	
Insumo	SICRO3 M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3900000	kg			10,8864	3,8102	
Insumo	SICRO3 M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsão em água para demarcação viária	0,5000000	l			22,4088	11,2044	
Insumo	SICRO3 M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsão em água para pré-marcção viária	0,0009700	l			22,4088	0,0217	
Custo Total do Material =>								16,0280	
<b>E</b>	<b>Banco Insumo</b>	<b>Tempos Fixos</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	
Tempo Fixo	SICRO3 M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001000	t			33,0900	
Tempo Fixo	SICRO3 M2038	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t			33,0900	
Tempo Fixo	SICRO3 M2036	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008000	t			33,0900	
Custo Total dos Tempos Fixos =>								0,0414	

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA 1916129283



Composições Analíticas com Preço Unitário

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Composições Principais			Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
				LN	RP	P						
Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000			
Momento de Transporte	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000			
Momento de Transporte	SICRO3	M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsificada em água para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000			
									Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000
MO sem LS =>								0,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,58
Valor do BDI =>								4,18	Valor com BDI =>			23,19
12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	5216111 SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	1,0000000	125,48	125,48					
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário				
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	150,3340	52,7129	81,9992				
									Custo Horário de Equipamentos =>			81,9992
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário							
Insumo	P9608 SICRO3	Carpinteiro	1,0000000	23,3941	23,3941							
Insumo	P9622 SICRO3	Pintor	0,5000000	27,9028	13,9514							
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,5777	18,5777							
									Custo Horário de Mão de Obra =>			55,9232
									Adc.M.O. - Ferramentas (0,6%) =>			0,8000
									Custo Horário de Execução =>			137,8224
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
									Custo do FIC =>			0,0000
									Produção de Equipe =>			4,0000
									Custo Unitário de Execução =>			34,4806
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário						
Insumo	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos,	0,6962200	kg	24,7036	17,1991						
Insumo	SICRO3 M1682	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	3,0000000	m	21,1026	63,3078						
Insumo	SICRO3 M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	0,2563500	l	21,4639	5,5023						
									Custo Total do Material =>			86,0092
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário						
Atividade Auxiliar	SICRO3 1108165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,0037500	m³	374,1900	1,4032						
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0565500	m³	37,8000	2,1376						
Atividade Auxiliar	SICRO3 4815671	Reatero e compactação com soquete vibratório	0,0528000	m³	14,7700	0,7769						
									Custo Total das Atividades =>			4,3207
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário					
Tempo Fixo	SICRO3 M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0007000	t	33,0900	0,2322					
Tempo Fixo	SICRO3 M1682	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0192000	t	33,0900	0,6353					
Tempo Fixo	SICRO3 M2128	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0003500	t	33,0900	0,0116					
									Custo Total dos Tempos Fixos =>			0,8701
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário				
					LN	RP	P					
Momento de Transporte	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0007000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000			
Momento de Transporte	SICRO3	M1682	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0192000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000			
Momento de Transporte	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000			
									Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,8000
MO sem LS =>								17,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,07
Valor do BDI =>								27,60	Valor com BDI =>			153,08
13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016		M	1,0000000	43,34	43,34					
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	22,36	8,80					
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	17,43	6,86					
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	699,65	1,39					
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	90,00	0,63					
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0060000	25,54	25,66					
MO sem LS =>								11,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,43
Valor do BDI =>								9,53	Valor com BDI =>			52,87

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129285



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Auxiliares

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,74	1,74	
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Custo Operacional Operativa</b>	<b>Custo Operacional Improdutiva</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,86	0,14	286,0569	80,4168	797,8019
								Custo Horário de Equipamentos => 797,8019
								Custo Horário de Execução => 797,8019
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
								Custo do FIC => 0,0000
								Produção de Equipe => 487,1600
								Custo Unitário de Execução => 1,7447
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI => 2,12
Composição	5914333 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 l - carga e descarga com caminhão guindaste de 20 t.m		t	1,0000000	33,77	33,77	
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Custo Operacional Operativa</b>	<b>Custo Operacional Improdutiva</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 188 kW	2,0000000	0,53	0,47	280,3347	72,4699	385,2737
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	319,1336	108,2152	319,1336
								Custo Horário de Equipamentos => 684,4073
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>				<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000				18,5777	37,1554
								Custo Horário da Mão de Obra => 37,1554
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
								Custo Horário de Execução => 721,8627
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
								Custo do FIC => 0,0000
								Produção de Equipe => 21,3700
								Custo Unitário de Execução => 33,7882
				MO sem LS =>	1,74	LS =>	0,00	MO com LS => 1,74
				Valor do BDI =>	7,42			Valor com BDI => 41,19
Composição	5914649 SICRO3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa e quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora		t	1,0000000	7,68	7,68	
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Custo Operacional Operativa</b>	<b>Custo Operacional Improdutiva</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,81	0,19	296,0569	80,4168	765,2558
								Custo Horário de Equipamentos => 765,2558
								Custo Horário de Execução => 765,2558
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
								Custo do FIC => 0,0000
								Produção de Equipe => 99,6000
								Custo Unitário de Execução => 7,8833
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,88			Valor com BDI => 9,36
Composição	86629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	699,65	699,65	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	17,43	149,37	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	90,00	96,30	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9800000	0,94	453,98	
				MO sem LS =>	101,72	LS =>	0,00	MO com LS => 101,72
				Valor do BDI =>	153,92			Valor com BDI => 853,57
Composição	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	74,08	74,08	
Composição Auxiliar	86281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,85	21,85	
Composição Auxiliar	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,07	40,07	
Composição Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,78	6,78	
Composição Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,38	5,38	
				MO sem LS =>	17,23	LS =>	0,00	MO com LS => 17,23
				Valor do BDI =>	16,29			Valor com BDI => 90,37

Composições Analíticas com Preço Unitário  
 CBUQ TEREZINA\_SETUR

Bancos  
 SINAPI - 10/2022 - Piauí  
 SICROS - 10/2022 - Piauí

B.D.I.  
 22,0%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado: 0,00%



Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais							
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	334,38	334,38		
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	21,85	21,85		
Composição Auxiliar	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	40,07	40,07		
Composição Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	6,78	6,78		
Composição Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	5,38	5,38		
Composição Auxiliar	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	66,39	66,39		
Composição Auxiliar	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	193,91	193,91		
		MO sem LS =>		17,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,23	
		Valor do BDI =>		73,56			Valor com BDI =>	407,94	
Composição	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	40,07	40,07		
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000603	312.237,76	18,82		
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,58" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000342	621.411,00	21,25		
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		8,81			Valor com BDI =>	48,86	
Composição	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	5,38	5,38		
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000059	312.237,76	1,84		
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,58" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000057	621.411,00	3,54		
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		1,18			Valor com BDI =>	6,56	
Composição	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	6,78	6,78		
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000074	312.237,76	2,31		
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,58" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000072	621.411,00	4,47		
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		1,49			Valor com BDI =>	8,27	
Composição	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	66,39	66,39		
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000849	312.237,76	26,50		
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,58" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000642	621.411,00	39,89		
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		14,60			Valor com BDI =>	80,99	
Composição	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	193,91	193,91		
Insumo	0004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	29,4700000	6,58	193,91		
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		42,66			Valor com BDI =>	236,57	
Composição	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,0041000	17,16	0,07		
		MO sem LS =>		0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07	
		Valor do BDI =>		0,01			Valor com BDI =>	0,08	
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	0004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	16,39	0,28		
		MO sem LS =>		0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28	
		Valor do BDI =>		0,06			Valor com BDI =>	0,34	

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREMOP/PA 1916129263



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	11,67	0,20		
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24	
Composição	5914363 SICRO3	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³		t	1,0000000	18,69	18,69		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	485,3033	102,9318	485,3033	
								Custo Horário de Equipamentos => 485,3033	
								Custo Horário de Execução => 485,3033	
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000	
								Custo do FIC => 0,0000	
								Produção de Equipe => 25,9700	
								Custo Unitário de Execução => 18,8871	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>	22,80	
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	33,09	33,09		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 198 kW	1,0000000	1,00	0,00	280,3347	72,4899	280,3347	
								Custo Horário de Equipamentos => 280,3347	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000			18,5777		111,4662	
								Custo Horário da Mão de Obra => 111,4662	
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,8%) => 0,0000	
								Custo Horário de Execução => 391,8009	
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000	
								Custo do FIC => 0,0000	
								Produção de Equipe => 11,8400	
								Custo Unitário de Execução => 33,0613	
			MO sem LS =>	9,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,41	
			Valor do BDI =>	7,27			Valor com BDI =>	40,36	
Composição	1106165 SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais		m³	1,0000000	374,18	374,18		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			18,5777		37,1554	
								Custo Horário da Mão de Obra => 37,1554	
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,8%) => 0,0000	
								Custo Horário de Execução => 37,1554	
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000	
								Custo do FIC => 0,0000	
								Produção de Equipe => 3,9290	
								Custo Unitário de Execução => 9,4967	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rechão	0,5260000	m³		123,1074		64,7545	
								Custo Total do Material => 64,7545	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³		426,5700		298,5990	
								Custo Total das Atividades => 298,5990	
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3 M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	6914647	0,7890000	t	1,7400		1,3729	
								Custo Total dos Tempos Fixos => 1,3729	
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rechão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,7890000	ton	LN RP P	5914359 5914374 5914389		0,0000	
						0,000 0,000 0,000			
						R\$ 1,21 R\$ 0,97 R\$ 0,79			
								Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000	
			MO sem LS =>	45,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,27	
			Valor do BDI =>	82,31			Valor com BDI =>	456,49	
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	426,57	426,57		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9010 SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,5091	1,0138	1,5091	
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	45,6690	26,9249	45,6690	
Insumo	E9621 SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 KVA	1,0000000	1,00	0,00	3,2854	0,2294	3,2854	
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,8086	0,5804	3,1347	
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual garra com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,7169	1,1672	4,1777	
								Custo Horário de Equipamentos => 57,7789	



Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais				Salário Hora	Custo Horário		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade						
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000			23,3388	23,3388		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000			18,5777	167,1993		
							<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>	<b>190,5381</b>	
							<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>	<b>0,0000</b>	
							<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>248,3140</b>	
							<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>	
							<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>	
							<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>3,8280</b>	
							<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>63,2005</b>	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
Insumo	SICRO3 M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassas	0,8464600	kg	6,0512	5,1221			
Insumo	SICRO3 M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	119,4988	75,6821			
Insumo	SICRO3 M0191	Brita 1	0,3675400	m³	147,4407	54,1904			
Insumo	SICRO3 M0192	Brita 2	0,3675400	m³	131,7851	48,4363			
Insumo	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saoo	282,1520700	kg	0,5919	167,0058			
							<b>Custo Total do Material =&gt;</b>	<b>350,4367</b>	
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Tempo Fixo	SICRO3 M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0008500	t	33,0900	0,0281		
Tempo Fixo	SICRO3 M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,7400	1,6530		
Tempo Fixo	SICRO3 M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,7400	0,9593		
Tempo Fixo	SICRO3 M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,7400	0,9593		
Tempo Fixo	SICRO3 M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,2821500	t	33,0900	9,3363		
							<b>Custo Total dos Tempos Fixos =&gt;</b>	<b>12,8380</b>	
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
					LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3 M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,21	5914374 0,000 R\$ 0,97	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,21	5914374 0,000 R\$ 0,97	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,21	5914374 0,000 R\$ 0,97	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saoo - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000	
							<b>Custo total dos Momentos de Transportes =&gt;</b>	<b>0,0000</b>	
				MO sem LS =>	51,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,16
				Valor do BDI =>	93,84	Valor com BDI =>		520,41	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4805750 SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m		m²	1,0000000	37,80	37,80		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário			
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000		18,5777	18,5777			
							<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>	<b>18,5777</b>	
							<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>	<b>0,0000</b>	
							<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>18,5777</b>	
							<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0173</b>	
							<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,6420</b>	
							<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>0,6000</b>	
							<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>37,1854</b>	
				MO sem LS =>	37,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,16
				Valor do BDI =>	8,31	Valor com BDI =>		46,11	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,85	21,85		
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	17,16	17,16		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,29	2,29		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,89	0,89		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76		
				MO sem LS =>	17,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,23
				Valor do BDI =>	4,80	Valor com BDI =>		26,65	



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,35	22,35		
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,29	2,29		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,0000000	0,89	0,89		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74		
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09		
				MO sem LS =>	16,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,67
				Valor do BDI =>	4,91	Valor com BDI =>		27,26	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	521252 SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		m²	1,0000000	16,24	16,24		
A									
Insumo	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9076 SICRO3	Equipamento para pintura eletrolítica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kcal	1,0000000	1,00	0,00	43,6211	37,4138	43,6211	
Insumo	E9086 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	1,0000000	1,00	0,00	18,8522	3,8690	18,8522	
						Custo Horário de Equipamentos =>		82,4733	
B									
Insumo	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	1,0000000			19,3484	19,3484		
Insumo	P9822 SICRO3	Pintor	2,0000000			27,9028	55,8056		
						Custo Horário da Mão de Obra =>		75,1540	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		137,8273	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
						Custo do FIC =>		0,0000	
						Produção de Equipe =>		18,1800	
						Custo Unitário de Execução =>		7,1888	
C									
Insumo	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,1120000	kg			80,8049	9,0501	
						Custo Total do Material =>		9,0801	
E									
Tempo Fixo	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M3153	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 151 - carga e descarga manual	5914655	0,0001100	t			33,0900	0,0036
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0036	
F									
Momento de Transporte	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 151 - 188 kW	0,0001100	km	LN	RP	P	0,0000	
					5914449	5914464	5914479		
					0,000	0,000	0,000		
					R\$ 1,15	R\$ 0,92	R\$ 0,75		
						Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000	
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,93
				Valor do BDI =>	3,57	Valor com BDI =>		19,81	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5213414 SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + S1 - confecção		m²	1,0000000	464,00	464,00		
A									
Insumo	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9588 SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,2056	0,1364	0,0310	
Insumo	E9086 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,4819300	1,00	0,00	18,8522	3,8690	9,0854	
Insumo	E9623 SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	15,0973	9,5967	3,0315	
Insumo	E9622 SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	8,8867	5,6508	4,2842	
						Custo Horário de Equipamentos =>		16,4321	
B									
Insumo	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	2,0000000			19,3484	38,6968		
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000			28,6853	28,6853		
Insumo	P9823 SICRO3	Serralheiro	1,0000000			25,8346	25,8346		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			18,5777	37,1554		
						Custo Horário da Mão de Obra =>		130,3721	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		146,8042	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
						Custo do FIC =>		0,0000	
						Produção de Equipe =>		4,0000	
						Custo Unitário de Execução =>		38,7011	
C									
Insumo	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado	11,7750000	kg			14,6511	172,5167	
Insumo	SICRO3 M3229	Película retrorrefletiva tipo I + S1 (ainal impresso com película de sobreposição tipo V)	1,0000000	m²			268,1335	268,1335	
						Custo Total do Material =>		440,6502	
D									
Atividade Auxiliar	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 521252	Pintura eletrolítica a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²			16,2400	16,2400	
						Custo Total das Atividades =>		16,2400	

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 191612926-1





Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais							
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Tempo Fixo	SICRO3 M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 Lm	5914333	0,0117800	t	33,7700	0,3978		
Tempo Fixo	SICRO3 M3229	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0004400	t	33,0900	0,0146		
<b>Custo Total dos Tempos Fixos =&gt;</b>							<b>0,4124</b>		
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário		
					LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	0,0117800	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	0,0004400	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000	
<b>Custo total dos Momentos de Transportes =&gt;</b>							<b>0,0000</b>		
				MO sem LS =>	36,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,54
				Valor do BDI =>	108,88			Valor com BDI =>	602,88
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
A	4815671 SICRO3	Resteio e compactação com soquete vibratório		m²	1,0000000	14,77	14,77		
Insumo	E9647 SICRO3	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
		Compactor manual com soquete vibratório - 4,10 KW	1,0000000	1,00	0,00	8,8185	1,1566	8,8185	
<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>							<b>8,8185</b>		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	2,0000000			18,5777	37,1554		
<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>							<b>37,1554</b>		
<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>							<b>0,0000</b>		
<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>							<b>46,9719</b>		
<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>							<b>0,0000</b>		
<b>Custo do FIC =&gt;</b>							<b>0,0000</b>		
<b>Produção de Equipe =&gt;</b>							<b>3,1126</b>		
<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>							<b>14,7701</b>		
				MO sem LS =>	11,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,94
				Valor do BDI =>	3,24			Valor com BDI =>	18,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,43	17,43		
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20		
Auxiliar	0006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,67	11,67		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,29	2,29		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,69	0,69		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56		
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15		
				MO sem LS =>	11,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,87
				Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI =>	21,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em laito natural		tkm	1,0000000	1,21	1,21		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 KW	1,0000000	1,00	0,00	296,0569	80,4188	296,0569	
<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>							<b>296,0569</b>		
<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>							<b>296,0569</b>		
<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>							<b>0,0173</b>		
<b>Custo do FIC =&gt;</b>							<b>0,0206</b>		
<b>Produção de Equipe =&gt;</b>							<b>249,0000</b>		
<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>							<b>1,1890</b>		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,47
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,97	0,97		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 KW	1,0000000	1,00	0,00	296,0569	80,4188	296,0569	
<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>							<b>296,0569</b>		
<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>							<b>296,0569</b>		
<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>							<b>0,0173</b>		
<b>Custo do FIC =&gt;</b>							<b>0,0184</b>		
<b>Produção de Equipe =&gt;</b>							<b>311,2600</b>		
<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>							<b>0,9812</b>		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,18

*Yanna Carolina Rodrigues da Silva*  
 Engª Civil / CREA: 1916129285



Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	1,15	1,15	
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>			
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 280,3347 Improdutiva 72,4669	280,3347			
							Custo Horário de Equipamentos =>	280,3347	
							Custo Horário de Execução =>	280,3347	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0173	
							Custo do FIC =>	0,0196	
							Produção de Equipe =>	248,6900	
							Custo Unitário de Execução =>	1,1277	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,40
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,92	0,92		
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>			
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 280,3347 Improdutiva 72,4669	280,3347			
							Custo Horário de Equipamentos =>	280,3347	
							Custo Horário de Execução =>	280,3347	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0173	
							Custo do FIC =>	0,0166	
							Produção de Equipe =>	310,7300	
							Custo Unitário de Execução =>	0,9022	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,12
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,75	0,75		
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>			
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 280,3347 Improdutiva 72,4669	280,3347			
							Custo Horário de Equipamentos =>	280,3347	
							Custo Horário de Execução =>	280,3347	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
							Custo do FIC =>	0,0000	
							Produção de Equipe =>	372,8800	
							Custo Unitário de Execução =>	0,7818	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,91
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
	5914364 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,95	0,95		
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>			
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 485,3033 Improdutiva 102,9318	485,3033			
							Custo Horário de Equipamentos =>	485,3033	
							Custo Horário de Execução =>	485,3033	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0173	
							Custo do FIC =>	0,0161	
							Produção de Equipe =>	519,4100	
							Custo Unitário de Execução =>	0,9343	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,15
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
	5914365 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,76	0,76		
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>			
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 485,3033 Improdutiva 102,9318	485,3033			
							Custo Horário de Equipamentos =>	485,3033	
							Custo Horário de Execução =>	485,3033	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0173	
							Custo do FIC =>	0,0129	
							Produção de Equipe =>	648,2700	
							Custo Unitário de Execução =>	0,7476	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,92
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
	5914366 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,82	0,82		
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>			
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 485,3033 Improdutiva 102,9318	485,3033			
							Custo Horário de Equipamentos =>	485,3033	
							Custo Horário de Execução =>	485,3033	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
							Custo do FIC =>	0,0000	
							Produção de Equipe =>	778,1200	
							Custo Unitário de Execução =>	0,8229	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,75



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Composições Principais		Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Tipo					
	6416078 SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico - faixas C - areia e brita comerciais			t	1,0000000	182,28	182,28
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>	
Insumo	E9559 SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00		Operativa 72,2775 Improdutiva 40,4991	72,2775	40,4991
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,80 0,20		203,2251 94,9844	181,5770	111,2128
Insumo	E9021 SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00 0,00		465,3101 23,5172	465,3101	111,2128
Insumo	E9558 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00 0,00		55,6064 37,9832	111,2128	1,104,6898
Insumo	E9669 SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000000	1,00 0,00		1.104,6898 584,5602	1.104,6898	1.835,0672
						<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>	<b>1.835,0672</b>	
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000			18,5777	74,3108	74,3108
						<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>	<b>74,3108</b>	
						<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>	<b>0,0000</b>	
						<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>2.009,3780</b>	
						<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>	
						<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>	
						<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>99,6000</b>	
						<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>20,1745</b>	
<b>C</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>		<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>	
Insumo	SICRO3 M0028	Areia média	0,3247500	m³		129,5501	42,0714	9,5207
Insumo	SICRO3 M0005	Brita 0	0,0624500	m³		152,4524	9,5207	9,2077
Insumo	SICRO3 M0191	Brita 1	0,0624500	m³		147,4407	9,2077	27,3020
Insumo	SICRO3 M0344	Cal hidratada - a granel	56,2000000	kg		0,4858	0,0000	0,0000
Insumo	SICRO3 M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0632300	t		0,0000	0,0000	8,3321
Insumo	SICRO3 M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l		6,3321	80,6568	20,7634
Insumo	SICRO3 M1103	Pedrisco	0,1373600	m³		151,1274	20,7634	189,5220
						<b>Custo Total do Material =&gt;</b>	<b>189,5220</b>	
<b>E</b>	<b>Banco Insumo</b>	<b>Tempos Fixos</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>	
Tempo Fixo	SICRO3 M0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,4871300	t	1,7400	0,8476	0,1630
Tempo Fixo	SICRO3 M0005	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,0936800	t	1,7400	0,1630	1,0504
Tempo Fixo	SICRO3 M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,0936800	t	1,7400	0,1630	1,0504
Tempo Fixo	SICRO3 M0344	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	5914363	0,0562000	t	18,8900	1,0504	0,3566
Tempo Fixo	SICRO3 M1103	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,2060900	t	1,7400	0,3566	2,5828
						<b>Custo Total dos Tempos Fixos =&gt;</b>	<b>2,5828</b>	
<b>F</b>	<b>Banco Insumo</b>	<b>Momento de Transporte</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Distância Média de Transporte (DMT)</b>	<b>Custo Horário</b>		
Momento de Transporte	SICRO3 M0028	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,4871300	tkm	LN 5914359 0,000 RP 5914374 0,000 P 5914389 0,000 R\$ 1,21 R\$ 0,97 R\$ 0,79	0,0000		
Momento de Transporte	SICRO3 M0005	Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,0936800	tkm	LN 5914359 0,000 RP 5914374 0,000 P 5914389 0,000 R\$ 1,21 R\$ 0,97 R\$ 0,79	0,0000		
Momento de Transporte	SICRO3 M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,0936800	tkm	LN 5914359 0,000 RP 5914374 0,000 P 5914389 0,000 R\$ 1,21 R\$ 0,97 R\$ 0,79	0,0000		
Momento de Transporte	SICRO3 M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	0,0562000	tkm	LN 5914364 0,000 RP 5914385 0,000 P 5914396 0,000 R\$ 0,96 R\$ 0,76 R\$ 0,62	0,0000		
Momento de Transporte	SICRO3 M1103	Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,2060900	tkm	LN 5914359 0,000 RP 5914374 0,000 P 5914389 0,000 R\$ 1,21 R\$ 0,97 R\$ 0,79	0,0000		
						<b>Custo total dos Momentos de Transportes =&gt;</b>	<b>0,0000</b>	
						MO sem LS => 0,75 LS => 0,00 MO com LS => 0,75		
						Valor do BDI => 40,10 Valor com BDI => 222,38		

*[Handwritten Signature]*  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CRM 1916129255

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 4.045,00 m



COMPOSIÇÕES DO SICRO PI - OUTUBRO/2022



**CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT**

**Piauí - Outubro/2022  
Sem desoneração**

Código	Descrição	Unidade	Salário (R\$)	Encargos Totais	Custo (R\$)	Periculosidade/ Insalubridade
P9801	Ajudante	h	6,2398	210,0817%	19,3484	0,0000%
P9802	Ajudante especializado	h	7,4876	205,1669%	22,8496	0,0000%
P9803	Almoxarife	mês	2.499,2000	120,4768%	5.510,1561	0,0000%
P9804	Apontador	mês	1.792,5882	139,2001%	4.287,8727	0,0000%
P9805	Armador	h	10,2500	170,8207%	27,7591	0,0000%
P9806	Auxiliar administrativo	mês	1.790,8000	138,3709%	4.268,7460	0,0000%
P9807	Bombeiro hidráulico	h	10,2737	179,7163%	28,7372	0,0000%
P9808	Carpinteiro	h	8,1400	187,3973%	23,3941	0,0000%
P9809	Encarregado administrativo	mês	3.654,5529	103,2656%	7.428,4488	0,0000%
P9810	Eletricista	h	8,7550	188,7803%	25,2827	0,0000%
P9811	Encarregado especializado	mês	3.623,6908	106,8105%	7.494,1730	0,0000%
P9812	Engenheiro	mês	12.265,1972	82,5193%	22.386,3520	0,0000%
P9814	Operacional	mês	1.380,3877	151,1345%	3.466,6297	0,0000%
P9815	Jardineiro	h	7,7500	191,0522%	22,5565	0,0000%
P9819	Engenheiro supervisor	mês	12.265,1972	82,5193%	22.386,3520	0,0000%
P9821	Pedreiro	h	8,1400	186,7175%	23,3388	0,0000%
P9822	Pintor	h	10,2500	172,2226%	27,9028	0,0000%
P9823	Serralheiro	h	9,3101	177,4901%	25,8346	0,0000%
P9824	Servente	h	5,8800	215,9478%	18,5777	0,0000%
P9825	Soldador	h	12,3692	161,2079%	32,3093	0,0000%
P9826	Chefe setor de finanças	mês	8.522,8586	86,2923%	15.877,4293	0,0000%
P9827	Vigia	mês	1.412,4000	178,1183%	4.351,8628	30,0000%
P9830	Montador	h	10,2500	179,8572%	28,6853	0,0000%
P9833	Auxiliar de laboratório	mês	2.255,0000	124,8622%	5.070,6426	0,0000%
P9835	Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade	h	6,2419	270,4543%	25,3267	35,3000%
P9836	Geólogo	h	54,7572	118,4471%	119,6155	0,0000%
P9837	Oceanógrafo	mês	4.260,0236	100,1189%	8.525,1123	0,0000%
P9840	Encarregado geral	mês	5.733,3173	91,9271%	11.003,7896	0,0000%
P9842	Faxineiro	mês	1.377,2000	157,9796%	3.552,8950	0,0000%
P9843	Operador de equipamento leve	h	8,1400	184,7278%	23,1768	0,0000%
P9844	Capitão fluvial	mês	5.510,3395	94,0552%	10.693,1003	0,0000%
P9845	Operador de equipamento pesado	h	10,8718	165,7539%	28,8922	0,0000%
P9846	Operador de equipamento especial	h	15,0265	148,7863%	37,3838	0,0000%
P9847	Perfurador de tubulão	h	6,2419	209,2832%	19,3051	0,0000%
P9848	Desenhista	mês	2.689,3012	113,5838%	5.743,9118	0,0000%
P9849	Condutor maquinista fluvial	mês	2.002,3600	127,1847%	4.549,0555	0,0000%
P9850	Copeiro	mês	1.500,4496	147,7386%	3.717,1928	0,0000%
P9851	Médico do trabalho	mês	9.971,0632	84,0223%	18.348,9798	0,0000%
P9852	Blafter	h	9,4200	211,6347%	32,1819	30,0000%
P9853	Pré-marcador	h	6,2397	206,3132%	19,1130	0,0000%
P9854	Recepcionista	mês	1.632,3275	138,3539%	3.890,7162	0,0000%
P9855	Marinheiro de máquinas	mês	1.924,0816	129,0854%	4.407,7900	0,0000%
P9856	Marinheiro de convés	h	8,5644	174,9529%	23,5480	0,0000%
P9857	Marinheiro de convés - mensalista	mês	1.884,1601	130,1698%	4.336,7675	0,0000%
P9858	Laboratorista	mês	3.093,2000	111,8275%	6.552,2482	0,0000%
P9859	Trabalhador de via	h	5,6274	222,3376%	18,1392	0,0000%
P9861	Selecionador de material pétreo	h	6,2397	207,7025%	19,1997	0,0000%
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	10.692,8384	84,4192%	19.719,6470	0,0000%
P9865	Técnico em enfermagem	mês	2.733,4466	117,8675%	5.955,2917	0,0000%
P9866	Motorista de caminhão	h	8,9374	175,5298%	24,6252	0,0000%
P9867	Técnico especializado - mensalista	mês	3.072,2303	112,3527%	6.523,9639	0,0000%
P9869	Encarregado de obras de artes especiais	mês	3.623,6908	106,8105%	7.494,1730	0,0000%
P9870	Motorista de veículo leve	h	10,2500	166,8782%	27,3550	0,0000%
P9871	Motorista de veículo especial	h	10,5824	165,2377%	28,0685	0,0000%
P9875	Encarregado de turma	mês	2.261,0315	125,3911%	5.096,1637	0,0000%
P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	3.093,2000	111,8096%	6.551,6945	0,0000%
P9878	Secretária	mês	2.523,7554	116,4713%	5.463,2061	0,0000%
P9880	Piloto fluvial	mês	3.055,9900	108,9493%	6.385,4697	0,0000%
P9882	Técnico especializado	h	13,9647	153,2049%	35,3593	0,0000%
P9883	Chefe do setor administrativo	mês	3.655,7355	103,2566%	7.430,5236	0,0000%
P9884	Encarregado de terraplenagem	mês	3.623,6908	106,8105%	7.494,1730	0,0000%
P9885	Frentista de túnel	h	6,2397	216,3521%	19,7394	0,0000%
P9889	Técnico da qualidade	mês	3.329,1079	110,0097%	6.991,4495	0,0000%
P9891	Engenheiro mecânico	mês	12.316,2919	82,9584%	22.533,6905	0,0000%
P9892	Auxiliar de blaster	h	7,8908	224,9982%	28,0121	30,0000%
P9893	Encarregado de pavimentação	mês	3.623,6908	106,8105%	7.494,1730	0,0000%
P9896	Porteiro	mês	1.426,7126	154,0710%	3.624,8629	0,0000%
P9897	Técnico de meio ambiente	mês	3.288,4467	109,8234%	6.899,9306	0,0000%
P9900	Comprador	mês	3.090,5635	111,6682%	6.541,7401	0,0000%
P9901	Encarregado de superestrutura ferroviária	mês	3.623,6908	106,8105%	7.494,1730	0,0000%

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
"Dan" Civil / CREB: 2916129235

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

LOCAL: PEDRO II - PI

EXTENSÃO: 4.045,00 m



COMPOSIÇÕES DO SICRO PI - OUTUBRO/2022



P9903	Auxiliar técnico	mês	1.688,4663	140,6305%	4.062,9649	0,0000%
P9907	Comandante de longo curso	mês	13.103,1175	83,3089%	24.019,1805	0,0000%
P9908	Imediato	mês	8.649,5299	87,3245%	16.202,6886	0,0000%
P9909	Oficial de náutica	mês	2.242,6606	121,9433%	4.977,8788	0,0000%
P9910	Oficial de máquinas	mês	2.850,3039	111,8170%	6.037,4282	0,0000%
P9911	Condutor de máquinas	mês	2.002,3600	127,1847%	4.549,0555	0,0000%
P9912	Capitão fluvial com periculosidade	h	25,0470	164,6422%	73,7990	30,0000%
P9913	Draguista	mês	3.595,3388	103,9329%	7.332,0786	0,0000%
P9915	Maquinista	h	11,4458	164,2518%	30,2457	0,0000%
P9916	Encarregado de conservação rodoviária	mês	3.623,6908	106,8105%	7.494,1730	0,0000%
P9920	Mestre fluvial	mês	5.510,3395	94,0552%	10.693,1003	0,0000%
P9921	Mergulhador raso autônomo de emergência	h	8,7236	252,4125%	32,9466	25,2600%
P9922	Mergulhador raso dependente de emergência	h	8,8446	260,9427%	34,5773	30,0000%
P9924	Mergulhador raso dependente	h	8,8446	412,2974%	47,9640	30,0000%
P9925	Mergulhador raso autônomo	h	8,7236	371,2362%	43,3123	25,2600%
P9926	Mergulhador raso auxiliar de superfície	h	8,7236	226,3238%	30,6707	25,2600%
P9927	Frentista de túnel com periculosidade	h	6,2397	249,1899%	23,6603	30,0000%
P9928	Servente com periculosidade	h	5,8800	248,7858%	22,2726	30,0000%
P9929	Bombeiro hidráulico com periculosidade	h	10,2737	212,5332%	35,1908	30,0000%
P9930	Eletricista com periculosidade	h	8,7550	221,5763%	30,7805	30,0000%
P9931	Operador de equipamento de mergulho	h	14,3182	187,3310%	43,3441	15,3900%
P9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h	10,8718	198,5645%	35,7208	30,0000%
P9933	Supervisor de mergulho raso	mês	3.150,0000	138,0974%	7.984,8531	15,3900%
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	h	10,5824	198,0335%	34,7138	30,0000%
P9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h	8,1400	217,5388%	28,2896	30,0000%
P9939	Operador de equipamento leve com insalubridade	h	8,1400	235,5947%	29,5209	27,0700%
P9940	Piloto fluvial com periculosidade	h	13,8909	182,5980%	43,4226	30,0000%
P9941	Mestre fluvial com periculosidade	h	25,0470	164,6422%	73,7990	30,0000%
P9942	Marinheiro de convés com periculosidade	h	8,5644	207,8146%	28,9317	30,0000%
P9943	Técnico de batimetria com periculosidade	h	10,7009	194,7463%	34,7507	30,0000%
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	15,0265	181,5977%	46,8222	30,0000%
P9945	Draguista com periculosidade	h	16,3424	176,5504%	50,0976	30,0000%
P9946	Engenheiro auxiliar	mês	10.366,9925	83,7862%	19.053,1015	0,0000%
P9947	Técnico florestal	mês	3.288,4467	109,8234%	6.899,9306	0,0000%
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	2.255,0000	123,6375%	5.043,0256	0,0000%
P9949	Topógrafo	mês	3.825,8000	105,8385%	7.874,9693	0,0000%
P9950	Auxiliar de topografia	mês	2.255,0000	126,2057%	5.100,9385	0,0000%
P9951	Médico de câmara hiperbárica	mês	9.971,0632	102,6974%	20.695,6795	4,8600%
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	1.790,8000	140,5812%	4.308,3281	0,0000%
P9953	Eletricista - mensalista	mês	1.926,0979	142,0324%	4.661,7809	0,0000%
P9954	Servente - mensalista	mês	1.293,6000	165,0316%	3.428,4487	0,0000%
P9955	Engenheiro chefe	mês	16.382,3083	80,7804%	29.616,0024	0,0000%
P9956	Motorista de caminhão com periculosidade	h	8,9374	208,3255%	30,2375	30,0000%
P9972	Técnico de batimetria	mês	2.354,2056	119,3304%	5.163,4885	0,0000%

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA 1916129255





Piauí - Outubro/2022  
Sem desoneração


Item	Profissão	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,80%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,64%	5,16%	6,48%	0,93%	0,04%	0,08%	9,25%	0,74%	0,13%	-	4,27%	0,11%	5,86%	4,53%	0,93%	15,41%	0,38%	110,13%
P9947	Técnico florestal	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,80%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,64%	5,16%	6,48%	0,93%	0,04%	0,08%	9,25%	0,74%	0,13%	-	4,27%	0,11%	5,86%	4,53%	0,93%	15,41%	0,38%	110,13%
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,80%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	7,80%	0,91%	0,04%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,45%	0,09%	4,72%	3,80%	0,93%	6,87%	0,31%	75,69%
P9949	Topógrafo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,80%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	6,37%	0,91%	0,04%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,34%	0,11%	5,95%	3,76%	0,93%	6,42%	0,39%	76,21%
P9950	Auxiliar de topografia	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,80%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	6,37%	0,91%	0,04%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,34%	0,11%	5,95%	3,76%	0,93%	6,42%	0,39%	76,21%
P9951	Médico de câmara hiperbárica	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,80%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	-	-	7,99%	0,93%	0,04%	0,03%	9,24%	0,74%	0,06%	-	3,16%	0,08%	4,33%	3,81%	0,93%	9,37%	0,29%	90,22%
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,80%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	6,37%	0,97%	0,04%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,35%	0,11%	5,96%	3,76%	0,93%	6,42%	0,39%	76,17%
P9953	Eletricista - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,80%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	7,12%	0,97%	0,04%	0,10%	9,25%	0,74%	0,00%	-	3,80%	0,10%	5,21%	3,78%	0,93%	6,71%	0,34%	75,89%
P9954	Servente - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,80%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	6,34%	0,97%	0,04%	0,10%	9,25%	0,74%	0,01%	-	4,37%	0,11%	5,98%	3,76%	0,93%	6,42%	0,39%	76,21%
P9955	Engenheiro chefe	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,80%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	8,45%	0,91%	0,04%	0,08%	9,24%	0,74%	0,04%	-	3,06%	0,07%	3,87%	3,82%	0,93%	7,20%	0,27%	75,64%
P9956	Motorista de caminhão com periculosidade	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,80%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	6,88%	0,97%	0,04%	0,09%	9,24%	0,74%	-	-	3,98%	0,10%	5,45%	3,77%	0,93%	6,61%	0,36%	75,96%
P9972	Técnico de batimetria	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,80%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,24%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	-	-	3,22%	0,08%	4,06%	3,81%	0,93%	7,12%	0,29%	75,84%

Legenda:

Classificação	Parcela	Descrição
	A1	Previdência Social
	A2	FGTS
	A3	Salário Educação
	A4	SESC ou SESI
	A5	SENAI / SEBRAE
	A6	INCRA
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
	A8	SECONCI
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
	B1	Reposuso Semanal Remunerado - Domingos
	B2	Ferriados
	B3	Férias Gozadas + 1/3
	B4	Auxílio Enfermidade
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho
	B6	Licença Paternidade
	B7	13º Salário
	B8	Faltas Justificadas
	B9	Férias sobre Licença Maternidade
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	B10	Reciclagem Tecnológica
	C1	Aviso Prévio Indenizado
	C2	Aviso Prévio Trabalhado
	C3	Féria Indenizadas + 1/3
	C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)	C5	Indenização Adicional
	D1	Reincidência de A sobre B
Grupo D - Reincidências (%)	D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

- Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
- Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais flutuações no número de amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

  
 Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / Matr.: 1916129285





SECRETARIA  
DO **TURISMO** - SETUR



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SETUR  
AV. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções,  
Bairro Cabral  
CEP 64002-830 – Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br



## 9.0 – Relatório Fotográfico

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>o</sup> Civil / CREA: 1916129255

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (C.B.U.Q.), REFERENTE A DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE PEDRO II - PI.

### 01 - Nome da Rua: Joaquim Leite



Foto 01/01


  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>o</sup> Civil / CREA: 19161707



Foto 02/01

02 - Nome da Rua: João Benício da Silva

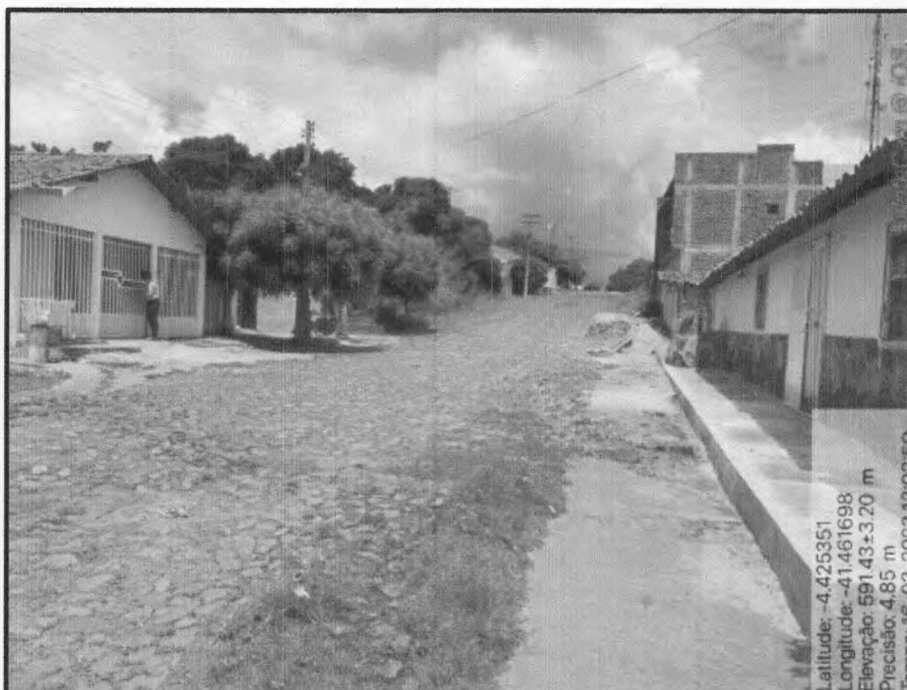


Foto 01/02

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng. Civil / CREA: 191612927

Secretaria de Estado do Turismo – SETUR  
Av. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções, Bairro Cabral  
CEP 64002-830 – Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone (s): (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br




Foto 02/02

### 03 - Nome da Rua: Joao Benicio da Silva



Foto 01/03

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng. Civil - R. 16128

Secretaria de Estado do Turismo – SETUR  
CEP 64002-830 – Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone (s): (86) 3216-2664  
[www.turismo.pi.gov.br](http://www.turismo.pi.gov.br)

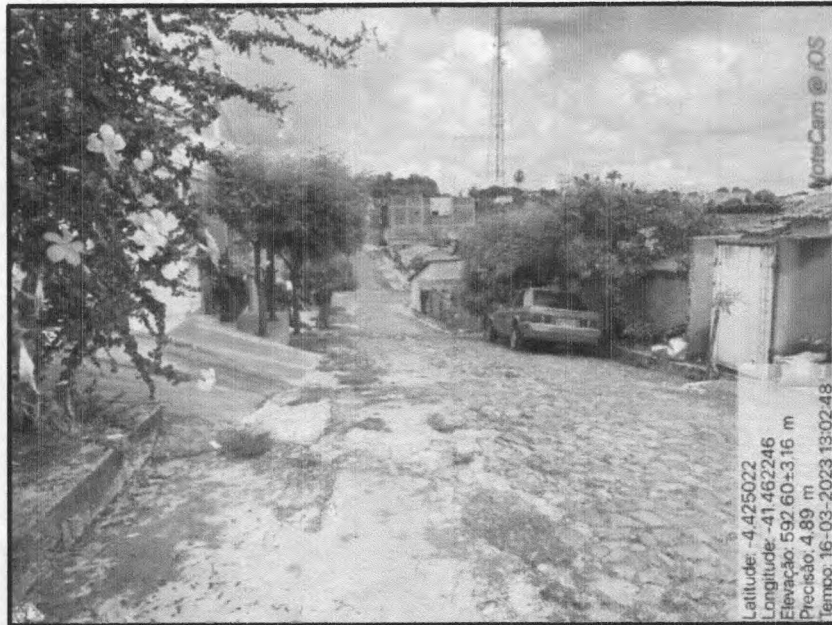


Foto 02/03

### 04 - Nome da Rua: Texeira Santos

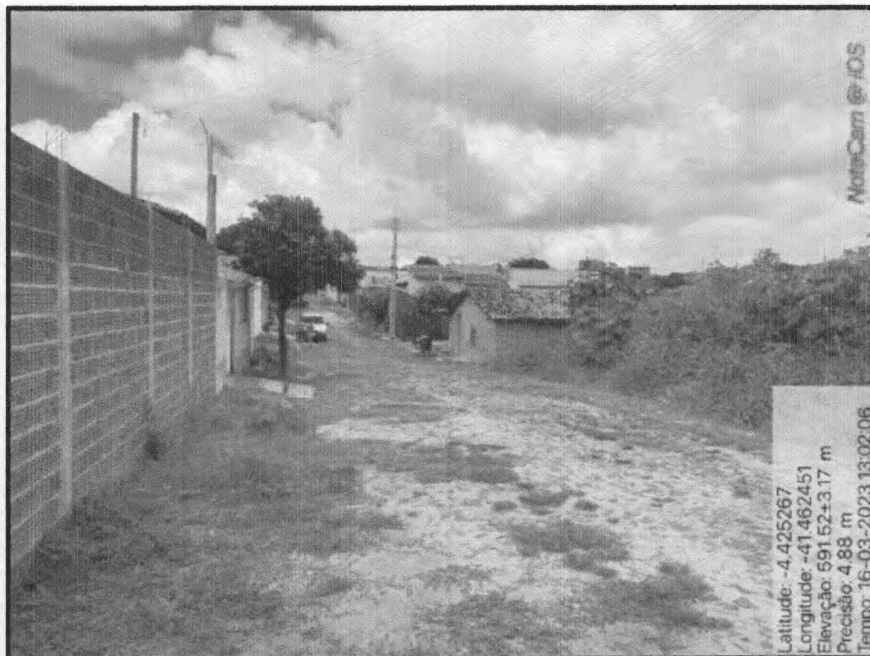



Foto 01/04

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>o</sup> Civil / CREA: 19161297-3

Secretaria de Estado do Turismo – SETUR  
Av. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções, Bairro Cabral  
CEP 64002-830 – Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone (s): (86) 3216-2664  
[www.turismo.pi.gov.br](http://www.turismo.pi.gov.br)




Foto 02/04

**05 - Nome da Rua: Antônio Benício da Silva**



Foto 01/05

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>o</sup> Civil / CREA: 191612928<sup>5</sup>

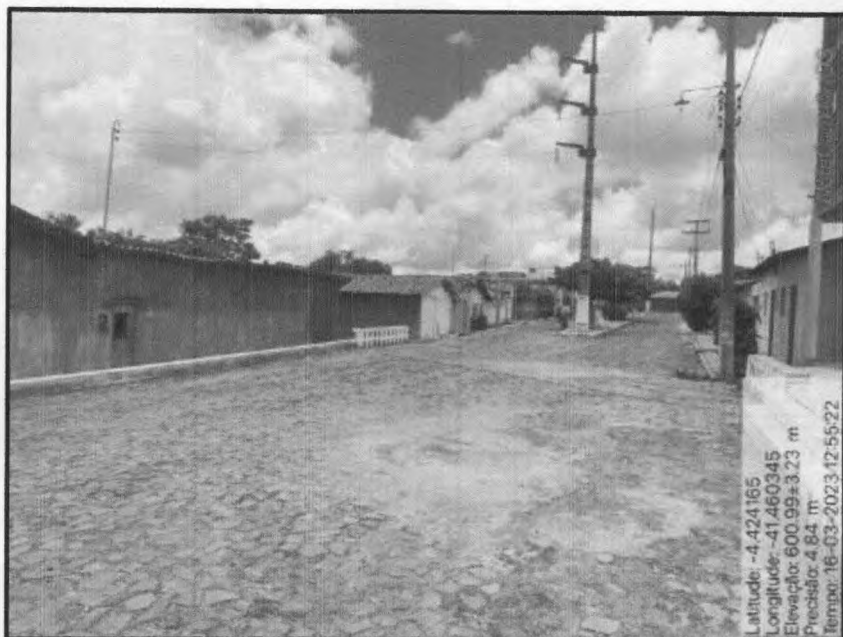

Latitude: -4.424165  
Longitude: -41.460345  
Elevação: 600.99±3.23 m  
Precisão: 4.84 m  
Tempo: 16-03-2023 12:55:22


Foto 02/05

### 06 - Nome da Rua: Antônio Benício da Silva



Latitude: -4.424214  
Longitude: -41.460245  
Elevação: 600.59±6.94 m  
Precisão: 5.11 m  
Tempo: 16-03-2023 15:12:58

Foto 01/06

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eno<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129285

Secretaria de Estado do Turismo – SETUR  
Av. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções, Bairro Cabral  
CEP 64002-830 – Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone (s): (86) 3216-2664  
[www.turismo.pi.gov.br](http://www.turismo.pi.gov.br)



Latitude: -4.424594  
Longitude: -41.459659  
Elevação: 602.55-7.57 m  
Precisão: 700 m  
Tempo: 16-03-2023 12:52:58

Foto 02/06

### 07 - Nome da Rua: Monsenhor Uchoa



Tempo: 07-02-2023 12:04  
Nota: rua monsenhor Uchoa final Pedro2

Powered by NoteCam

Foto 01/07

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
OAB Civil / CREA 1916129285



## 08 - Nome da Rua: Thomas Café

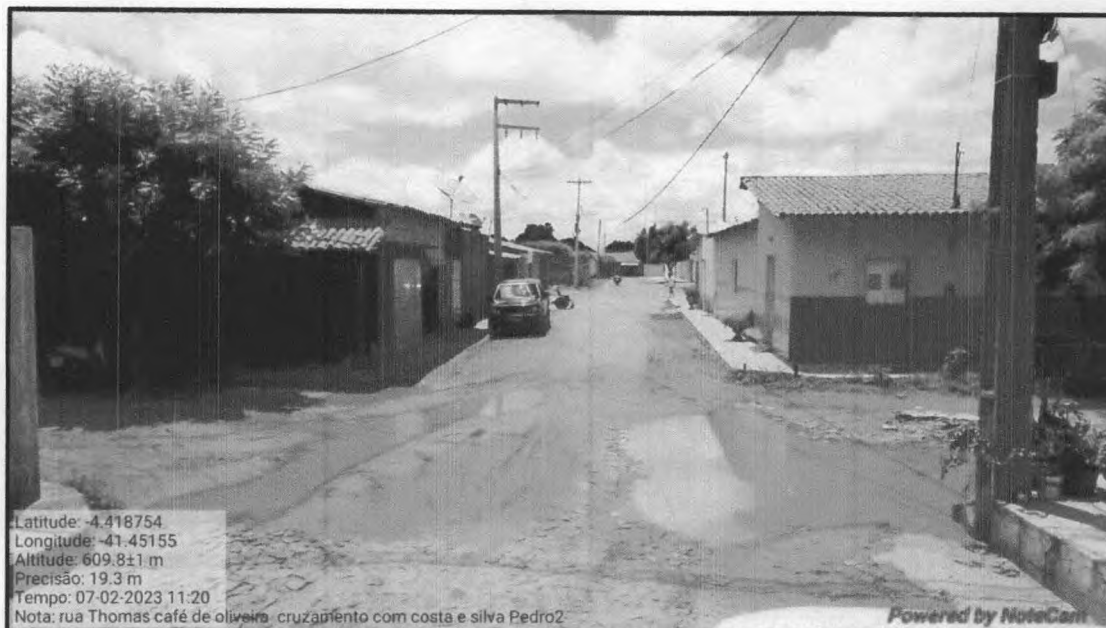


Foto 01/08



Foto 02/08

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
OAB Civil / CREM: 1916129285


## 09 - Nome da Rua: Candido Pereira



Foto 01/09



Foto 02/09

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eno Civil / CRA: 1916129255


SECRETARIA  
DO TURISMO - SETUR




ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR  
AV. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções,  
Bairro Cabral  
CEP 64002-830 - Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br



## 10.0 – Modelo Placa da Obra

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil CREA: 1916129285

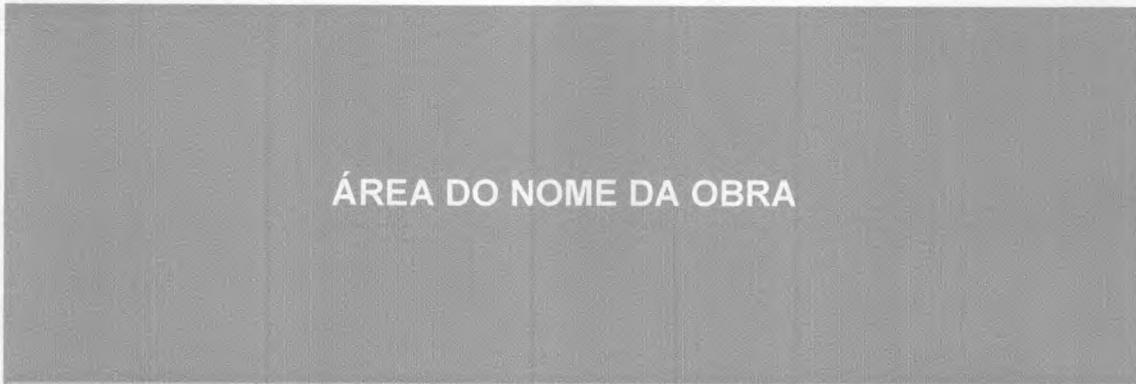

### ÁREA DO NOME DA OBRA

0,80 m

Valor total da obra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes participantes:

2,00m

Endereço: xxxxxxxxxxxx

Início da obra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Município: xxxxxxxx

Término da obra: xxxxxxxxxxxx

0,60 m

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx



0,60 m

3,00 m

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil - REA: 1916129133

SECRETARIA  
DO TURISMO - SETUR



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SETUR  
AV. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções,  
Bairro Cabral  
CEP 64002-830 – Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br




## 11.0 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil CREA 191612



## 11.0 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

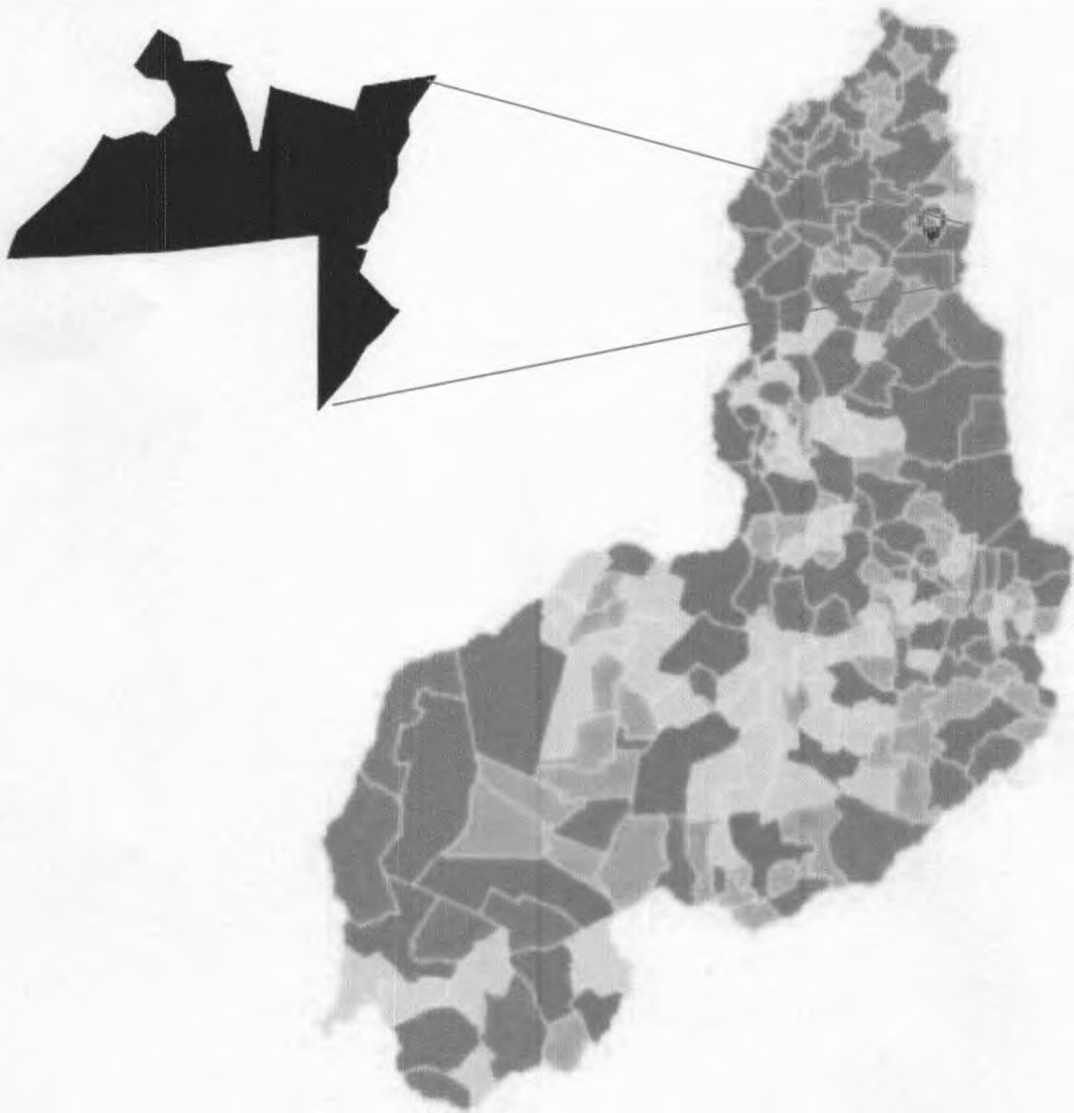

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil CREA: 19161291-1


SECRETARIA  
DO TURISMO - SETUR





ESTADO DO PIAUI  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR  
AV. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções,  
Bairro Cabral  
CEP 64002-830 - Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br



## 12.0 – Plantas




  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 191612923-3

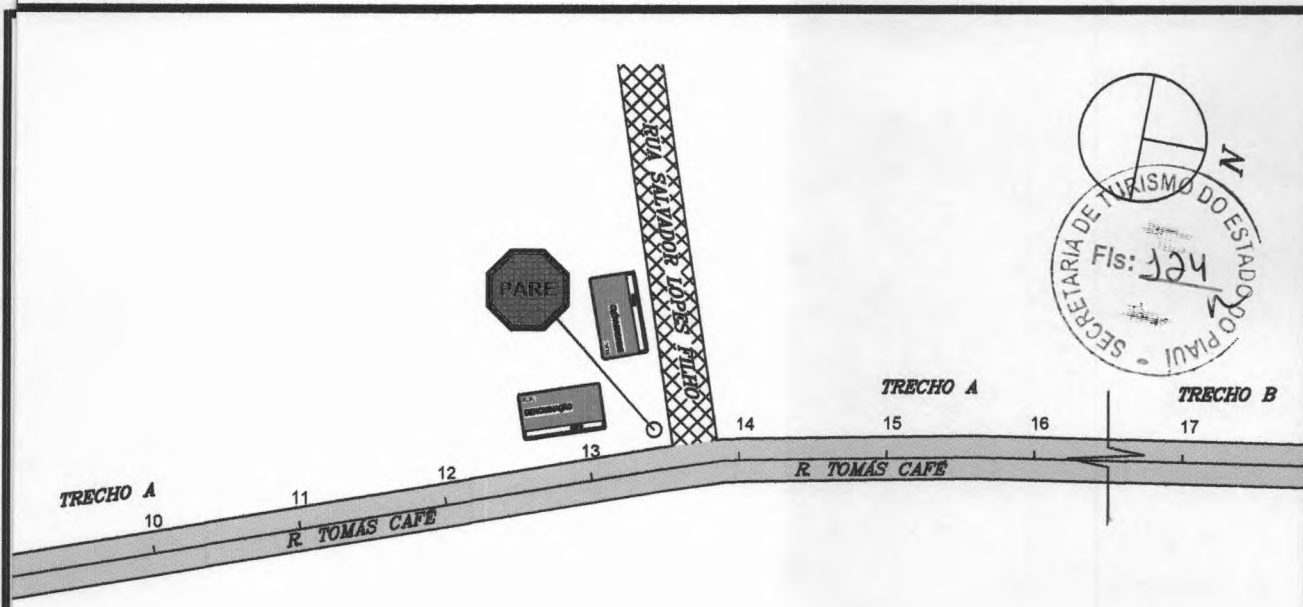

<p><b>NOTAS</b></p> <p>1. EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS À PROJETISTA</p> <p>2. TODAS AS MEDIDAS EM METROS</p>	<p><b>ESTADO DO PIAUI</b> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR</p>	
	<p><b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)</p> <p><b>NOME:</b> R. TOMÁS CAFÉ - TRECHO A</p> <p><b>TRECHO:</b> Est. 0+0,00 / 42,00+12,00m</p> <p><b>MUNICÍPIO/LOCAL:</b> PEDRO II - ZONA URBANA</p> <p><b>EXTENSÃO:</b> 852,000m</p> <p style="text-align: right;"><b>LARGURA DO PAVIMENTO:</b> 5,90m</p>	
	<p><b>DATA:</b> 04/2023</p>	<p><b>VISTO:</b></p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
		<p><b>FLS:</b> 01/03</p>

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129283



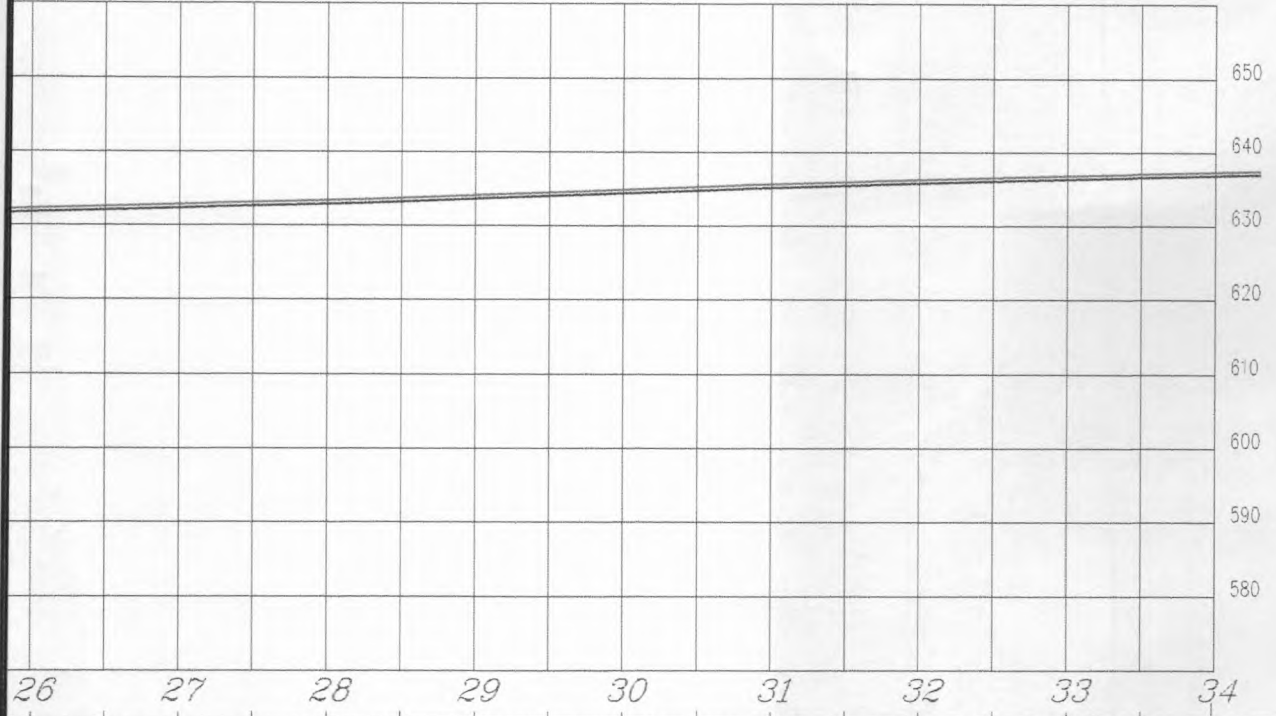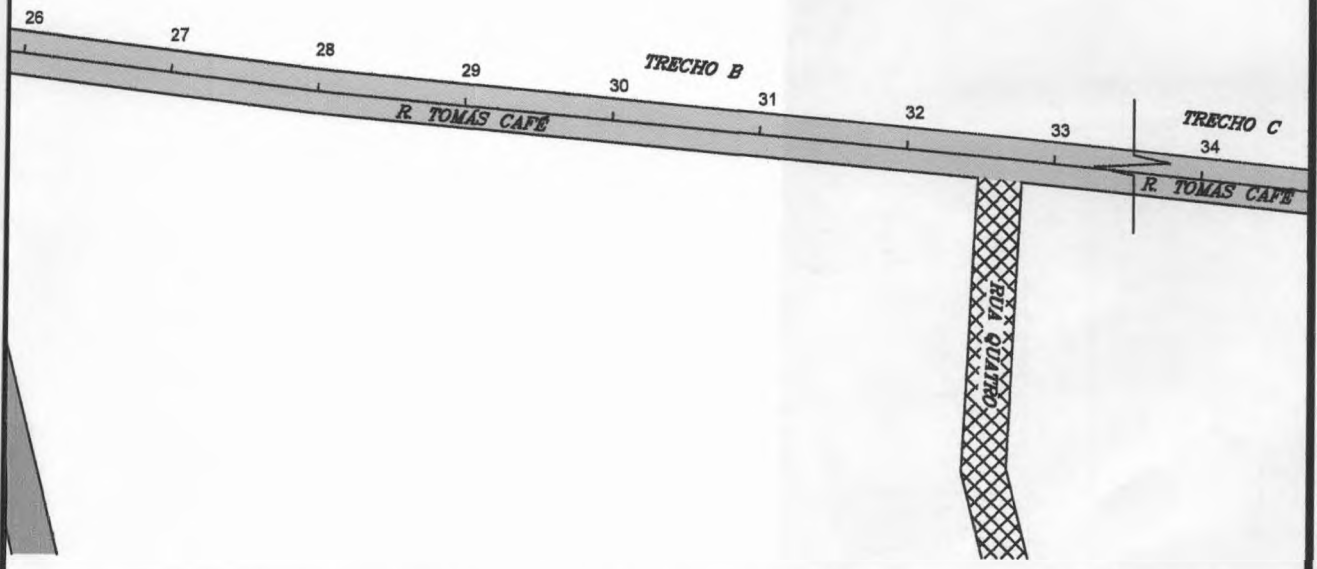




<p><b>NOTAS</b></p> <p>1. EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS A PROJETISTA</p> <p>2. TODAS AS MEDIDAS EM METROS</p>	<p><b>ESTADO DO PIAUÍ</b> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR</p>	
	<p><b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)</p> <p><b>NOME:</b> R. TOMÁS CAFÉ - TRECHO B</p> <p><b>TRECHO:</b> Est. 0+0,00 / 42,00+12,00m</p> <p><b>MUNICÍPIO/LOCAL:</b> PEDRO II - ZONA URBANA</p> <p><b>EXTENSÃO:</b> 862,000m</p>	<p><b>LARGURA DO PAVIMENTO:</b> 5,90m</p>
<p><b>DATA:</b> 04/2023</p>	<p><b>VISTO:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p><b>FLS:</b> 02/03</p>

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129285




DO TRECHO  
: -4.412417°  
IG: -41.452665°  
-----




<b>NOTAS</b>  1. EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS À PROJETISTA  2. TODAS AS MEDIDAS EM METROS	<b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR</b>	
	<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) <b>NOME:</b> R. TOMÁS CAFÉ - TRECHO C <b>TRECHO:</b> Est. 0+0,00 / 42,00+12,00m <b>MUNICÍPIO/LOCAL:</b> PEDRO II - ZONA URBANA <b>EXTENSÃO:</b> 852,000m	
	<b>DATA:</b> 04/2023	<b>VISTO:</b> 
		<b>LARGURA DO PAVIMENTO:</b> 5,90m <b>FLS:</b> 03/03

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129285



RUA JOÃO BENICIO DA SILVA


FIM DO TRECHO  
LAT: -4.425273°  
LONG: -41.461709°




<b>NOTAS</b>	<b>ESTADO DO PIAUI</b>	
	<b>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR</b>	
EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS À PROJETISTA  TODAS AS MEDIDAS EM METROS	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)
	<b>NOME:</b>	RUA JOAQUIM LEITE
	<b>TRECHO:</b>	Est. 0,00 / 8,00 + 14,00m
	<b>MUNICÍPIO/LOCAL:</b>	PEDRO II - ZONA URBANA
	<b>EXTENSÃO:</b>	174m
		<b>LARGURA DO PAVIMENTO:</b> 9,30m
	<b>DATA:</b> 03/2023	<b>VISTO:</b> 
		<b>FLS:</b> 01/02

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129285

CHO  
25676°  
61072°  
-----




JOÃO BENÍCIO DA SILVA



**NOTAS**

EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS À PROJETISTA



TODAS AS MEDIDAS EM METROS

<b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR</b>	
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)
<b>NOME:</b>	R. JOÃO BENÍCIO DA SILVA
<b>TRECHO:</b>	Est. 0+0,00 / 7,00+6,00m
<b>MUNICÍPIO/LOCAL:</b>	PEDRO II - ZONA URBANA
<b>EXTENSÃO:</b>	146,000m
<b>LARGURA DO PAVIMENTO: 6,8m-10,13m</b>	
<b>DATA:</b> 04/2023	<b>VISTO:</b> 
<b>FLS: 01/01</b>	

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129285




RECHO  
 4.423717°  
 .461522°

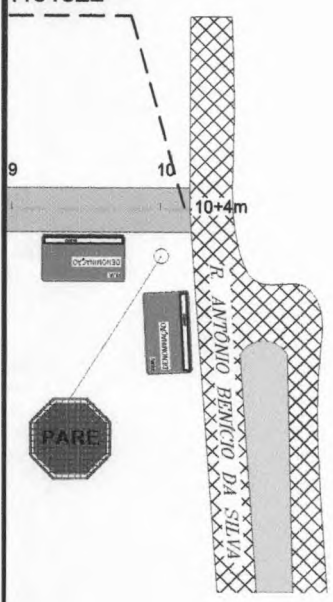



NOTAS	ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR	
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NOME: R. TEIXEIRA SANTOS TRECHO: Est. 0+0,00 / 10,00+4,00m MUNICÍPIO/LOCAL: PEDRO II - ZONA URBANA EXTENSÃO: 204,00 m	LARGURA DO PAVIMENTO: 6,00m
EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS CONTRADIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS À PROJETA TODAS AS MEDIDAS EM METROS	DATA: 03/2023	VISTO: FLS: 01/01

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129283

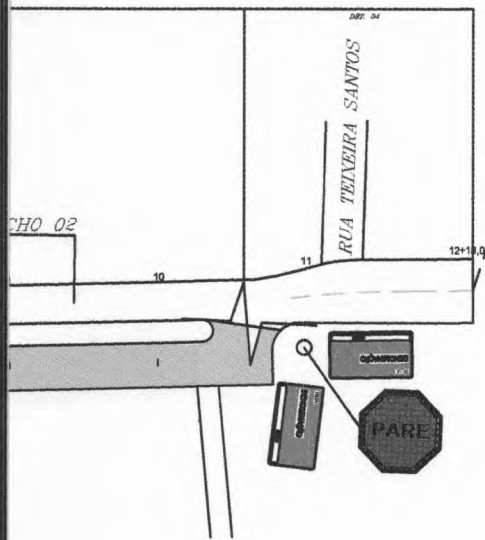


FIM DO TRECHO  
 LAT: -4.423593°  
 LONG: -41.461719°





<b>NOTAS</b>  EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS À PROJETISTA  TODAS AS MEDIDAS EM METROS	<b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR</b>	
	<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) <b>NOME:</b> RUA ANTONIO BENICIO DA SILVA <b>TRECHO:</b> Est. 0+0,00 / 12+18,00m <b>MUNICÍPIO/LOCAL:</b> PEDRO II - ZONA URBANA <b>EXTENSÃO:</b> 268,00 m	<b>ÁREA DO PAVIMENTO:</b> 1.823,94m <sup>2</sup>
<b>DATA:</b> 03/2023	<b>VISTO:</b> 	<b>FLS:</b> 01/02


Eng<sup>a</sup> Civil | CREA: 1916129285

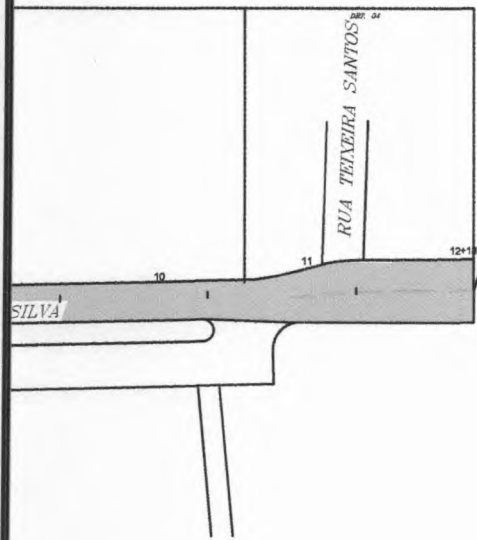


FIM DO TRECHO  
LAT: -4.423593°  
LONG: -41.461719°



<b>NOTAS</b>	<b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR</b>	
	<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) <b>NOME:</b> RUA ANTONIO BENICIO DA SILVA <b>TRECHO:</b> Est. 0+0,00 / 12+18,00m <b>MUNICÍPIO/LOCAL:</b> PEDRO II - ZONA URBANA <b>EXTENSÃO:</b> 258,00 m	<b>ÁREA DO PAVIMENTO:</b> 697,70m <sup>2</sup>
EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS À PROJETISTA.  TODAS AS MEDIDAS EM METROS	<b>DATA:</b> 03/2023	<b>VISTO:</b>   Yanna Carolina Rodrigues da Silva Eng <sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129285

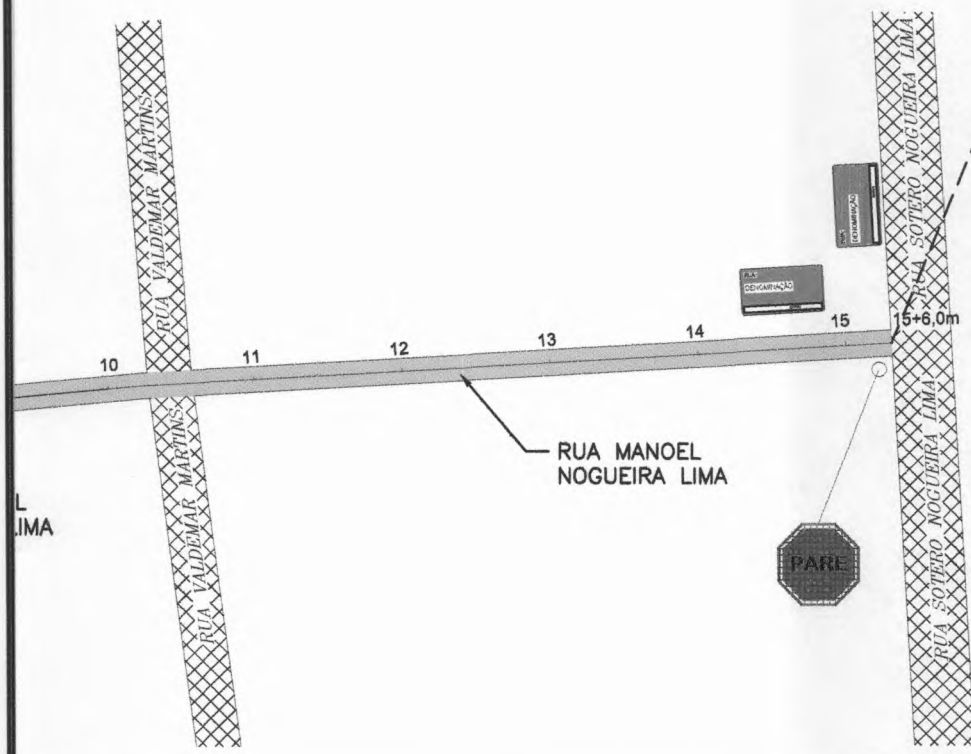


FIM DO TRECHO  
 LAT: -4.429560°  
 LONG: -41.458508°

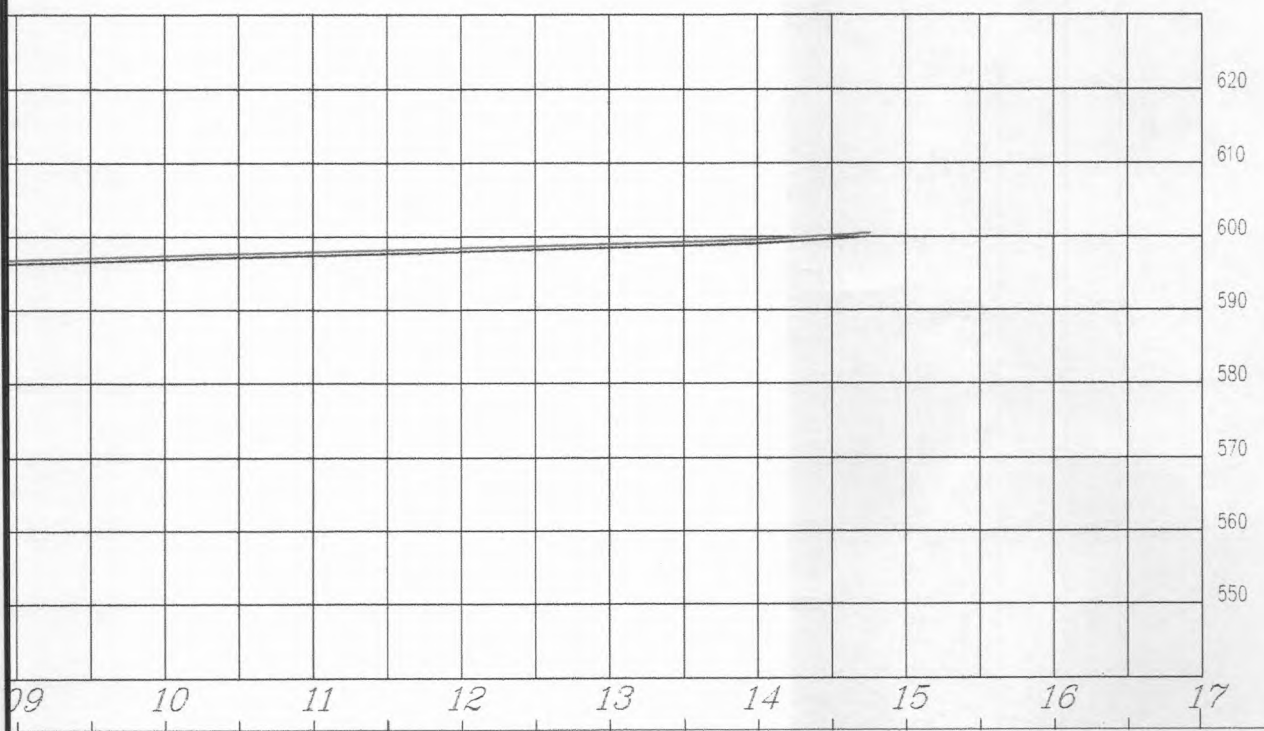


NOTAS  EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS À PROJETISTA  TODAS AS MEDIDAS EM METROS	ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR	
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NOME: RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA TRECHO: Est. 0+0,00 / 15,00+6,00m MUNICÍPIO/LOCAL: PEDRO II - ZONA URBANA EXTENSÃO: 308,00 m	LARGURA DO PAVIMENTO: 3,55m
DATA: 03/2023	VISTO:	FLS: 01/01


Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129285








INICIO DO TRECHO  
 LAT: -4.431954°  
 LONG: -41.459719°




<p><b>NOTAS</b></p> <p>EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS À PROJETA</p> <p>TODAS AS MEDIDAS EM METROS</p>	<p><b>ESTADO DO PIAUÍ</b>                  SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR</p>	
	<p><b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)</p> <p><b>NOME:</b> RUA CÂNDIDO PEREIRA</p> <p><b>TRECHO:</b> Est. 0+0,00 / 12+17,00m</p> <p><b>MUNICÍPIO/LOCAL:</b> PEDRO II - ZONA URBANA</p> <p><b>EXTENSÃO:</b> 257,00 m</p>	<p><b>LARGURA DO PAVIMENTO:</b> 6,40m</p>
<p><b>DATA:</b> 09/2023</p>	<p><b>VISTO:</b></p> 	<p><b>FLS:</b> 01/01</p>

Tainá Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREA: 1916129235

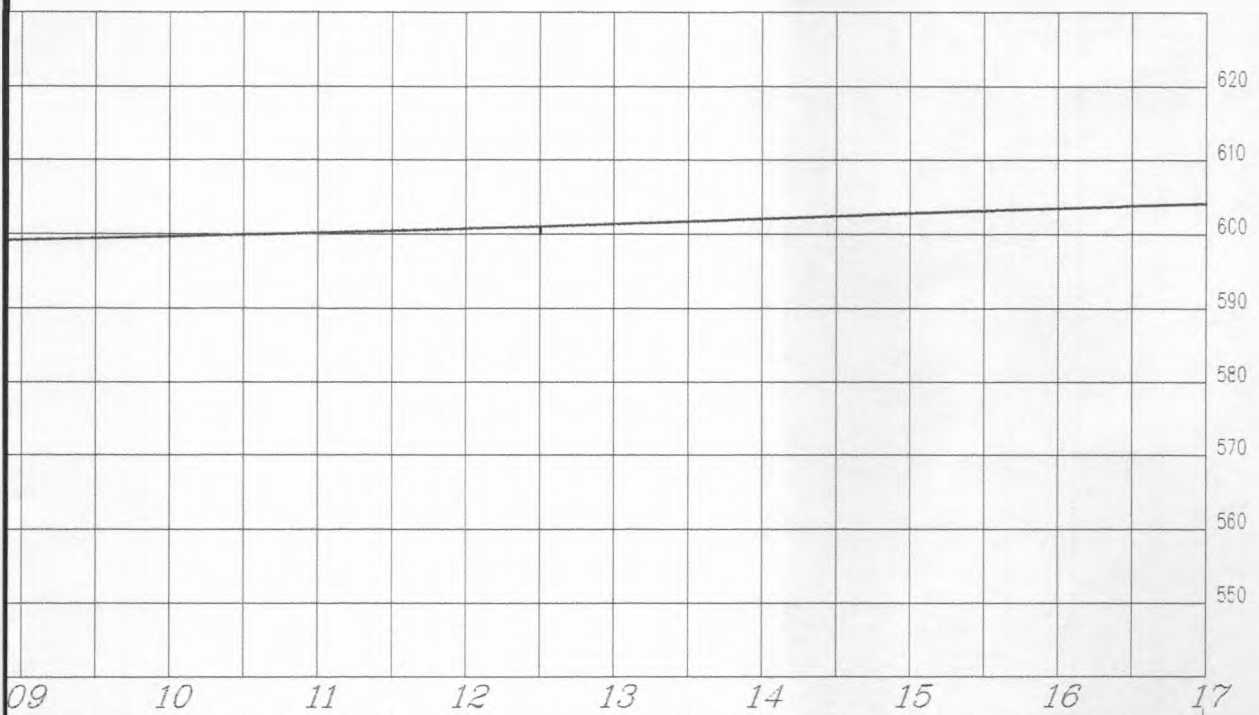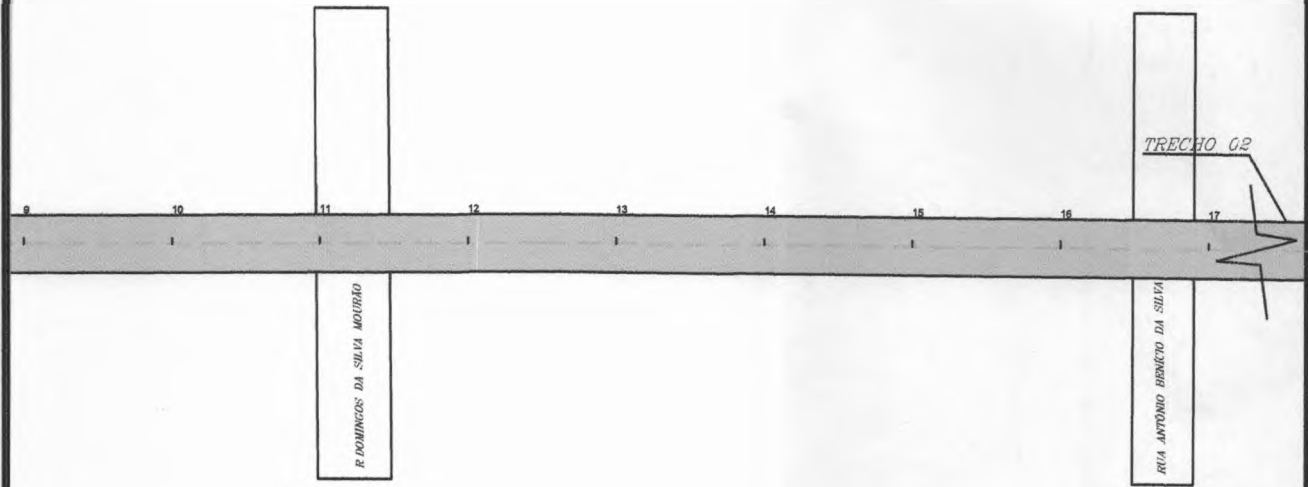



<b>NOTAS</b>	<b>ESTADO DO PIAUI</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR</b>	
	<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) <b>NOME:</b> RUA MONSENHOR UCHOA <b>TRECHO:</b> Est. 0+0,00 / 35+16,00m <b>MUNICÍPIO/LOCAL:</b> PEDRO II - ZONA URBANA <b>EXTENSÃO:</b> 716,00 m	<b>LARGURA DO PAVIMENTO:</b> 7,80m
.EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS A PROJETISTA  .TODAS AS MEDIDAS EM METROS	<b>DATA:</b> 03/2023	<b>VISTO:</b>  <b>FLS:</b> 01/02

Tatiana Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129285

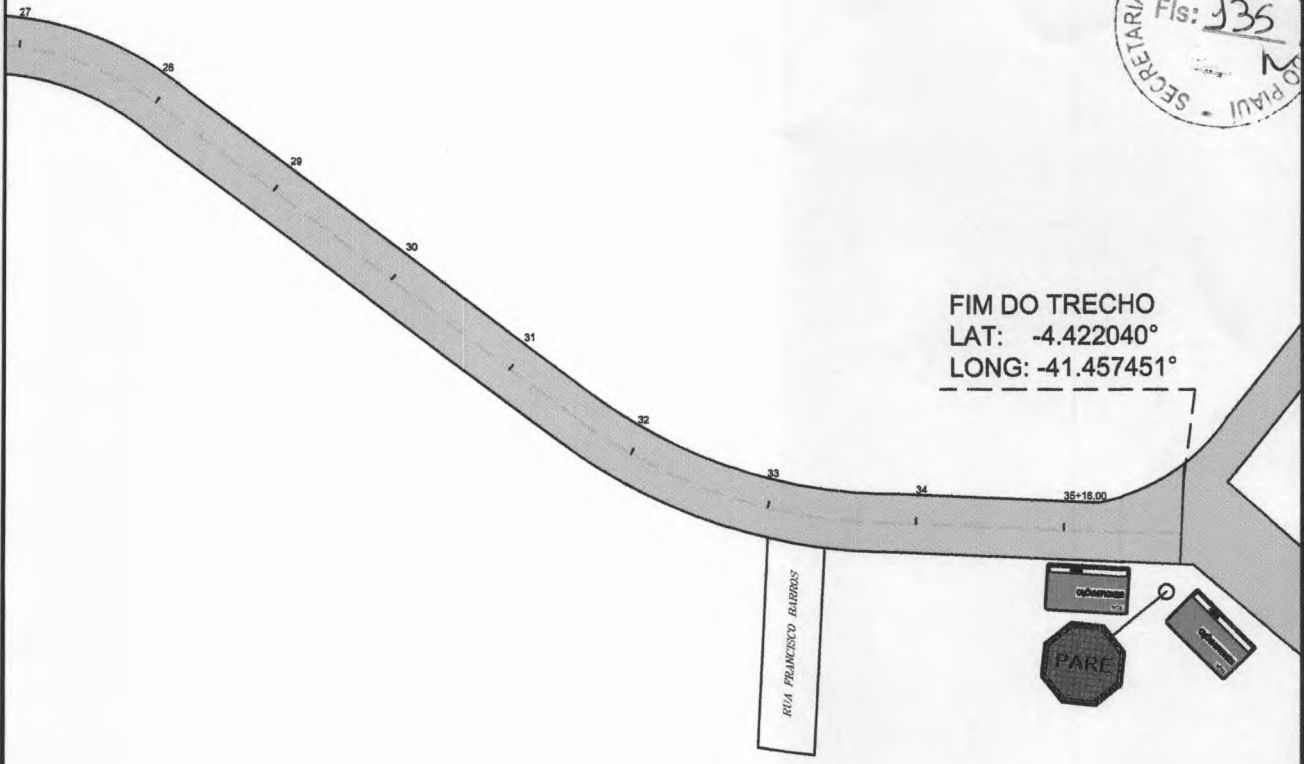

FIM DO TRECHO  
 LAT: -4.422040°  
 LONG: -41.457451°

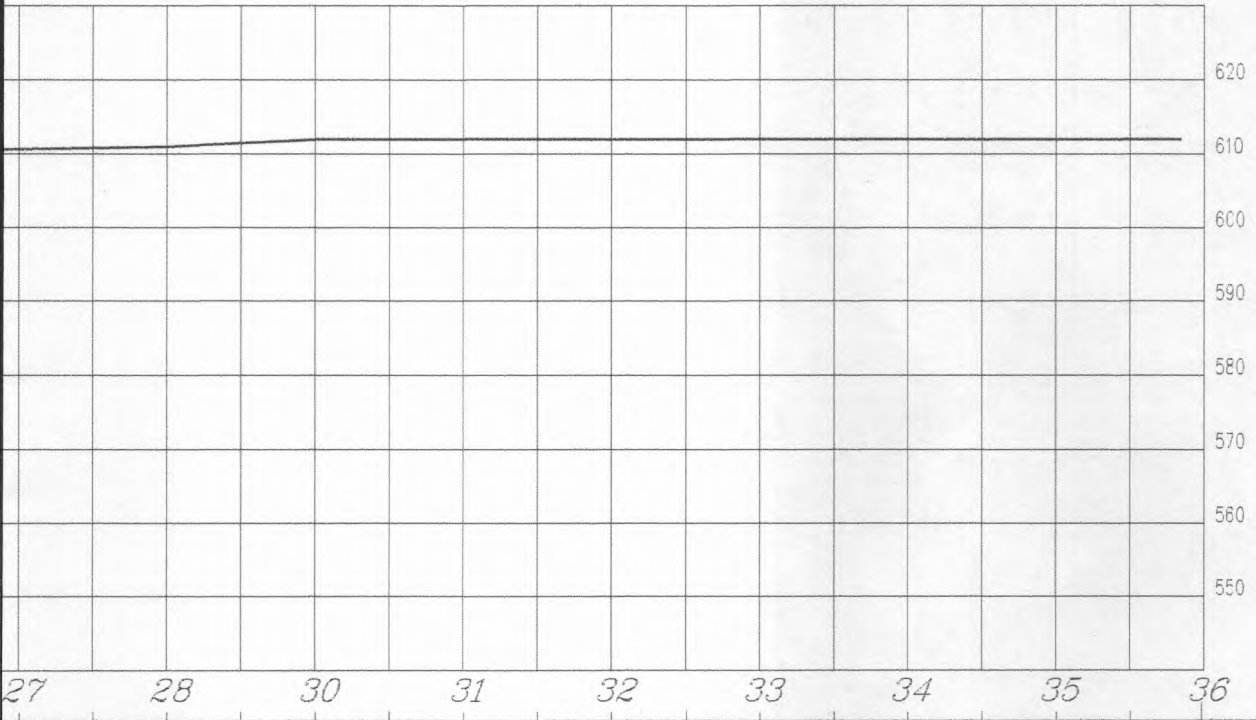


<b>NOTAS</b>  1. EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS A PROJETISTA  2. TODAS AS MEDIDAS EM METROS	<b>ESTADO DO PIAUI</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR</b>	
	<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) <b>NOME:</b> RUA MONSENHOR UCHOA <b>TRECHO:</b> Est. 0+0,00 / 35+18,00m <b>MUNICÍPIO/LOCAL:</b> PEDRO II - ZONA URBANA <b>EXTENSÃO:</b> 718,00 m	<b>LARGURA DO PAVIMENTO:</b> 7,80m
<b>DATA:</b> 03/2023	<b>VISTO:</b> 	<b>FLS:</b> 02/02


Carolina Rodrigues da Silva  
 Engª Civil / CREG: 1916129235



																		620
																		610
																		600
																		590
																		580
																		570
																		560
																		550
09	10	11	12	13	14	15	16	17										


<p><i>NOTAS</i></p> <p>1. EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE COMUNICADAS À PROJETISTA</p> <p>2. TODAS AS MEDIDAS EM METROS</p>	<p><b>ESTADO DO PIAUI</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR</b></p> <p>OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)</p> <p>NOME: RUA DA CEPISA</p> <p>TRECHO: Est. 0+0,00 / 4,00+14,00m</p> <p>MUNICÍPIO LOCAL: PEDRO II - ZONA URBANA</p> <p>EXTENSÃO: 94,00 m</p> <p style="text-align: right;">LARGURA DO PAVIMENTO: 5,95m</p> <p>DATA: 03/2023</p> <p>VISTO: </p> <p style="text-align: right;">FLS: 01/01</p>
---	---

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129285

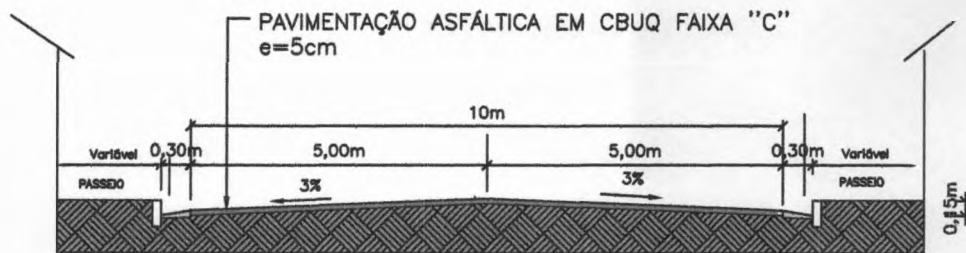

RUA ANTÔNIO BENÍCIO DA SILVA (DET.04)  
ESCALA: 1/75

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
EM CBUQ FAIXA "C"  
e=5cm

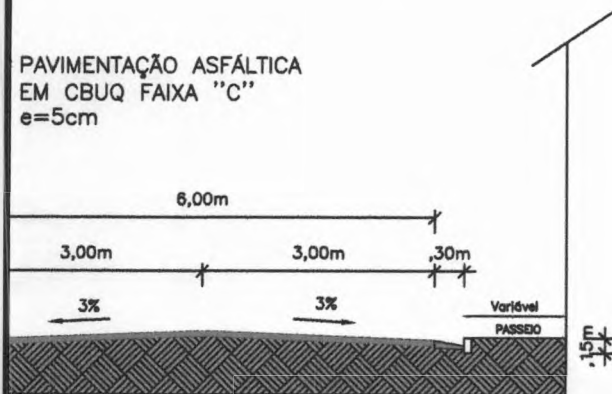


  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 19161207




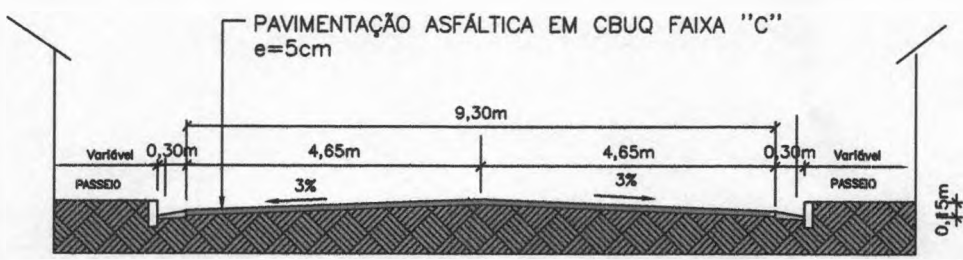
Orgão:	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR	
Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM PEDRO II - ZONA URBANA	
Desenho:	SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO	
Data:	MARÇO/2023	Escala:
		1/75
		Prancha:
		1/1



R. TOMÁS CAFÉ  
ESCALA: 1/75

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil - CREA: 1916129285


 <p>SECRETARIA DO TURISMO - SETUR</p>	Orgão:	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR			
	Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM PEDRO II - ZONA URBANA			
	Desenho:	SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO			
	Data:	ABRIL / 2023	Escala:	1/75	Prancha:




RUA JOAQUIM LEITE  
 ESCALA: 1/75

*[Signature]*  
 Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
 Eng<sup>a</sup> Civil / CREA 1916129235

	Orgão:	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR		
	Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM PEDRO II - ZONA URBANA		
	Desenho:	SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO		
	Data:	MARÇO/2023	Escala:	1/75
			Prancha:	2/2

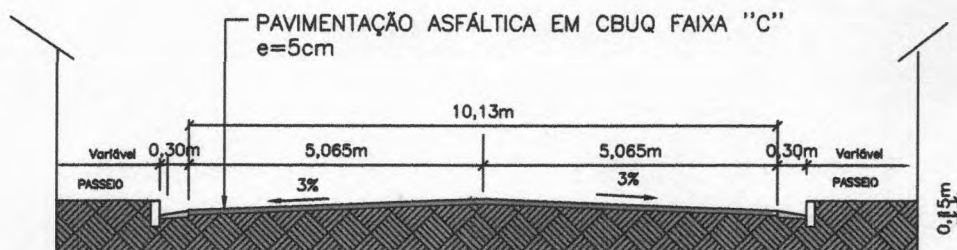

R. JOÃO BENÍCIO DA SILVA - TRECHO A  
ESCALA: 1/75

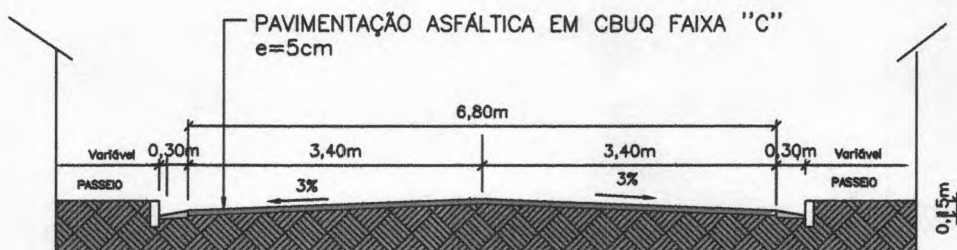


R. JOÃO BENÍCIO DA SILVA - TRECHO B  
ESCALA: 1/75

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129285



Orgão:	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR		
Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM PEDRO II - ZONA URBANA		
Desenho:	SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO		
Data:	ABRIL / 2023	Escala:	1/75
		Prancha:	1/1



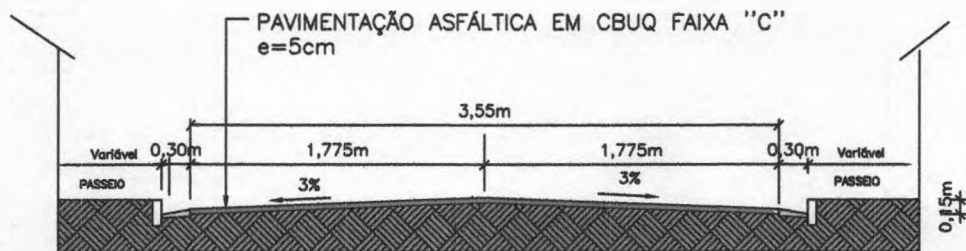

RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA  
ESCALA: 1/75

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 1916129285



Orgão:	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR	
Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM PEDRO II - ZONA URBANA	
Desenho:	SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO	
Data:	MARÇO/2023	Prancha: 1/1
Escala:	1/75	



**RUA CÂNDIDO PEREIRA**  
ESCALA: 1/75


*Yanna Carolina Rodrigues da Silva*  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 19161297R5

	Orgão:	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR		
	Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM PEDRO II - ZONA URBANA		
	Desenho:	SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO		
	Data:	MARÇO/2023	Escala:	1/75
			Prancha:	1/1



RUA MONSENHOR UCHÔA  
ESCALA: 1/75

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>o</sup> Civil - CREA: 1916129755

	Orgão:	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR			
	Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM PEDRO II - ZONA URBANA			
	Desenho:	SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO			
	Data:	MARÇO/2023	Escala:	1/75	Prancha:



RUA DA CEPISA  
ESCALA: 1/75

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA: 19161292-5



Orgão:	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR		
Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM PEDRO II - ZONA URBANA		
Desenho:	SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO		
Data:	MARÇO/2023	Escala:	1/75
Prancha:			1/1

# PEDRO II - ZONA URBANA

## Legenda

- JOÃO BENÍCIO DA SILVA
- R. ANTÔNIO BENÍCIO DA SILVA
- R. DA CEPISA
- R. JOAQUIM LEITE
- R. MONSENHOR UCHOA
- R. TEIXEIRA SANTOS
- R. TOMÁS CAFÉ
- RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA

Google Earth

Image © 2023 Airbus

300 m



# R. TOMÁS CAFÉ

852m

## Legenda

- INÍCIO E FIM DO TRECHO
- R. TOMÁS CAFÉ

-4.412417°, -41.452665°

-4.419902°, -41.451170°

Google Earth

Image © 2023 Airbus

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng.º Civil / CREA 191612978



# R. JOAQUIM LEITE

174m

## Legenda

- 📍 INÍCIO E FIM DO TRECHO
- 📍 R. JOAQUIM LEITE

-4.425352°, -41.461741°

-4.426812°, -41.462337°

Google Earth

Image © 2023 Airbus

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng. Civil - CREA



# JOÃO BENÍCIO DA SILVA

148m

## Legenda

- INÍCIO E FIM DO TRECHO
- JOÃO BENÍCIO DA SILVA

$-4.425022^\circ, -41.462246^\circ$

$-4.425676^\circ, -41.461072^\circ$

Google Earth

image © 2020 Airbus

90 m

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng. Civil / CREA 116220/2010





# R. TEIXEIRA SANTOS

204m

## Legenda

- INÍCIO E FIM DO TRECHO
- R. TEIXEIRA SANTOS

-4.423717°, -41.461522°

-4.425328°, -41.462424°

R. Teixeira Santos

R. Antônio Bento da Silva

R. Domingos da Silva Mourão

R. Domingos

R. João Benício da Silva

100 m

Google Earth

Image © 2023 Airbus

Anna Carolina Rodrigues da Silva  
CREA: 1916129235



# R. ANTÔNIO BENÍCIO DA SILVA

## Legenda

- 📍 INÍCIO E FIM DO TRECHO
- 📍 R. ANTÔNIO BENÍCIO DA SILVA

-4.423593°, -41.461719°

R. Teixeira Santos

R. Antônio Benício da Silva

R. Soriano Pedro de Souza

R. Antônio Benício da Silva

-4.424593°, -41.459625°

R. Domingos da Silva

Google Earth

Image © 2023 Airbus

100 m



Yanna Carolina Rodrigues da Silva



# RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA

308m

## Legenda

- ✦ INÍCIO E FIM DO TRECHO
- 📍 RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA

-4.429560°, -41.458508°

-4.431947°, -41.459716°

Google Earth

Image © 2023 Airbus



100 m

# RUA CÂNDIDO PEREIRA

257m

## Legenda

- 📍 INÍCIO E FIM DO TRECHO
- 📍 RUA CÂNDIDO PEREIRA

-4.432013°, -41.461996°

-4.431954°, -41.459719°

Google Earth

Image © 2023 Airbus





90 m  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng. Civil - CREA: 1916129285

# R. MONSENHOR UCHOA

716m

## Legenda

-  INICIO E FIM DO TRECHO
-  R. MONSENHOR UCHOA

Google Earth

Imagens © 2023 Airbus

R. Pres. Costa e Silva

-4.422040°, -41.457451°

R. Joaquim Leite

R. Jacó Uchoa

R. Corinto Andrade

R. João Batista da Silva

-4.427210°, -41.461060°

404

404

300m

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eng. Civil / CREA: 1916129235



# R. DA CEPISA

94m

## Legenda

- INÍCIO E FIM DO TRECHO
- R. DA CEPISA

-4.421281°, -41.457803°

-4.422038°, -41.457447°

Google Earth

Imagem © 2020 Airbus

Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Eno Civil / CREA: 19161297-5



50 m

SECRETARIA  
DO TURISMO - SETUR



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR  
AV. Marechal Castelo Branco, 1275, Centro de Convenções,  
Bairro Cabral  
CEP 64002-830 - Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216-2664  
www.turismo.pi.gov.br



**13.0 – ART**

  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil / CREA: 1916129233



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço  
1920230018649



1. Responsável Técnico

**YANNA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA**

Título profissional: **Engenheira Civil**

RNP: **1916129285**

Registro: **30414**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR**

CPF/CNPJ: **08783132000149**

Logradouro: **AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO**

Nº: **1275**

Complemento:

Bairro: **CABRAL**

Cidade: **TERESINA**

UF: **PI**

CEP: **64002-830**

Contrato: **Sem número**

celebrado em **24/03/2023**

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **5.000,00**

Tipo de Contratante:

**PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Associação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA Manoel Nogueira Lima**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro:

Cidade: **PEDRO II**

UF: **PI**

CEP: **64255-000**

Data de Início: **16/01/2023**

Previsão de Término: **24/03/2023**

Coordenadas Geográficas:

**-4.429892, -41.458656**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Código:

Proprietário **SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR**

CPF/CNPJ: **08783132000149**

4. Atividade Técnica

**ELABORAÇÃO**

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

**Quantidade**

**Unidade**

20552.3400

metro quadrado

ESPECIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

20552.3400

metro quadrado

PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

20552.3400

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (C.B.U.Q.), REFERENTE A DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE PEDRO II-PI.TOTAL 20.552,34 M²

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

**Nenhuma**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
Yanna Carolina Rodrigues da Silva  
Engª Civil - CPF: 03307498380

YANNA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 03307498380

SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR - CPF/CNPJ:

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confca.org.br](http://www.confca.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
tel: (86)2107-9292



Valor ART: R\$ **96,62**

Registrada em **29/03/2023**

Valor Pago: **96,62**

Nosso Número: **8201380857**
